



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

**ATA DE REUNIÃO Nº 1/2025/CGOVTIC**

**1. Identificação da reunião**

<b>Data</b>	<b>Horário</b>	<b>Local</b>	<b>Responsável</b>
27/02/2025	16h00	Sala da Presidência	Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo

**2. Objetivo**

1ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança de Tecnologia de Informação e Comunicação (CGOVTIC) - 2025

**3. Itens da pauta**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
1.	Plano de Capacitação de TIC 2024 versão 4.0
2.	Plano de Demandas Internas de TIC 2024 v.3.0
3.	Plano de Contratações de TIC 2024 versão 7.0
4.	Medição de Indicadores 2024
5.	PDTIC 2025
6.	Plano de Capacitação de TIC 2025 versão 1.1
7.	Plano de Contratações de TIC 2025 versão 2.0
8.	Plano de Demandas Internas de TIC 2025 - versão 2.0
9.	Indicadores 2025

**4. Participantes**

<b>Nome</b>	<b>Setor de atuação</b>
Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo	PRESIDÊNCIA

Dra. Ana Paula Barbosa dos Santos Araújo Nunes	Juíza Auxiliar da Presidência
Juliana Capistrano de Araújo Monte Sampaio	APRES
Gustavo Martins de Almeida	AJPRES
Sara Angélica Oliveira Cardoso	ASCOM
Elaine Semirames Baumgartner Fernandes Camara de Souza	ASSINT
Jorge Henrique de Almeida	AUDI
Ana Esmera Pimentel da Fonseca	Diretoria-Geral
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIE
Cláudia Josemira Marinho de Lima	SGP
Simone Maria de Oliveira Soares Mello	SAOF
João Paulo de Araújo	SJ
Primo Vaz da Costa Filho	Representando a AJCRE

## 5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
------	-----------	-------------

1.	<p>A reunião do CGOVTIC foi aberta pelo Exma Presidente Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo, que passou a palavra para a diretora-Geral, Ana Esmera, que, em seguida, passou para o Secretário da STIE, Marcos Maia.</p> <p>Marcos explicou que a reunião versa sobre o encerramento do PDTIC 2024, bem como aprovação do PDTIC 2025, seus indicadores e anexos em versões já atualizadas.</p> <p>Para o ano de 2024 foram apresentados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plano de Demandas Internas - PDI 2024 v 3.0 (Anexo 1 desta ata)</li> <li>• Plano de Capacitação de TIC - PAC TI v. 4.0 (Anexo 2 desta ata)</li> <li>• Plano de Contratações e Soluções de TIC - v. 7.0 (Anexo 3 desta ata)</li> <li>• Medição dos indicadores 2024 (Anexo 4 desta ata)</li> </ul> <p>No CGOVTIC de 19.10.2024, haviam sido aprovadas as versões iniciais dos planos derivados do PDTIC, mas, nesta reunião, foi aprovado o documento como um todo. Além da aprovação do texto do PDTIC (Anexo 5 desta ata), foram aprovados os seguintes artefatos anexos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plano de Demandas Internas- PDI 2025 v.2.0 (Anexo 6 desta ata)</li> <li>• Plano de Capacitação de TIC - PAC TI v. 1.1 (Anexo 7 desta ata) - O Plano foi aprovado e absorvido pelo Plano de Capacitação e Desenvolvimento do TRE/RN</li> <li>• Plano de Contratações e Soluções de TIC v.2.0 (Anexo 8 desta ata)</li> <li>• Planilha dos indicadores do PDTIC para 2025 (Anexo 9 desta ata)</li> </ul>	Marcos Flávio Nascimento Maia
2.	Todos os anexos enviados e analisados foram aprovados e encontram-se anexos a esta ata, além da apresentação realizada na forma de resumo dos artefatos (Anexo 10 desta ata).	Todos os participantes

## 6. Pendências

Envio da nova versão do Plano de Contratações para a COLIC e GAPSAOF para atualização do PCA 2025.

## 7. Observações

Sem observações.

## 8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
27/02/2025	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

## ANEXO(S)

- Anexo 1 - Plano de Demandas Internas - PDI 2024 v 3.0 1496951
- Anexo 2 - Plano de Capacitação de TIC - PAC TI v. 4.0 1496952
- Anexo 3 - Plano de Contratações e Soluções de TIC - v. 7.0 1496954
- Anexo 4 - Medição dos indicadores 2024 1496960
- Anexo 5 - Texto do PDTIC 1496966
- Anexo 6 - Plano de Demandas Internas- PDI 2025 v.2.0 1496967
- Anexo 7 - Plano de Capacitação de TIC - PAC TI v. 1.1 1496971
- Anexo 8 - Plano de Contratações e Soluções de TIC v.2.0 1496974
- Anexo 9 - Indicadores PDTIC 2025 1496980
- Anexo 10 - Sildes com o resumo dos artefatos 1496982



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Secretário(a) do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, em substituição**, em 14/03/2025, às 07:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Paulo de Araujo**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 14/03/2025, às 12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Flavio Nascimento Maia**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 17/03/2025, às 15:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Primo Vaz da Costa Filho**, **Assistente III da Assessoria Jurídica e Correicional da Corregedoria Regional Eleitoral**, em 02/04/2025, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sara Angelica Oliveira Cardoso**, **Assessor da Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial**, em 03/04/2025, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ana Esmera Pimentel da Fonseca**, **Diretora-Geral**, em 03/04/2025, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Elaine Semirames Baumgartner Fernandes Camara de Souza**, **Assessor de Integração**, em 03/04/2025, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Josemira Marinho de Lima**, **Secretário de Gestão de Pessoas**, em 04/04/2025, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





Documento assinado eletronicamente por **Jorge Henrique de Almeida**,  
**Coordenador de Auditoria Interna**, em 04/04/2025, às 10:31, conforme art. 1º, III,  
"b", da Lei 11.419/2006.

---



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Lourdes Medeiros de Azevêdo**,  
**Membro Presidência**, em 07/04/2025, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b",  
da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=0818853&crc=980FE14C](https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0818853&crc=980FE14C) informando, caso não preenchido, o código verificador **0818853** e o código CRC **980FE14C**.

---

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024													
VERSÃO 3.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2024	1	2024-000-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2025	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2025, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2024/08	2024/11	Em andamento	90%		
2024	2	2022-015-COSIS-SIST	Integração do Composição com o SGE	Desenvolvimento de mecanismo de sincronização do Sistema Composicao com o SGE (TSE), para substituição do Sistema Estagiários.	SLD/CODES/SGP	SDS	AC4.1	2023/07	2024/01	Concluída	100%	Janeiro/24: - A sincronização foi implementada por Adriano e já se encontra em produção. - Ainda não foi possível sincronizar as informações de SEXO e NOMESOCIAL, pois o serviço do SGE não retorna estes dados. - Estas informações não são essenciais para a sincronização com o Composicao. - Quando o service for alterado incluiremos estes 2 novos campos para sincronização. - A SBDS abriu o chamado GSTI 257941 junto ao TSE para alteração do service.	Substituição do sistema Estagiarios pelo SGE (TSE).
2024	3	2023-015-COSIS-SIST	Implantação do Sistema SEI	Implantação do sistema SEI, juntamente com todo o seu arcabouço de softwares acessórios, na infraestrutura do TRE-RN	DG	SBDS	AC4.1	2023/07	2024/02	Concluída	100%	Abril/24: - Sistemas devidamente implantados e em pleno funcionamento nos ambientes de homologação e produção - Repassadas informações para o CGS iniciar os trabalhos de gestão do SEI	- Produção: <a href="https://sei.tre-rn.jus.br/">https://sei.tre-rn.jus.br/</a>  - Homologação: <a href="https://sei-homologa.tre-rn.jus.br/">https://sei-homologa.tre-rn.jus.br/</a>
2024	4	2021-020-COSIS-SIST	Levantamento de Serviço Extraordinário	Apuração do quantitativo das horas extras é realizada pelo Frequência Nacional, para atendimento das regras que disciplinam o serviço extraordinário, por meio da Portaria GP 202/2020.	SCC/COBEP/SGP	SDS	AC4.1	2022/04	2024/03	Concluída	100%	Abril/24: - Todas as demandas foram implementadas, conforme PAE 106192021.	
2024	5	2022-010-COSIS-SIST	Integração da Folha de Pagamento com o eConsig	Configurar o módulo FOLHA do TSE para fazer a geração de arquivo de empréstimos consignados para o sistema eConsig	SFP/COBEP/SGP	SBDS	AC1.4	2022/05	2024/03	Concluída	100%	Junho/24: - Finalizada a parametrização do SGRH/FOLHA para integração com o eConsig - Sistema eConsig em funcionamento	e-Consig integrado ao SGRH/FOLHA e em funcionamento (PAE 92222020)
2024	6	2024-001-COSIS-SIST	ETP e TR para contração de novo OminiChannel	Processo de contratação de ominichannel	STIE	SNT	AC4.1	2023/10	2024/03	Concluída	100%	Outubro/24: - Contratação de solução Omnichannel mediante processo licitatório encabeçado pelo TRE-CE  Agosto/2024: - Suspensão do edital - Aderência ao IRP do TRE/CE - Migração para a empresa OmniCentral	
2024	7	2022-009-COSIS-SIST	Melhorias no SIP	Permitir o gerenciamento de parametrização de classificação, de acordo com as regras definidas em editais.	SLD/COPES/SGP	SDS	AC1.2	2022/12	2024/04	Concluída	100%	Junho/24: - Versão final do SIP já foi disponibilizada em produção e executada em 3 eventos: 'Reforço no Fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alistamento Eleitoral_2024', 'Reforço no Fechamento Externo do Cadastro Eleitoral - Final do Alistamento Eleitoral_2024_VAGAS REMANESCENTES' e 'Reforço de Pessoal - Registro de Candidaturas_Eleições 2024'. Usuário demandante não solicitou mais nenhuma evolução e arquivou o PAE 21422022 em 28/05/2024.	Geração automática da classificação, a partir de cálculo dos critérios utilizados nos editais.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024														
VERSÃO 3.0														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	8	2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	Atualizar as versões dos sistemas iPleno Autenticador e do AcesSE possibilitando o login dos usuários através das credenciais de rede (LDAP)	SAP/CGPP/SJ	SBDS	AC4.1	2024/01	2024/04	Pausada	0%	<b>Agosto/24:</b> - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto  <b>Junho/24:</b> - A SAP sinalizou que após as Eleições 2024 iniciará as tratativas para utilização do PJe nas sessões plenárias; dessa forma, é interessante avaliar o cancelamento desse projeto  <b>Abril/24:</b> - Aguardando definição de suspensão de utilização do iPleno (passar a utilizar o PJe)  <b>Janeiro/24:</b> - Atividade não iniciada.		
2024	9	2020-073-COSIS-SIST	Adaptações de segurança em todos os sistemas segundo relatório de análise da ferramenta Sonarqube.	Além das atualização relacionadas à segurança das aplicações, está sendo necessário atuar nas seguintes atualizações: Java17, SpringBoot 3 e JSF3.	COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2023/04	2024/05	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Nova versão do PontoEletronico disponibilizada em produção em uma máquina do 4º andar. - Foi aberto chamado para SMI atualizar a versão em todas as máquinas do TRE (GLPI 60620).		
2024	10	2022-033-COSIS-SIST	Melhorias no Sistema SGAE	Melhorias SGAE - GLPI 43938 - GLPI 40244 - Email 25/05/2022 - Email 08/06/2022 - Email 28/11/2022 - GLPI 45722	SGAE/COPES/SGP	SDS	AC4.1	2023/08	2024/05	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Demandas implementadas e implantadas em produção.  <b>Janeiro/24:</b> - Demandas estão sendo implementadas por Adriano.		
2024	11	2023-016-COSIS-SIST	Melhorias em processos do Workflow	Alterações em 5 processos de ausências da SRF. Correções de bugs e melhorias nos processos de férias. Investigação do processo de AQ.	SRF/COPES/SGP	SDS	AC4.1	2024/02	2024/06	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Processos implantados em produção, após homologação e autorização da SRF.	Celeridade nos lançamentos das ausências mais comuns, eliminando a necessidade formal de um processo via SEI.	
2024	12	2024-002-COSIS-SIST	Implantação do Sistema OJS	Implantação do Sistema OJS (Open Journal System) para atendimento ao Plano Projeto Revista Eleitoral Científica	GABJC5	SBDS	AC4.1	2024/04	2024/06	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - O sistema encontra-se implantado, já no ambiente Kubernetes, e foi disponibilizado desde o dia 09/05/2024 (SEI 01350/2024)	- <b>Produção:</b> <a href="https://revistaeleitoral.tre-rn.jus.br/">https://revistaeleitoral.tre-rn.jus.br/</a> - <b>Homologação:</b> <a href="https://revistaeleitoral-homologa.tre-rn.jus.br/">https://revistaeleitoral-homologa.tre-rn.jus.br/</a>	
2024	13	2024-003-COSIS-SIST	Implantação do Sistema SisAntena	Implantação do Sistema do Sistema Sis-Antena (TRE-DF)	SJ	SBDS	AC4.1	2024/04	2024/09	Concluída	50% 100%	<b>Outubro/24:</b> - Sistema implantado no ambiente de produção e liberado para a área negocial no início do mês Setembro	- <b>Produção:</b> <a href="https://sisantena.tre-rn.jus.br">https://sisantena.tre-rn.jus.br</a>  - <b>Homologação:</b> <a href="https://sisantena-homologa.tre-rn.jus.br/">https://sisantena-homologa.tre-rn.jus.br/</a>  Importante deixar registrado que o SisAntena possui um módulo que é acessado na Internet, porém ele ainda não obteve o aval da área de segurança para ser exposto. Porém, como nem esse aval e nem a configuração de exposição na Internet são atividades da SBDS, damos por finalizado o projeto.	
2024	14	2023-006-COSIS-SIST	Implantação do Sistema Janus	Implantação do sistema Janus, desenvolvido pelo TRE-BA	SJ	SNT	AC4.1	2023/05	2024/08	Concluída	100%	<b>Abril/2024</b> - Módulos foram implantados. Foi criado grupo para normatizar o uso do Janus no TRE-RN. Diego está criando modelo para ser usado no lugar do modelo do TRE-BA e migrando a infraestrutura para o Kubernetes		
2024	15	2024-005-COSIS-SIST	Manutenção evolutiva no SIGA	Ajustes de bugs no SIGA e novas funcionalidades	SPLE/COELE/STIE	SNT	AC4.1	2024/06	2024/08	Concluída	100%	<b>Agosto/2024:</b> - Ajuste de bugs - Migrado para o Kubernetes		
2024	16	2024-006-COSIS-SIST	Canal do mesário	Criação do canal do mesário similar ao canal do TSE	NFA/EJE	SNT	AC4.1	2024/08	2024/08	Concluída	100%	<b>Agosto/2024:</b> - <b>Canal criado no Kubernetes</b> <a href="https://mesario.tre-rn.jus.br">https://mesario.tre-rn.jus.br</a>		
2024	17	2024-007-COSIS-SIST	Portal das Eleições	Ajustes pontuais no site	SPLE/COELE/STIE	SNT	AC4.1	2024/08	2024/08	Concluída	100%	<b>Agosto/2024:</b> - <b>Ajustes de layout</b> <a href="https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2024">https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2024</a>		
2024	18	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasse do Gittlab	Repasse do Gitlab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2024/05	2025/03	Em andamento	90%	<b>Dezembro/24:</b> O projeto ainda não pode ser concluído, uma vez que ainda não houve a migração, apenas o repasse.  <b>Julho/24:</b> - A SRI ainda não finalizou a migração.		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024														
VERSÃO 3.0														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	19	2023-010-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	Melhorias evolutivas no Sistema SAE.	SSAE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2024/02	2024/10	Concluída	100%	<b>Dezembro/24:</b> As funcionalidades que não foram implementadas para as Eleições 2024 serão implementadas somente em 2026, quando na ocasião será aberto outro projeto de melhorias evolutivas no SAE.  <b>Outubro/24:</b> - A maioria das funcionalidades foram implementadas e o sistema encontra-se em manutenção, onde estão sendo realizados apenas ajustes pontuais e correções de bugs.  <b>Julho/24:</b> - Foram implementadas várias alterações em relatórios e etiquetas. A SSAE ficou de informar a necessidade de alteração de atas e editais.		
2024	20	2023-011-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema DisqueEleitor.	Melhorias evolutivas no Sistema DisqueEleitor.	OE	SDS	PI4.1	2024/05	2024/10	Concluída	100%	<b>Outubro/24:</b> - Todas as melhorias solicitadas por Kelia foram implementadas.  <b>Julho/24:</b> - Foram corrigidos todos os bugs identificados e liberado para o grupo gestor (Kelias) homologar a versão que será usada nas Eleições 2024.	Melhoria na interface de pesquisa de eleitores, assim como no registro dos atendimentos.	
2024	21	2024-004-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas nos processos de férias	A solicitação foi demandada pela SGP (SRF e SFP) e demonstra ser urgente, uma vez que está interferindo nos processos de férias e pagamentos.	SFP/COBEP/SGP	SDS	AC4.1	2024/07	2024/10	Concluída	100%	<b>Outubro/24:</b> - Concluído, conforme PAE 118112019.  <b>Julho/24:</b> - Foi desenvolvido relatório de conferência de alterações de férias x pendências de 1/3 de férias.	Melhoria no processo de comunicação e identificação de alterações de férias que têm impacto financeiro, através da extração de dados do SGRH/Folha.	
2024	22	2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	2024/11	Pausada	75%	<b>Junho/24:</b> - Houve um pequeno avanço nos estudos para a implantação da ferramenta Database Vault, porém o projeto foi pausado novamente, e consequentemente reaprazado, devido as demandas relacionadas às Eleições 2024		
2024	23	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	AC4.1	2023/05	2025/03	Em andamento	90%	<b>Dezembro/24:</b> Encontra-se pendente ainda ajuste em dashboard, devido à inconsistências nos cálculos detectadas pela SGAE. Em virtude do afastamento do servidor Marcos, ainda não foi possível finalizar esta correção.  <b>Outubro/24:</b> Foram realizados ajustes nos painéis e o sistema encontra-se em produção/homologação pela SGAE.		
2024	24	2022-018-COSIS-SIST	Solicitação coletiva de diárias	Desenvolver funcionalidade que permita fazer um pedido coletivo no sistema, quando for para os casos de várias pessoas para o mesmo destino.	DG	SDS	AC4.1	2023/06	2024/12	Concluída	100%	<b>Outubro/24:</b> - O sistema está aguardando homologação do GAPSGP. A funcionalidade solicitada neste projeto não foi autorizada pelo GAPSGP.  <b>Julho/24:</b> - Foram implementadas algumas melhorias em branch, mas ainda estão pendentes de validação: horário do evento; município de endereço do favorecido; anexação de documentos.	Alimentação de informações do evento e do favorecido, favorecendo a análise de decisão jurídica.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024														
VERSÃO 3.0														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	25	2023-009-COSIS-SIST	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	Implementação das funcionalidades solicitadas pelas Zonas no Sistema Mesários.	COELE/STIE	SDS	PI4.1	2023/08	2024/12	Concluída	100%	<p><b>Dezembro/24:</b> As funcionalidades que não foram implementadas para as Eleições 2024 serão implementadas somente em 2026, quando na ocasião será aberto outro projeto de melhorias evolutivas no Mesários.</p> <p><b>Outubro/24:</b> - Todas as funcionalidades foram implementadas e o sistema encontra-se em manutenção, onde estão sendo realizados apenas ajustes pontuais e correções de bugs. O GT-Mesários está responsável pelo gerenciamento do backlog de melhorias que serão implementadas pela 2026.</p> <p><b>Julho/24:</b> T- odas as funcionalidades priorizadas para as Eleições 2024 foram desenvolvidas. O GT Mesários catalogou algumas melhorias para 2026.</p>		
2024	26	2023-008-COSIS-SIST	Solução para auxílio na Transmissão Descentralizada de Resultados (JECONNECT)	Solução para auxílio na Transmissão Descentralizada de Resultados (JECONNECT)	COINF/STIE	SDS	PI4.3	2023/08	2024/12	Concluída	100%	<p><b>Dezembro/24:</b> As funcionalidades que não foram implementadas para as Eleições 2024 serão implementadas somente em 2026, quando na ocasião será aberto outro projeto de melhorias evolutivas no SAT.</p> <p><b>Outubro/24:</b> - Todas as funcionalidades foram implementadas. Estamos aguardando demandas ainda não catalogadas a serem enviadas pela SSI.</p> <p><b>Julho/24:</b> Todas as funcionalidades já foram desenvolvidas, mas ainda resta pendente a autorização da SSI para implantação em produção.</p>		
2024	27	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2024/02	2025/03	Em andamento	80%	<p><b>Dezembro/24:</b> laperi solicitou ajustes na estrutura de dados após a homologação do sistema.</p> <p><b>Outubro/24:</b> - A EPOR solicitou várias melhorias no sistema durante a fase de homologação. As melhorias estão sendo implementadas e podem ser acompanhadas via Gitlab em <a href="https://gitlab.tre-rn.jus.br/publico/gestao-riscos-webappl/-/issues">https://gitlab.tre-rn.jus.br/publico/gestao-riscos-webappl/-/issues</a>.</p> <p><b>Julho/24:</b> A AGE ainda não finalizou a homologação do sistema. Os estagiários estão implementando testes unitários e de integração.</p>		
2024	28	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Fale Conosco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/10	2025/02	Em andamento	80%	<p><b>Dezembro/24:</b> Já foram realizadas as adaptações no sistema, assim como realizada análise de vulnerabilidade</p>		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024													
VERSÃO 3.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2024	29	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, juntados e tramitando) para o SEI, através da API WSSei.	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/08	2025/02	Em andamento	75%	<b>Dezembro/24:</b> - Desenvolvimento de script de migração dos processos, utilizando a API de Webservice do SEI, sendo testado ostensivamente em ambiente de homologação; - Tratado com equipe de negócio diversos cenários que envolve regras de negócios relacionadas a migração, como elaboração de planilhas DE/PARA para dados diferentes entre PAE e SEI; - Elaboração de estratégia de migração e análise de cenários para execução da migração;  <b>Outubro/24;</b> - A SBDS já conseguiu criar um script de migração de processos que está sendo validado no ambiente de homologa com vários cenários - Existem definições de responsabilidade da área negocial que estão sendo verificadas as quais irão gerar demandas de adequação do script  <b>Julho/24:</b> Foi criado o projeto paeMigrasaoSei no Gitlab. Adriano está trabalhando na criação de uma versão inicial com as seguintes funcionalidades: - criação automática de classes POJO a partir do WSDL do SEI; - consumo de um serviço de leitura de dados.	
2025	30	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações containerizadas implantadas no ambiente do homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2025/03	Em andamento	90%	<b>Dezembro/24:</b> - Devido as demandas da Eleição e a designação do projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST) pela SBDS, este projeto teve que ter seu término adiado  <b>Outubro/24:</b> - Devido as demandas da Eleição e a designação do projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST) pela SBDS, este projeto teve que ter seu término adiado - Definido que o Atena não será migrado para o Kubernetes  <b>Agosto/24:</b> - Migrados sistemas e-Social, JE-Reinf - Faltando apenas Moodle, Atena e Suíte iPleno; obs.: Atena tende a não ser migrado devido a alta complexidade da sua arquitetura; Suíte iPleno aguarda decisão de continuidade de uso (SEI 07445/2024)	
2025	31	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2025/03	Em andamento	40%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.  <b>Agosto/2024</b> - Projeto adiado	
2025	32	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar prodecimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2024/05	2025/05	Não iniciada	0%	<b>Dezembro/24:</b> - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  <b>Outubro/24:</b> - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  <b>Abril/24:</b> - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024													
VERSÃO 3.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	33	2021-016-COSIS-SIST	Aplicação dos temas Premium Harmony e Avalon no modelo de desenvolvimento da SDS.	Ajustes evolutivos e de segurança dos sistemas.	COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2024/10	2025/04	Cancelada	0%	Setembro/24: - Projeto foi substituído pelo projeto 2024-015-COSIS-SIST	
2025	34	2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2024/04	2025/12	Não iniciada	0%	Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Agosto/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	35	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.  Janeiro/24: - Processo ainda não modelado.	
2025	36	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2025/09	Não iniciada	0%	Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Abril/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	37	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%	Julho/24: - Este projeto foi adiado para o ano seguinte, devido à priorização dos sistemas, conforme SEI 3615/2024.	
2025	38	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%		
2025	39	2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/01	2025/06	Pausada	40%	Janeiro/24: - Devido à priorização dos projetos de natureza eleitoral, não será possível continuar este projeto em 2024, pois não dispomos, no momento, de nenhum desenvolvedor livre para atuação nesta demanda.	
2025	40	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2025/01	2025/06	Pausada	40%	Outubro/24: - O desenvolvimento será priorizado para o 1º semestre de 2025.	
2025	41	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/06	2025/12	Não iniciada	0%		
2025	42	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2025/06	2025/12	Não iniciada	0%		
2025	43	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/05	Não iniciada	0%		
2025	44	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%		
2025	45	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	ASCOM	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada	0%		
2025	46	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/07	2025/12	Não iniciada	0%		
2025	47	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2025/07	2025/12	Não iniciada	0%		
2026	48	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06	Não iniciada	0%		
2026	49	2024-009-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Solução de LGPD	Desenvolvimento de Solução de LGPD em parceria com o TRT 21 Região	COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06	Não iniciada	0%		
2026	50	2024-010-COSIS-SIST	Projeto eMag	Projeto piloto de sistema definido na ação R10.2 com usuário com deficiência visual/auditiva	COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06	Não iniciada	0%		
2026	51	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2026/01	2026/06	Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em decorrência de outras demandas de maior prioridade no setor.	
2026	52	2023-019-COSIS-SIST	Bot para integração com SGRH	Desenvolvimento de bots para integração com sistemas legados	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12	Não iniciada	0%	Janeiro/24: - A demanda será conduzida pelo servidor George, com o apoio de Marcelo na infraestrutura.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024													
VERSÃO 3.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2023	53	2023-004-COELE-LOG	Mapear o processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Mapear o processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	8/2023	5/2024	Concluída	100	Iniciado o escopo da modelagem em 2023. Foi dada prioridade à elaboração do PIELEI e de outras atividades relacionadas ao planejamento das eleições, assim como optou-se por primeiro concluir o novo processo de planejamento que foi modificado em 2023, para um melhor embasamento da modelagem.	Modelagem realizada, porém, faltava a entrega do manual. Considerando o novo formato proposto e já aprovado para o PIELEI 2026 (Port. 41/2025 - DG), será necessária a revisão completa da modelagem em 2025.
2023	54	2023-008-COELE-LOG	Elaborar projeto de atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais	COELE	SSAE/SUE	PI4	10/2023	5/2024	Concluída	100	A COELE e a SUE estiveram totalmente voltadas para as demandas da eleições dos conselhos tutelares, planejamento das eleições 2024, do 12SNH, <i>run in</i> , atividades rotineiras e o recebimento das 2.976 urnas eletrônicas modelo 2022 (aceite, certificação)	Curso Saber com Urnas e Sistemas Eleitorais reformulado e disponibilizado na plataforma Virtual de Aprendizagem Educa TRE/RN, com o incremento de vídeos e adequação às resoluções do TSE para as Eleições 2024. Feita, ainda, uma versão resumida para capacitação dos auxiliares de eleição (Saber com Urnas 2024).
2023	55	2023-010-COELE-LOG	Elaborar planos de ação dos Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo o seu público-alvo e adotando os parâmetros estabelecidos pelo TSE	COELE	COELE	PI4	Sob demanda	Sob demanda	Concluída	100	Concluído o 12º Simulado Nacional de Hardware, único evento de 2023. os demais serão realizados em 2024.	Planos de ação e avaliações constantes dos processos: 12SNH - PAE 5541/2022 13SNH - SEI 2391/2024 14SNH - SEI 5059/2024 2ºTDTOT - SEI 3405/2024 3ºTDTOT - SEI 4895/2024 4ºTDTOT - SEI 6305/2024 5ºTDTOT - SEI 7319/2024 6ºTDTOT - SEI 7925/2024 SNTOTUE - SEI 6172/2024
2023	56	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho " Eleições Suplementares "	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	8/2023	12/2024	Em andamento	30	Concluída a modelagem no âmbito da STIE, desenvolvendo a complementação no âmbito do TRE. Solicitada a pausa, tendo em vista a implantação do SEI, que modificará o fluxo inicialmente pensado.	Reuniões sobre a modelagem na STIE no SATAS 2023. Oficialização da modelagem no SEI 384/2025
2024	57	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Ordinárias"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da proposta orçamentária de pleitos - Eleições Ordinárias	COELE	SPLE	PI4	1/2024	02/2025	Em andamento	50	Modelagem a ser reformulada, após reunião com a SEPOF	Considerando a modelagem (desenho) realizada, mas reformulada após análise juntamente com a SEPOF, a análise de riscos foi postergada para 2025, devido haver a necessidade prévia da revisão da modelagem.
2024	58	2024-002-COELE-LOG	Revisar o mapeamento o processo de trabalho "Suporte aos Sistemas Eleitorais"	Revisar o mapeamento do processo de trabalho "Suporte aos Sistemas Eleitorais", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	COELE	SSAE	PI4	2/2024	4/2024	Concluída	100		"Modelagem aprovada na reunião 9/2024 - 1º COGESTIC, dia 13/05/2024 <a href="https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=42440">https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=42440</a>
2024	59	2024-003-COELE-LOG	Mapear o processo de trabalho "Gestão do ODIN"	Mapear o processo de trabalho "Gestão do Sistema de Autenticação e Atualização da Justiça Eleitoral - ODIN", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	COELE	SSAE	PI4	3/2024	11/2024	Concluída	100	Modelagem apresentada e aprovada no 1o COGESTIC de NOV/2024. Manual completo do processo entregue ao GAPSTIE dentro do prazo estabelecido.	Modelagem aprovada na reunião 21/2024 - 1º COGESTIC, dia 05/11/2024 <a href="https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=131323">https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=131323</a>
2024	60	2024-004-COELE-LOG	Elaborar tutorial do sistema de Vistorias de Locais de Votação e Georreferenciamento Eleitoral - GEL	Estudar e desenvolver tutorial explicativo de operacionalização do sistema de Vistorias de Locais de Votação e Georreferenciamento Eleitoral - GEL	COELE	SSAE	PI4	1/2024	6/2024	Concluída	100		Tutorial elaborado e publicado no Portal das Eleições 2024 <a href="https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2024/processos-eleitorais/locais-de-votacao-e-secoes-eleitorais/GELRoteiroparautilizaov3EleiesMunicipais2024.pdf">https://portal.tre-rn.jus.br/eleicoes2024/processos-eleitorais/locais-de-votacao-e-secoes-eleitorais/GELRoteiroparautilizaov3EleiesMunicipais2024.pdf</a>
2024	61	2024-005-COELE-LOG	Mapear o processo de trabalho "Logística de distribuição e recolhimento de Urnas Eletrônicas e materiais correlatos"	Mapear o processo de trabalho"Logística de distribuição e recolhimento de Urnas Eletrônicas e materiais correlatos", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	COELE	SUE	PI4	5/2024	11/2024	Concluída	100	Modelagem apresentada e aprovada no 1o COGESTIC de NOV/2024 a modelagem do processo. Manual completo do processo entregue ao GAPSTIE dentro do prazo estabelecido.	Modelagem aprovada na reunião 21/2024 - 1º COGESTIC, dia 05/11/2024 <a href="https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=131323">https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=5505&amp;id_documento=131323</a>
2024	62	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	3/2024	02/2025	Em andamento	50	Modelagem apresentada e aprovada, restando a elaboração do Manual.	Postergado para 2025, após a conclusão da modelagem da elaboração do PIELEI 2025
2024	63	2024-007-COELE-LOG	Elaboração do Plano de Ação e acompanhamento da Eleição Suplementar de Pedro Velho	Planejamento, organização e monitoramento do processo para realização da Eleição Suplementar de Pedro Velho	COELE	COELE	PI4	1/2024	3/2024	Concluída	100		Plano de Ação constante do SEI 99/2024 <a href="https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=407&amp;id_documento=13018">https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&amp;id_procedimento=407&amp;id_documento=13018</a>
2024	64	2024-008-COELE-LOG	Elabora plano de ação do 13º Simulado Nacional de Hardware	Elaborar o plano de ação do 13SNH, alinhamento com as unidades, monitoramento e avaliação	COELE	COELE	PI4	3/2024	4/2024	Concluída	100		Plano de Ação do 13SNH - SEI 2391/2024
2024	65	2024-001-COINF-INFR	Ampliação rede WiFi	Aquisição de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2024/12	Concluída	100%	Processo de aquisição finalizado com sucesso; uma parte dos equipamentos (dezesseis Access Point) foram entregues e realizado o aceite	A aquisição de equipamentos tipo access point para as Centrais de Atendimento com box do TRE-RN possibilitará a criação de uma rede sem fio robusta e eficiente, proporcionando acesso à internet de alta qualidade. Com a instalação dos dispositivos, foi garantida a conectividade contínua e estável, melhorando a agilidade no atendimento aos usuários.



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024														
VERSÃO 3.0														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	66	2024-002-COINF-INFR	Renovação do parque de Switches dos cartórios do interior	Aquisição de switches PoE novos nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2024/12	Concluída	100%	Processo de aquisição finalizado com sucesso; uma parte dos equipamentos (nove Switches PoE) foram entregues e dado aceite	A aquisição de switches PoE novos para os cartórios do interior possibilitará a implantação de uma rede mais eficiente e estável, atendendo às necessidades de conectividade moderna. Com a substituição dos equipamentos antigos, que estão em uso há mais de 10 anos e fora da garantia	
2024	67	2024-003-COINF-INFR	Atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE	Aquisição de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2024/12	Concluída	100%	Processo de aquisição finalizado com sucesso; os equipamentos foram entregues, realizado o aceite e, atualmente, estão em produção	Sustituição dos equipamentos atualmente instalados e manutenção do parque atualizado, com garantia e suporte	
2024	68	2024-004-COINF-INFR	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal 2024	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/01	2024/12	Concluída	100%		A aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação visa a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal, garantindo maior eficiência e desempenho nas atividades institucionais. A atualização tecnológica permitirá a implementação de sistemas mais modernos, reduzindo custos operacionais e ampliando a capacidade de suporte às funções do Tribunal. Com essa renovação, espera-se otimizar o tempo de resposta, melhorar a produtividade e fortalecer a infraestrutura de TI, contribuindo para a excelência no serviço público prestado à sociedade.	
2024	69	2024-005-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs visando o fim do alistamento eleitoral	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI visando o final do alistamento eleitoral.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2024/04	Concluída	100%		Garantiu a oferta de equipamentos em perfeito funcionamento para as Zonas Eleitorais, bem como preparar as Zonas para o aumento da demanda com o final do alistamento, possibilitando a prestação de um serviço de qualidade para o cidadão.	
2024	70	2024-006-COINF-INFR	Vistorias nos locais de transmissão descentralizada	Realizar vistoria em locais que poderão ser utilizados para a transmissão descentralizada, em todo o Rio Grande do Norte	COINF/STIE	COINF/STIE	AT8	2024/06	2024/08	Concluída	100%		Garantiu maior celeridade e segurança na transmissão dos resultados das eleições 2024.	
2024	71	2024-007-COINF-INFR	Treinamentos dos supervisores da transmissão descentralizada		SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/06	2024/09	Concluída	100%		Garantiu maior eficiência nos trabalhos dos responsáveis pela transmissão dos resultados, trazendo maior celeridade e segurança na transmissão dos resultados das eleições 2024.	
2024	72	2024-008-COINF-INFR	Ilhas de impressão	Implantação do projeto de ilhas de impressão, que consiste em diminuir as impressoras por unidade, concentrando-as em determinados locais de impressão, tendo em vista a diminuição da demanda, como decorrência da consolidação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2025/04	Em andamento	80%			
2024	73	2024-009-COINF-INFR	Implantação da estrutura mínima de monitoramento de soluções de Segurança Cibernética	Aquisição de equipamentos de monitoramento de soluções de Segurança Cibernética	SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2024/10	Concluída	100%		Aprimorou o monitoramento das soluções de segurança cibernética utilizadas pelo TRE-RN, através de uma melhor visualização dos alertas e análise das vulnerabilidades/ameaças em tempo real, objetivando reduzir os riscos de ataques cibernéticos e o tempo de resposta aos incidentes de segurança da informação	
2024	74	2024-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal 2025	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/10	2025/06	Em andamento	40%	Fase de Planejamento: DOD e ETP elaborados - necessidade de ajustes no ETP conforme orientação da SETEC		
2024	75	2022-002-RES3-DEV	Atualizador de Conteúdo - Chatbot Celina	Desenvolvimento de um sistema que possa ser utilizado pela área negocial para atualizar o conteúdo do Chatbot Celina sem dependência da área tecnológica.	Grupo Gestor da Atendente Virtual	RESIDÊNCIA	S3.3	2022/07	2022/10	Concluída	100%	<a href="https://visualcelina.tre-rn.jus.br/">Acessível em https://visualcelina.tre-rn.jus.br/</a>		
2024	76	2024-019-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos	Suporte ao painel de indicadores estratégicos relacionados à STIE.	STIE	RESIDÊNCIA	S3.5	2023/12	2024/04	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Projeto finalizado e disponibilizado em ambiente de produção.  <b>Abril/24:</b> - Paine! Pronto - O painel foi alimentado manualmente em um primeiro momento. - Reconstruindo o ETL do projeto. - Falta automatizar a obtenção dos dados da planilha para o Data Lake House		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE												ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024														
VERSÃO 3.0														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	77	2024-001-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral	Implementação de portal web com painéis relacionados à Escola Judiciária Eleitoral.	EJE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2024/04	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Projeto finalizado e disponibilizado em ambiente de produção.  <b>Abril/24:</b> - Atraso causado por alteração de requisitos. No momento estamos aguardando reunião com o cliente para apresentar atualizações. - Power BI que tratam da Capacitação interna, turmas e indicadores estão pormtos.		
2024	78	2024-004-RES4-BI	Suporte à Implantação da Solução de BI do TRE-GO	Suporte à equipe do TRE-GO na implantação de sua solução de BI.	DG	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2024/04	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Projeto finalizado e disponibilizado em ambiente de produção.  <b>Abril/24:</b> - Início do atendimentos dos requisitos enviados pela equipe do TRE-GO.		
2024	79	2024-002-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratações Anual	Implementação de painéis de BI de acompanhamento do Plano de Contratação Anual.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2024/04	Concluída	100%	<b>Junho/24:</b> - Projeto finalizado e disponibilizado em ambiente de produção.  <b>Abril/24:</b> - Atraso causado por alteração de requisitos. No momento estamos aguardando reunião com o cliente para apresentar atualizações e entender novos requisitos. - Os filtros 'processos de contratação' e 'tipos de objetivos', no dashboard PCA, estão prontos.		
2024	80	2024-003-RES4-BI	Ajustes Evolutivos no Portal de Dados Abertos	Automatização da inserção e atualização dos dados na ferramenta de dados abertos CKAN.	STIE	RESIDÊNCIA	S3.6	2024/02	2024/07	Concluída	90% 100%	<b>Outubro/24:</b> - <a href="https://dados.tre-rn.jus.br">Projeto finalizado e disponibilizado em https://dados.tre-rn.jus.br</a>  <b>Junho/24:</b> - <a href="#">Infraestrutura do CKAN revitalizada, pendente de ser colocada em produção ( Aguardando fim da avaliação do CNJ )</a> - <a href="#">Criada rotinas de backup e restauração de dados ( Pendente adição ao Airflow para agendamento de backups )</a>		
2024	81	2024-020-RES4-BI	Migração do equipamento servidor – BI TRE-GO	Migração da máquina servidora Windows utilizada pelas soluções implantadas pelo TRE-GO para o ambiente DMZ	STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/06	2024/07	Cancelada	40%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto sem viabilidade técnica em virtude da falta de suporte do TRE-GO, que implantou a solução em onosso Regional.		
2024	82	2024-022-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sistema Pardal	Apresentação de estatísticas relacionadas às denúncias de propaganda eleitoral irregular recebida pelo sistema Pardal.	COMISSÃO GESTORA DO PARDAL	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/06	2024/08	Concluída	100%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto desenvolvido e em ambiente de produção.		
2024	83	2024-011-RES4-BI	BI COELE – Planejamento	Painéis de apoio ao planejamento das eleições.	STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/08	Cancelada	0%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto substituído pelos projetos 2024-013-RES4-BI e 2024-017-RES4-BI  <b>Julho/24:</b> - Até o momento os painéis de GO estão atendendo a necessidade do cliente.		
2024	84	2024-016-RES4-BI	BI COELE – Acompanhamento	Painéis de acompanhamento da preparação e totalização nas eleições	STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/10	Cancelada	0%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto substituído pelos projetos 2024-013-RES4-BI e 2024-017-RES4-BI  <b>Julho/24:</b> - Gerado os acessos ao sistema de totalização SISTOT - Definido que os painéis serão em Metabase		
2024	85	2024-013-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Carga de urnas eletrônicas	Acompanhamento das etapas de preparação das urnas eletrônicas	SSAE/COELE/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/10	Concluída	100%	<b>Outubro/24:</b> - Projeto desenvolvido para uso interno da SSAE e das Zonas Eleirorais - Foi implementada uma visualização do acompanhamento para os Coordenadores de Suporte.		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024														
VERSÃO 3.0														
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS	
2024	86	2024-017-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Transmissão e Totalização de resultados	Acompanhamento das etapas de transmissão e totalização de resultados	SSAE/COELE/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/10	Concluída	100%	Outubro/24: - Projeto desenvolvido para uso interno da SSAE e das Zonas Eleitorais		
2024	87	2024-024-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Diárias	Implementação de painel de BI ligado à área de Cálculos e Conferências da SGP contendo informações sobre as DIÁRIAS dos servidores.	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/11	Concluída	70% 100%	Outubro/24: - Projeto concluído e em ambiente de produção.  Julho/24: - O ETL está pronto. - Falta publicar no dados abertos e criar os painéis.		
2024	88	2024-021-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Cadastro Eleitoral	Implementação de painéis de BI relacionados ao Cadastro Eleitoral	STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/11	Concluída	80% 100%	Outubro/24: - Projeto concluído em em ambiente de produção.  Julho/24: - Ingestão funcionando e um painel quase pronto ( Pendente de validação do cliente )		
2024	89	2024-009-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Graus.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01	Em andamento	90%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Junho/24: - Projeto finalizado, passando por testes em validação e homologação		
2024	90	2024-008-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01	Em andamento	90%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Julho/24: - Painél pronto, aguardando ser implantado no Gateway e compartilhado com o cliente para homologação		
2024	91	2024-018-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultados das Eleições	Painéis de resultado das eleições atuais, em complementação ao TSE, e resultados históricos.	STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/06	2024/12	Concluída	80% 100%	Outubro/24: - Renata teve dificuldades em validar a consistência dos dados, e o projeto foi revisado para fazer uso do ETLD.  Julho/24: - O escopo do trabalho mudou, agora será necessário consumir todos os dados do TSE. - Ingestão feita. - Trabalhando nas regras de negócio - Painel em processo de construção		
2024	92	2024-006-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Servidores do TRE-RN	Implementação de painéis de BI apresentando informações sobre a SGP do TRE-RN.	SEDES/COPES/SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2024/12	Concluída	90% 100%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial.  Julho/24: - Ingestão pronta - BR quase pronto - BI sendo construído - Aguardando validação de informações com o cliente		
2024	93	2024-007-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Dados de Pessoal para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2025/01	Em andamento	80% 95%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Julho/24 - Projeto realocado para Elder (em processo de apropriação da solução)		
2024	94	2024-016-RES4-BI	BI SJ – iPleno (Pedido de Vistas)	Ajuste na base de dados do iPleno relacionado ao pedido de vistas de processos pelas autoridades.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12	Cancelada	0%	Outubro/24: - Projeto cancelado em virtude da descontinuidade do sistema iPleno, cujas tratativas já estão sendo avaliadas pelas áreas técnicas e negociais.  Junho/24: - A ser analisado o possível cancelamento do projeto em virtude da desativação do sistema iPleno		
2024	95	2024-025-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COPAT/SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12	Em andamento	80%	Outubro/24: - Projeto em fase final de desenvolvimento. Em breve será enviado para homologação pela área negocial.		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2024													
VERSÃO 3.0													
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2024	96	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2025/01	2025/03	Não iniciada	0%		
2025	97	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03	Em andamento	50% 90%	<b>Outubro/24:</b> - O escopo do projeto está sendo revisto pela equipe da Residência.  <b>Julho/24:</b> - Em processo de reparação, problemas com as fontes de dados são o maior empecilho. - Reorganizando fontes de dados	
2025	98	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03	Em andamento	40% 50%	<b>Outubro/24:</b> - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados.  <b>Julho/24:</b> - Feita a ingestão do DL1. - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.	
2025	99	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03	Em andamento	0% 10%	<b>Outubro/24:</b> - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições	
2025	100	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	Pausada	70%	<b>Outubro/24:</b> - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da Residência.  <b>Junho/24:</b> - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis ( BIgestão, BIMonitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramente Web de exploração de dados ( em desenvolvimento ) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes ( finalizado )	
2025	101	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	CONTÍNUO		<b>Junho/24:</b> - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador	



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STIE - ANO 2024  
VERSÃO 4.0

ITEM	CAPACITAÇÃO	PÚBLICO ALVO (SETOR)	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	MODALIDADE /LOCAL	INSCRIÇÃO	DIÁRIAS	PASSAGENS	TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL DA DESPESA	STATUS
1	Administração de Base de Dados Oracle 19c - Online	SBDS	3	40h	Online	R\$ 4.200	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 13.200,00	REALIZADO
2	Orquestração de Containers com Uso de Kubernetes	SNT, SDS, SBDS	8	48h	In Company	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	CANCELADO
3	CI/CD: Integração e Entrega Continua	SNT, SDS	8	48h	In Company	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00	CANCELADO
4	Participação no CONIP JUD 2024	STIE, COINF, COSIS	3	16	Presencial		R\$ 2.964,22	R\$ 2.453,80	R\$ 5.418,02	R\$ 16.254,06	REALIZADO
5	Participação no ENASTIC 2024	STIE, GAPSTIE, EJE, LIODS	5	24	Presencial		R\$ 3.931,95	R\$ 3.130,24	R\$ 7.062,19	R\$ 34.924,62	REALIZADO
6	Segurança de Redes e Sistemas	SSI	1	40h	Presencial	R\$ 960,00	R\$ 5.256,10	R\$ 3.400,22	R\$ 9.616,32	R\$ 0,00	CANCELADO
7	Tratamento de Incidentes de Segurança	SSI	2	40h	Presencial	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 960,00	R\$ 1.920,00	REALIZADO
8	Ethical Hacking	SSI	1	40h	EAD/Instrutor	R\$ 11.114,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.114,15	R\$ 11.114,15	REALIZADO
9	Solução de Inteligência Cibernética	SSI	3	40h	EAD	R\$ 22.520,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.520,00	R\$ 67.560,00	EM ANDAMENTO
10	Curso de contratações de TIC	STIE	4	16h	EAD/Instrutor	R\$ 2.048,78	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 2.048,78	R\$ 0,00	CANCELADO
TOTAL:			21							144.972,83	
DOTAÇÃO										153.167,93	
SALDO										8.195,10	Devolvido como sobra

\*O valor de R\$ 67.560,00 foi inscrito em RP para realização da capacitação no ano de 2025

ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	VERSÃO 1.0	2.0VERSÃO	VERSÃO 3.0	VERSÃO 4.0	VERSÃO 5.0	VERSÃO 6.0	VERSÃO 7.0	Valores pagos	Inscrito em RPP - Liquidados a pagar	Inscrito em RPP - A liquidar	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATEGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 7.0	
					DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																								
1A	STI.POO_24.02A (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça EleitoralJERN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps) (NOVO CONTRATO 2023)	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	454.810,00	454.810,00	454.810,00	400.446,00	374.845,00	364.031,65	350.832,00	348.812,49	332.729,27	16.083,22	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	INTERJATO - Contrato nº 7/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) PAE Planejamento: 803/2022 PAE Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 108/2022) PAE Gestão: 1289/2023 SEI pagamento: 1026/2024  Nota de empenho: 2024NE000150 - R\$ 347.834,12 Pago:R\$ 331.750,90 A liquidar inscrito em Restos a Pagar R\$ 16.083,22  Nota de empenho: 2024NE000569 - R\$ 978,37 (despesas exercícios anteriores) Pago: R\$ 978,37  RENOVAÇÃO  Pelo controle de pagamento de Daniel - R\$ 328.917,27 Dá uma diferença de R\$ 2.833,63 Achei no SEI 1026/2024, duas notas fiscais no valor de R\$ 3.812,00 que não vi a quitação	
1B	STI.POO_24.02A	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça EleitoralJERN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	30.08.2024	29.11.2024	31.01.2025	28.02.2025	31.05.2025	NA	13.08.2024	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: SEI Planejamento: 7638/2024
2A	STI.POO_24.02B (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça EleitoralJERN - Capital - 1 circuito de 10Gbps) (NOVO CONTRATO 2023)	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	40.824,00	40.824,00	40.824,00	40.824,00	39.817,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	35.640,00	3.240,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SITECNET - Contrato nº 8/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) PAE Planejamento: 803/2022 PAE Seleção Fornecedor: 8204/2022 (PE 108/2022) PAE Gestão: 1290/2023 SEI Pagamento: 1689/2024  Nota de empenho: 2024NE000207 - R\$ 38.880,00 Pago:R\$ 35.640,00 A liquidar inscrito em Restos a Pagar R\$ 3.240,00  RENOVAÇÃO	
2B	STI.POO_24.02B	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça EleitoralJERN - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	30.08.2024	29.11.2024	31.01.2025	28.02.2025	31.05.2025	N	13.08.2024	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: SEI Planejamento: 7638/2024
3A	STI.POO_24.04 (Despesa Continuada)	Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JERN	COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	31.080,00	31.080,00	31.080,00	31.080,00	30.313,00	29.600,00	29.600,00	29.599,92	27.133,26	2.466,66	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	DB3 (antiga Forte) - Contrato nº 55/2020 (vigência: 01.10.2020 a 01.04.2023, Renovação do contrato por mais 30 meses - 01.04.2023 a 01.10.2025 (termo aditivo 01) ) PAE 6127/2020 SEI Pagamento: 3282/2024  Nota de empenho: 2024NE000248 - R\$ 29.599,92 Pago:R\$ 27.133,26 A liquidar inscrito em Restos a Pagar R\$ 2.466,66	
3B	STI.POO_24.04B	Estudo para continuidade do Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JERN	COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	30.11.2024	31.01.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	N	01.10.2025	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para nova contratação
4A	STI.POO_24.14 (Despesa Continuada)	Continuidade do serviço de acesso à internet - Redundância (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JERN	COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	54.484,00	54.484,00	54.484,00	54.484,00	53.140,00	51.890,00	51.890,00	51.889,60	51.889,60	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet - Contrato nº 62/2019 - TRE/RN (vigência: Prorrogação por 30 meses - 06.06.2022 a 06.12.2024 - PAE 8447/2019 - Assinado Termo Aditivo 01) SEI Pagamento: 0959/2024  Nota de empenho: 2024NE000183 - R\$ 51.889,60 Pago:R\$ 51.889,60
4B	STI.POO_24.14	Estudo para continuidade do serviço de acesso à internet - Redundância (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JERN	COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	31.01.2024	30.04.2024	28.06.2024	31.07.2024	07.12.2024	N		Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.796,00	3.796,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: SEI Planejamento: 810/2024 SEI Seleção Fornecedor: 7717/2024 cálculo proporcional a 24 dias - CINTE (R\$750,00) : R\$ 600,00 2024NE753 = R\$ 600,00 Pago:R\$ 0,00 A liquidar inscrito em Restos a Pagar R\$ 600,00
5A	STI.POO_24.03	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública	COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC ARMADAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	450.311,00	450.311,00	450.311,00	410.700,00	420.878,00	430.848,00	421.376,38	421.376,38	402.683,38	18.693,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	RJR Comercio e Serviços de Informatica Ltda - Contrato n.º 47/2020 (vigência 16.09.2020 a 16.03.2023) - Renovação do contrato por mais 30 meses (PAE 2856/2020) - Termo Aditivo 3 - 16.03.2023 a 16.09.2025 SEI Pagamento: 00230/2024  Pielitos: 200 contas adicionais x R\$ 41,54 = R\$ 8.308,00 Ordinário: R\$ 421.376,38  Nota de empenho: 2024NE000053 - R\$ 421.376,38 Pago:R\$ 402.683,38 A liquidar inscrito em Restos a Pagar R\$ 18.693,00	
5B	STI.POO_25.05B	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública (expansão para outros serviços em nuvem com inteligência artificial	COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros, com a expansão para uso dos serviços de inteligência artificial.	30.11.2024	31.01.2025	31.03.2025	30.04.2025	15.07.2025	N	16.09.2025	Custeio TIC ARMADAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3		Estudo para nova contratação
6	STI.POO_24.13	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	NA	NA	31.01.2024	29.02.2024	31.08.2024	N	NA	Investimento INV EQUITIC	I	N	33.90.52.3563.90.40.02.3563	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	2.871.359,00	621.359,00	621.359,00	2.693.713,42	2.660.682,72	4.217.613,99	5.505.891,14	5.660.997,03	5.112.018,66	311.795,73	237.183,54	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE		
												Investimento INV PERMAN	I	N	33.90.52.30.0022.44.90.52.30.0022	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	108.000,00	46.320,00	46.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Planejamento: PAE 8401/2023 Seleção Fornecedor: 3408/2024 Valor total pago: R\$ 5.112.018,66 Valor liquidado inscrito em Restos a Pagar: R\$ 237.183,54 Valor a liquidar inscrito em Restos a Pagar: R\$ 311.795,73	
												Custeio TIC MATCON	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	91.080,00	42.224,06	42.224,06	0,00	0,00	0,00	4.198,95	4.198,95	4.198,95	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	
6B	STI.POO_25.06A	Estudo para renovação dos equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	30.09.2024	19.12.2024	28.02.2025	01.04.2025	31.07.2025	N	29.08.2025	Investimento INV EQUITIC	I	N	33.90.52.3563.90.40.02.3563	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	SEI Planejamento 9401/2024
7A	STI.POO_24.01 NA (Despesa Continuada)	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JERN	SMI/COINF/STIE	Garantir a continuidade na prestação do suporte técnico para as Zonas da Capital, Zonas do Interior e Secretarias.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.11.0011	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	625.830,00	625.830,00	625.830,00	625.830,00	737.591,00	700.000,00	523.916,91	517.240,02	501.985,21	15.254,81	0,00	AC.3	Seção de Microinformática/COINF/STIE	GETI - Contrato nº 18/2022 - TRE/RN - (vigência: 22.08.2022 a 01.02/2025) PAE Planejamento: 6321/2020 PAE Seleção Fornecedor: 2240/2021 PAE Gestão: 7281/2022 SEI Pagamento:1454/2024  Nota de empenho: 2024NE000196 - R\$ 504.851,01 Pago: R\$ 489.596,20 A liquidar inscrito em Restos a Pagar R\$ 15.254,81  Nota de empenho: 2024NE000690 - R\$ 12.389,01 Pago: R\$ 12.389,01  Pielitos: 2024NE000691 - R\$ 208.534,28 Pago: R\$ 192.331,06	
7B	STI.POO_24.01 NA (Despesa Continuada)	Estudo para continuidade da Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JERN	SMI/COINF/STIE	Garantir a continuidade na prestação do suporte técnico para as Zonas da Capital, Zonas do Interior e Secretarias.	31.05.2024	31.07.2024	30.08.2024	30.09.2024	02.02.2025	NA	01.04.2024	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.11.0011	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Microinformática/COINF/STIE	Estudo para continuidade: Renovação do Contrato nº 18/2022 - TRE/RN - GETI (vigência: 22.08.2022 a 01.02.2025) PAE Gestão: 7281/2022  Prorrogação até AGO/2027
8	STI.POO_24.05	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	EJE / ASCOM	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de vídeos destinados a cursos a distância e elaboração de artes para a ASCOM e NBE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.37.01.0154	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	188.400,00	221.523,94	221.523,94	221.523,94	221.523,94	225.353,00	230.688,01	230.103,07	206.409,20	22.740,59	953,28	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Contrato n.º 22/2023 - GETI (16.10.2023 a 16.04.2026 - 30 meses) PAE Planejamento 11679/2022 PAE Seleção Fornecedor: 2700/2023 PAE Gestão: 9108/2023 SEI Pagamento: 479/2024  Nota de empenho: 2024NE000112 - R\$ 217.892,52 Pago: R\$ 206.409,20 A liquidar inscrito empen	



ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVACÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança da Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	VERSÃO 1.0	2.OVERSÃO	VERSÃO 3.0	VERSÃO 4.0	VERSÃO 5.0	VERSÃO 6.0	VERSÃO 7.0	Valores pagos	Inscrito em RPP - Liquidados a pagar	Inscrito em RPP - A liquidar	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 7.0	
					DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO																								
9C	STI.POO_24.07	Estudo para continuidade do Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	Agrupar todos os canais de atendimento do TRE, realizando gestão de filas de atendimento aos eleitores, podendo se utilizar de redes sociais, aplicativos de mensagens diversos e Whatsapp Business	30.11.2024	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	N	02.08.2025	Custeio TIC ARMAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3		Estudo para continuidade	
10	STI.POO_24.20	Licenças para acesso simultâneo ao VDI	COINF/STIE	Aquisição de licenças adicionais para acesso simultâneo aos serviços de VDI	NA	NA	28.02.2024	31.03.2024	31.05.2024	N	NA	Investimento INV SOFTWR	I	N	44.90.40.05.0008	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	86.400,00	121.600,00	121.600,00	192.302,64	210.468,34	122.895,36	122.895,36	122.895,36	122.895,36	122.895,36	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Telefonica Brasil S.A. PAE Planejamento: 9684/2023 Seleção Fornecedor: 3737/2024 - PREGÃO 90046/2024  Microsoft Windows Server 2022 - Datacenter - 2 cores: R\$ 3.413,76 x 36 licenças = R\$ 122.895,36 - Licença Perpetua  2024NE000430 - R\$ 122.895,36 Pago: R\$ 122.895,36
11	STI.POO_24.06 (Despesa Continuada)	Segurança Cibernética - Antivírus para servidores de rede	COINF/STIE	Contratação de 190 (cento e noventa) unidades de subscritões de Solução de Segurança para Servidores (Linux e Windows), com XDR e Sandbox, incluindo manutenção, garantia (update e upgrade) por 60(sessenta) meses, com pagamento de subscritões a cada 12 (doze) meses, conforme item 03, da Ata de Registro de Preços ne 01/2022-TSE, decorrente do Edital de Licitação TSE nº 84/2021.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	PAE Planejamento: 1397/2022 PAE TR e ARP 01/2022- TSE: 2865/2022 PAE Gestão: 4107/2022 (2022PE000448 - R\$ 5.098,33) - Contrato nº 13/2022 (19.05.2022 s 19.05.2027) (190 servidores de rede x R\$ 230,00)/ 7 meses (20.05 a 31.12) = R\$ R\$ 5.098,33 2023: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2024: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2025: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2026: 01.01 a 19.05 (R\$ 3.641,67) OBSERVAÇÃO: VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2024: R\$9.440,59 - Transferido para Segurança da Informação
12	STI.POO_24.18	Coletores de dados - ASIWEB	SEPAT/COLIC/SAOF	Substituição dos coletores de dados descontinuados que utilizam windows mobile, utilizados no Sistema ASIWEB	NA	29/02/2024 (Participe SRP -JE)	30/04/2024 (Participe SRP -JE)	NA (Participe SRP -JE)	28.02.2024	N	NA	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.40.02.35	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	55.480,00	55.480,00	55.480,00	55.480,00	24.908,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	PAE Planejamento: 9558/2023  SRP TSE: PE nº 90024/2024 (09.07.2024) - SEI 2022.00.000001371-0 - Natureza da despesa: material permanente - 44905200  1. Leitores de dados de radiofrequência e código de barras, compatível e homologado para uso no Sistema ASIWEB, do tipo desacoplado - cota principal 5 un. x R\$ 4.022,50 = R\$ 20.112,50  2. Smartphones baseados no Android OS - cota principal - com as seguintes especificações mínimas:  5 un. x R\$ 1.399,00 = R\$ 6.995,00 5 un. x R\$ 959,23 = R\$ 4.796,15 TOTAL: R\$ 24.908,65  OBSERVAÇÃO: ADIADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025
13	STI.XOO_24.22	Licenças Power BI	COSIS/STIE	Possibilitar a elaboração de painéis de business intelligence(BI) interativos, com suporte à autenticação e autorização de acesso por usuários específicos, visando ampliar as soluções de BI adotadas no âmbito do Tribunal.	NA	29.02.2024	26.03.2024	18.11.2024	19.12.2024	N	31.01.2025	Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	LI	PAE Planejamento: 11884/2023  Seleção do Fornecedor: 10786/2024 Gestão do Contrato: 00978/2025  OBSERVAÇÃO: ADIADO PARA O EXERCÍCIO DE 2025
14	STI.POO_23.08	Licenças GENETEC	COSIS/STIE	Mantém atualizada a licença do software gerenciador "Genetec Security Center" garantindo a segurança e a integração dos hardware que compõem a infraestrutura de rede em vídeo monitoramento e Controle de Acesso de pessoas e veículos nas unidades prediais do TRE-RN.	NA	NA	NA	NA	NA	N	NA	Investimento INV SOFTWR	I	N	44.90.40.05.0008	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	15.025,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00	29.890,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	PAE Planejamento: 2044/2023 PAE Fornecedor: 10438/2023  Nota de empenho: 2024NE000237: 10 licenças x R\$ 2.989,00 - R\$ 29.890,00 Valor liquidado: R\$ 29.890,00 MCR Sistemas e Consultoria Ltda PAE Planejamento: 5954/2023 SEI Seleção Fornecedor: 1502/2024 Adobe Creative Cloud (3 licenças por 3 anos) Valor de licença anual (pesquisa preços SETEC): R\$ 5.267,27 3 licenças de 3 anos x R\$ 13.975,00 = R\$ 41.925,00 Nota de empenho 2024NE000598 Pago: R\$ 41.925,00	
15	STI.POO_23.07	Aquisição de soluções de software para unidades administrativas solicitantes	COSIS/STIE	Aquisição de solução de software para elaborar e aprimorar apresentações e vídeos animados para as ações de educação à distância desenvolvidas para o Ambiente Virtual de Aprendizagem EAD TRE-RN e Aquisição de solução de software com ferramenta de edição de planilhas eletrônicas	NA	NA	NA	NA	NA	N	NA	Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	41.261,00	41.261,00	41.261,44	41.925,00	41.925,00	41.925,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	SEI Planejamento: 3496/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 9077/2024 5 licenças Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenter: Standard (5 x R\$ 70.000,00 = R\$ 350.000,00) G3 Comércio e Sistemas 2024 NE 719 - TIC LOCSOF - R\$ 216.000,00 2024 NE 720 - TIC LOCSOF - R\$ 144.000,00 Valor liquidado total SEI Planejamento: 6901/2024 5 x R\$ 12.600,00 = R\$ 63.000,00	
16	STI.XOO_24.21	Aquisição de licenciamento Red Hat Linux para os servidores hoje em uso, visando garantir o adequado suporte e atualizações deste dos serviços deste Regional.	COINF/STIE	Renovar as licenças para garantir a entrega contínua do suporte e atualizações do sistema operacional Linux existente hoje nos servidores de rede onde ficam hospedados os sistemas e serviços deste Regional, que vencem em dezembro de 2024.	30.04.2024	30.06.2024	30.08.2024	30.09.2024	30.11.2024	N	01.12.2024	Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	293.145,00	293.145,00	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	OBSERVAÇÃO: Alterado para 3 licenças de 3 anos com sugestão de carona em ARP. Encontra-se na ADIO para análise do TR do outro órgão. 3 x 33.253,13 = 99.759,39
17	STI.XOO_24.22	Aquisição de licenciamento BIM	SENGE/COAD/SAOF	O uso do BIM no desenvolvimento e no recebimento de projetos do TRE/RN dá cumprimento ao Art. 19, § 3º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), sendo, para tanto, necessária a aquisição de licenças de software para a sua implantação e capacitação.	31.07.2024	15.09.2024	15.10.2024	30.10.2024	30.11.2024	N		Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00	99.759,39	99.759,39	99.759,39	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	MCR Sistemas e Consultorias 2024 NE 720 - TIC LOCSOF - R\$ 33.253,13 2024 NE 720 - TIC LOCSOF - R\$ 66.506,26 Valor liquidado total SEI Planejamento: 6901/2024 5 x R\$ 12.600,00 = R\$ 63.000,00	
18	STI.XOO_24.23	Aquisição de Certificados digitais emitidos por entidade governamental	COFIN/SAOF	Exigência de utilização de certificado digital emitido por entidade governamental, para fins de acesso ao SIAFI por parte de todos os usuários que não possuem perfil exclusivamente de consulta, a partir do dia 23.07.2024, em razão de determinação da Secretaria do Tesouro Nacional.	27.06.2024	08.07.2024	15.07.2024	NA	22.07.2024	N		Custeio TIC ARMAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	25.420,50	8.812,44	8.812,44	7.795,62	1.016,82	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SERPRO 150 certificados x R\$ 169,47 = R\$ 25.420,50 - contrato 52 certificados x R\$ 169,47 = R\$ 8.812,44 - previsto para 2024 SEI 5658/2024 2024NE000412: R\$ 8.812,44 Pago: R\$ 7.795,62 A liquidar inscritos em Restos a Pagar: R\$ 1.016,82
19		Aquisição de peças de 3 urnas eletrônicas danificadas	COELE/STIE	Viabilizar a utilização de 3 urnas eletrônicas que atualmente se encontram fora de operação em razão de necessidade de substituição de peças.	11.07.2024	07.08.2024	12.08.2024	NA	15.09.2024	N		Custeio TIC MATCON	C	N	33.07.0001	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Uma Eletrônica/COELE/STIE	Transferido para pleitos (novo valor R\$ 3.760,79)
20	STI.POO_25.16	Estudo para aquisição de solução de acessibilidade digital	COSIS/STIE	A aquisição de solução de acessibilidade digital visa promover a inclusão e a acessibilidade em nossos portais na Intranet, garantindo que todos os servidores, incluindo aqueles com deficiências visuais ou outras necessidades especiais, possam acessar as informações e recursos disponíveis de maneira acessível e eficiente.	18.11.2024	19.12.2024	28.02.2025	31.03.2025	30.06.2025	N	30.08.2025	Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	SEI fase de planejamento - 10137/2024 1 licença por 3 anos - 25.000,00
21	STI.POO_25.17	Estudo para contratação de serviços de computação em nuvem	COSIS/STIE	Atender as demandas atuais de fornecimento de serviços em nuvem	18.11.2024	19.12.2024	28.02.2025	31.03.2025	31.05.2025	N	30.06.2025	Custeio TIC ARMAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Créditos de serviços em nuvem (CSN) - contratação de 3 anos, previsto para o contrato: 300.000 créditos x R\$3,62 = R\$ 1.086.000,00 200 horas de serviço técnico x R\$520,00 = 104.000,00 1 treinamento em company x R\$35.000,00 total da solução: R\$1.225.000,00 previsto para 2025
22	STI.POO_25.15	Estudo para contratação de serviço de desenvolvimento de sistemas, business intelligence e inteligência Artificial	COSIS/STIE	Contratação de serviço terceirizado para desenvolvimento de painéis de BI, uso de IA e desenvolvimento de sistemas administrativos	18.11.2024	31.01.2025	28.02.2025	01.04.2025	30.06.2025	N	NA	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.11.0011	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para contratação
23	STI.POO_25.12	Aquisição de extensão de garantia de hardware e licenciamento para os nós de hiperconvergência adquiridos em 2020.	COINF/STIE	Estender a garantia de hardware, suporte e atualizações do fabricante dos nós de hiperconvergência adquiridos em 2020 cuja vigência da garantia termina em outubro de 2025.	30.11.2024	30.04.2025	31.05.2025	31.07.2025	30.09.2025	N	31.10.2025	Custeio TIC LOCSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	
24	STI.POO_25.13	Contratação de uma empresa especializada para manutenção de equipamentos críticos de datacenter como nóbreake e ar-condicionado da solução Smartrow e Smartcabinet.	COINF/STIE	Garantir o pleno funcionamento dos racks autônomos adquiridos pelo Tribunal em utilização no prédio Sede e COJE	30.11.2024	31.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	30.09.2025	N	31.10.2025	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.21.0106	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO																	2.123.884,00	2.140.012,00	2.140.012,00	2.261.561,44	2.520.648,94	2.462.565,32	2.181.517,80	2.172.235,98	2.091.187,60	80.595,10	853,39	9.281,82			
MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO																	3.065.759,00	3.065.759,00	3.065.759,00	3.020.921,06	3.020.921,06	4.395.308,00	5.658.676,50	5.813.783,29	5.264.804,02	311.795,73	237.183,54	155.106,79			
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL																	5.188.843,00	5.205.771,00	5.205.771,00	5.282.482,50	5.541.570,00	6.857.873,32	7.840.194,30	7.986.019,27	7.355.991,62	391.890,83	238.136,82	145.824,97			

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																								
PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DE TIC - ANO 2024																								
VERSÃO 6.0 - Segurança da Informação																								
ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA VERSÃO 1.0	ESTIMATIVA VERSÃO 2.0	ESTIMATIVA VERSÃO 3.0	ESTIMATIVA VERSÃO 4.0	VERSÃO 5.0	VERSÃO 6.0	VERSÃO 7.0	Valores pagos	Inscrito em RPP	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 7.0	
1	STI.POO_24.11	Gestão de Riscos e LGPD	SSI/COINF/STIE	A solução de Gestão de Riscos e LGPD visa a implementação uma estratégia de gestão de risco robusta no órgão de forma a adotar medidas de segurança adequadas para proteção dos dados pessoais que possuem dos cidadãos brasileiros contra possíveis violações de segurança, estabelecer requisitos quanto a coleta, processamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais e processos para gerenciar riscos relacionados à privacidade de dados incluindo a identificação de possíveis vulnerabilidades de segurança, avaliação dos riscos identificados e implementação de medidas de mitigação para minimizar o impacto desses riscos, bem como a de regulamentar o uso desses dados e garantir que estão em conformidade com as leis e regulamentações de privacidade de dados.	N	Investimento SIN INVSCOF	I	S	44.90.40.05.0004	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	400.000,00	400.000,00	400.000,00	495.399,00	495.399,00	495.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	Participe em licitação conjunta da JE	
2	STI.POO_24.12	Solução de inteligência cibernética	SSI/COINF/STIE	A solução de Monitoramento de Rede e a Inteligência de Ameaças são dois aspectos cruciais da segurança da informação moderna. Essas medidas podem ajudar ao órgão a identificar e responder rapidamente a possíveis ameaças à segurança da informação, minimizando assim o impacto de possíveis violações de segurança e protegendo as informações sensíveis de seus usuários.	N	Custeio SIN LOCSCOF	C	S	33.90.40.06.0135	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	3.809.494,00	3.809.494,00	3.681.700,00	3.681.700,00	3.678.160,00	3.678.160,00	3.678.160,00	3.678.160,00	3.678.160,00	3.664.000,00	14.160,00	AC.3	Seção de Suporte e Informação/COINF/STIE	ARP 2/2023 - TRE-DF SEI 00618/2024 Planejamento: 9656/2023 Seleção do fornecedor: 3413/2024 Gestão do contrato: 4210/2024 Execução do contrato: 7560/2024 SEI 00905/2024 (Oracle como Segurança da Informação): remanejamento de valor deste processo para atender a despesa da Solução de Inteligência cibernética 2024NE000285 - Valor empenhado: R\$ 3.678.160,00 Valor liquidado e pago: R\$ 3.664.000,00 Valor inscrito em Restos a Pagar: R\$ 14.160,00
3		Licenças de suporte e atualização de versão das ferramentas Oracle Advanced Security (TDE e Data Reduction) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools	COSIS/STIE	Manter atualizados e com suporte técnico especializado os mecanismos de segurança Oracle Advanced Security (TDE e Data Reduction) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools, nos servidores de banco de dados Oracle do TRE-RN. Esses mecanismos, adquiridos pelo TRE-RN no ano de 2022, com licenciamento de uso perpétuo e com contrato de suporte e atualizações vigentes até 28/12/2023, permitem o uso de recursos avançados de segurança para os dados armazenados no "Oracle Database". O Oracle Database é um sistema de gerenciamento de banco de dados ao qual parte significativa das soluções da Justiça Eleitoral, cujas seminais datam de meados da década de 1990, é estruturalmente acoplada, gerando estreita dependência tecnológica das soluções ao produto. A adoção do Oracle Database tornou-se mandatória – como um padrão “de facto” – para os Tribunais Regionais Eleitorais, vez que devem consumir soluções providas, de modo compulsório e uniformizado,	N	Custeio SIN LOCSCOF	C	S	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	134.837,00	134.837,00	134.837,00	134.837,00	130.486,68	130.486,68	0,00	AC.3	Seção de Banco de Dados e Sistemas/COSIS/STIE	PAE Planejamento: 9411/2023 PAE Seleção Fornecedor: 11647/2022 Contrato 03/2024 - TRE/RN Inscrito em RP - cancelado em 4.1.2024 SEI da Execução do Contrato - 8991/2024  ATUALIZAÇÃO: Oracle Advanced Security - Processor Perpetual (26336739) - 8 unid. 27.12.2023 a 26.12.2024: R\$ 55.805,64 Oracle Database Vault - Processor Perpetual (26336739) - 8 unid. 27.12.23 a 26.12.2024: R\$ 42.784,32 Subtotal Suporte: R\$ 98.589,96  2024NE000623 - Valor total liquidado: R\$ 130.486,68	
4		Segurança Cibernética - Antivirus para servidores de rede	COINF/STIE	Contratação de 190 (cento e noventa) unidades de subscrições de Solução de Segurança para Servidores (Linux e Windows), com XDR e Sandbox, incluindo manutenção, garantia (update e upgrade) por 60(sessenta) meses, com pagamento de subscrições a cada 12 (doze) meses, conforme item 03, da Ata de Registro de Preços nº 01/2022-TSE, decorrente do Edital de Licitação TSE nº 84/2021.	N	Custeio SIN LOCSCOF	C	S	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,59	9.440,59	9.440,59	0,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	PAE Gestão: 4107/2022 (2022PE000448 - R\$ 5.098,33) - Contrato nº 13/2022 (19.05.2022 s 19.05.2027) (190 servidores de rede x R\$ 230,00) / 7 meses (20.05 a 31.12) = R\$ R\$ 5.098,33 2023: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2024: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2025: 2023: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2026: 01.01 a 19.05 (R\$ 3.641,67) VALOR PARA O EXERCÍCIO DE 2024: R\$9.440,59	
SEGURANÇA - CUSTEIO											3.809.494,00	3.809.494,00	3.681.700,00	3.616.537,00	3.612.997,00	3.612.997,00	3.622.437,59	3.616.087,27	3.603.927,27	14.160,00				
SEGURANÇA - INVESTIMENTO											400.000,00	400.000,00	400.000,00	495.399,00	495.399,00	495.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL - SEGURANÇA											4.209.494,00	4.209.494,00	4.081.700,00	4.311.936,00	4.308.396,00	4.308.396,00	3.822.437,59	3.618.087,27	3.603.927,27	14.160,00				



[illegible]

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE															
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E ELEIÇÕES															
GABINETE E APOIO À PLANEJAMENTO E GESTÃO DA SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E ELEIÇÕES															
Medição dos indicadores de desempenho - Campanha 2 - PDTC 2024															
Ciclo 1 - Car 2															
Objetivos			Resultados-chave				Medição							Observação	
ID	Tema	ID	MTR Tier 2	Fórmula	Meta 1º trimestre 2024	Meta 2º trimestre 2024	Meta 3º trimestre 2024	Meta 4º trimestre 2024	Responsável	1º Trimestre	2º Trimestre / 1ª Sem	3º Trimestre	4º Trimestre / 2ª Semestre		
O01	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	09	Aumentar o percentual de chamadas atendidas de acordo com o SLA	Métrica direta na entrega de serviços	85%	85%	85%	85%	CONF	98%	98%	97,24%	98,33%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112</a>	
O01	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	10	Total de notas (limpo por chamada)/Quantidade de avaliações registradas) x 100	Total de notas (limpo por chamada)/Quantidade de avaliações registradas) x 100	95%	95%	95%	95%	CONF	97,60%	97,80%	98%	100,00%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112</a>	
O01	Buscar a excelência no desenvolvimento de sistemas administrativos	11	Aumentar a satisfação do usuário e o desenvolvimento e suporte dos sistemas	Soma das notas atribuídas a cada sistema desenvolvido/Quantidade de sistemas entregues e avaliados no período	n/a	9,5	n/a	9,5	CDSIS	-	10,0	-	9,48	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112</a>	
O04	Incentivar a cultura de inovação	12	Aumentar iniciativas de TIC relacionadas à inovação	Contagem sequencial	n/a	1	n/a	1	CDSIS e CONF	-	2	-	4	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112</a>	
O05	Garantir o acompanhamento da Governança e Gestão de TIC	13	Índice de modelagem de processos	[Número de processos modelados no ano de referência] / [Número de processos em andamento no ano de referência] x 100	n/a	50%	n/a	50%	GAPSTIE	Semestral	3 processos servidos em 2024	-	100%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112</a>	
O06	Aprimorar a execução operacional de TIC	14	Maximizar o percentual de cumprimento de Contratos de TIC liquidados no exercício	[Orçamento liquidado] / [Orçamento previsto no exercício] x 100	n/a	25%	n/a	90%	GAPSTIE	Semestral	3 processos servidos em 2024	-	92,11%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112</a>	
O06	Aprimorar a base de planejamento das contratações e aquisições	15	Cumprimento dos prazos de entrega de materiais (RDO, EP e TR)	[Quantidade de artefatos entregues] / [Quantidade de artefatos previstos para o trimestre] x 100	80%	80%	80%	80%	GAPSTIE	Trimestral	2 modelos	73%	62%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112</a>	
O06	Aprimorar a base de planejamento das contratações e aquisições	16	Aumentar o percentual anual de aplicações de licitação com análise de mercado antes da abertura de propostas e a redução de riscos socioambientais na etapa de planejamento.	[Total de contratações realizadas com análise de mercado antes da abertura de propostas] / [Total de contratações realizadas no semestre] x 100	n/a	80%	n/a	80%	GAPSTIE	Anual	100%	-	100%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112</a>	
O08	Realizar o planejamento de software e infraestrutura de TI para o desenvolvimento de sistemas	17	Manter a atualização de bibliotecas e ferramentas de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas	[Quantidade de bibliotecas atualizadas no último trimestre] / [Quantidade total de bibliotecas utilizadas] x 100	50%	50%	50%	50%	CDSIS	Trimestral	31,91%	31,91%	45,92%	<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvYUgSdF7n1w6L6C3jMxVZ2T8XmP15Hq/edit#gid=208231112</a>	



Tribunal Regional Eleitoral do  
Rio Grande do Norte



**PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA  
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO  
TRE/RN**

**PDTIC 2025**

Natal/RN  
Fevereiro/2025



# **PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TRE/RN PDTIC 2025**

---

Versão 1.0

Natal/RN  
Fevereiro/2025



**COMPOSIÇÃO DO PLENO DO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**

**Desembargadora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo**  
Desembargadora Presidente

**Desembargador Ricardo Procópio Bandeira de Melo**  
Desembargador Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

**Juiz Fábio Luiz de Oliveira Bezerra**  
Juiz Federal

**Juíza Suely Maria Fernandes da Silveira**  
Juíza de Direito

**Juiz Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro**  
Juiz de Direito

**Doutor Marcello Rocha Lopes**  
Jurista

**Daniel Cabral Mariz Maia**  
Jurista

**Clarisier Azevedo Cavalcante de Moraes**  
Procuradora Regional Eleitoral



**COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
(CGOV TIC)**

**Desembargadora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo**  
Desembargadora Presidente

**Desembargador Ricardo Procópio Bandeira de Melo**  
Desembargador Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

**Doutor Diego Costa Pinto Dantas**  
Juiz Eleitoral Representante do 1º Grau

**Ana Esmera Pimentel da Fonseca**  
Diretora-Geral

**Simone Maria de Oliveira Soares Mello**  
Secretária de Administração, Orçamento e Finanças

**Cláudia Josemira Marinho de Lima**  
Secretária de Gestão de Pessoas

**João Paulo Araújo**  
Secretário Judiciário

**Marcos Flávio Nascimento Maia**  
Secretário de Tecnologia da Informação e Eleições



**COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
(COGESTIC)**

**Marcos Flávio Nascimento Maia**

Secretário de Tecnologia da Informação e Eleições

**Carlos Magno do Rozário Câmara**

Coordenador de Infraestrutura Tecnológica

**Maria Teresa Farache Porto**

Coordenadora de Eleições

**Osmar Fernandes de Oliveira Júnior**

Coordenador de Sistemas Corporativos



### **EQUIPE TÉCNICA**

Ana Karla Tomaz Costa (GAPSTIE)

Carlos André de Azevedo Moura (GAPSTIE)

Jussara de Gois Borba Melo Diniz (GAPSTIE)

### **COLABORADORES**

Daniel César Gurgel Coelho Ponte (SRI/COINF/STIE)

Denilson Bastos da Silva (SSI/COINF/STIE)

Dina Márcia de Vasconcelos Maranhão da Câmara (SMI/COINF/STIE)

Douglas Santos (SUE/COELE/STIE)

George Melo de Freitas Barbalho (SDS/COSIS/STIE)

José Frank Viana da Silva (SNT/COSIS/STIE)

Jussara de Gois Borba Melo Diniz (SPLE/COELE/STIE)

Theresa Regina Pereira Padilha (SSAE/COELE/STIE)

Thiago Fernandes da Silva Dutra (SBDS/COSIS/STIE)





## Controle de versão

Versão	Data	Descrição das Alterações	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
1.0	27/02/2025	Versão inicial	Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão/STIE	Comitê Gestor de TIC, em 12/02/2025	Comitê de Governança de TIC, em 27/02/2025

**SUMÁRIO**

<b>Controle de versão</b>	<b>8</b>
<b>Apresentação</b>	<b>10</b>
<b>Referências</b>	<b>11</b>
<b>Abreviaturas</b>	<b>12</b>
<b>Metodologia</b>	<b>13</b>
<b>Princípios e Diretrizes</b>	<b>14</b>
<b>Organização da STIE</b>	<b>15</b>
<b>Diagnóstico - Análise SWOT</b>	<b>17</b>
<b>Análise de Governança de TIC</b>	<b>18</b>
<b>Direcionadores Estratégicos</b>	<b>19</b>
Estratégias Nacionais	19
<b>Plano Estratégico JERN 2021-2026</b>	<b>21</b>
<b>Objetivos e indicadores</b>	<b>24</b>
1.Perspectiva Estratégica - Objetivos e Resultados-Chave de Camada 1	24
2.Perspectiva Tática - Objetivos e Resultados-Chave de Camada 2	25
<b>Planos de ação do PDTIC</b>	<b>26</b>
Plano de Demandas Internas (PDI)	27
Plano Anual de Capacitações de TIC	28
Plano de Contratações de Soluções de TIC 2025	28
<b>Riscos relacionados ao PDTIC</b>	<b>29</b>
<b>Fatores críticos de sucesso</b>	<b>30</b>
<b>Desafios</b>	<b>31</b>



## Apresentação

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) é o principal instrumento de orientação e direcionamento, empregado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições (STIE), para conduzir as principais ações do TRE-RN, no ano de 2025, no que se refere à gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

Dentro do cumprimento da missão constitucional do TRE/RN, o intuito deste Plano é realizar entregas aos servidores da Justiça Eleitoral do RN e aos usuários externos relacionados aos serviços de tecnologia necessários à melhoria contínua do processo eleitoral e da prestação jurisdicional, promovendo a integração das metas de TIC com os objetivos institucionais, além de assegurar o cumprimento dos princípios de governança, gestão eficiente de recursos, segurança da informação e inovação tecnológica.

Este PDTIC está alinhado à Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 (Resolução CNJ nº 325/2020), à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTICJUD) 2021-2026 (Resolução CNJ nº 370/2021) e ao Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte 2021-2026 (Resolução TRE-RN n.º 49/2021), e absorve, ao mesmo tempo, um viés estratégico e o nível tático-operacional.

Desde 2023, a vigência do PDTIC passou a ser anual, acompanhando a temporalidade dos seus planos derivados e vinculados, além dos planos de temporalidade estendida, que contemplam todo o ciclo da estratégia, iniciados no ano de 2021.

O ano de 2025 deve ser guiado pelas crescentes ações de evolução digital para entregar valor à sociedade, garantia da continuidade do negócio com medidas de segurança da informação e entrega de produtos e serviços eficientes e acessíveis.

**Marcos Flávio Nascimento Maia**

Secretário de Tecnologia da Informação e Eleições



## Referências

- Resolução CNJ nº 325/2020, que institui Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026
- Resolução CNJ nº 370/2021, que institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD 2021-2026);
- Guia Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário - versão 1.1 - CNJ
- Resolução CNJ nº 396/2021, que institui a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética do Poder Judiciário
- Resolução TRE/RN n.º 49/2021, de 28 de junho de 2021, que aprova o Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para o período de 2021-2026
- Portaria TRE-RN nº 178/2019-GP, de 06 de setembro de 2019, que institui o processo de Elaboração do Plano Diretivo de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
- Portaria TRE-RN nº 174/2019-GP, de 06 de setembro de 2019, que institui o processo Elaboração e Gestão do Plano de Contratação de TIC , no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
- Portaria TRE-RN nº 176/2019-GP, de 06 de setembro de 2019, que institui o processo Elaboração do Plano de Capacitação de TIC, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
- Portaria TRE-RN nº 165/2023-GP, de 15 de agosto de 2013, que institui a Gestão de Projetos Ágil - GPA, com a extensão de TI, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
- Portaria TRE-RN nº 166/2023-GP, de 15 de agosto de 2023, que institui o Plano de Gestão de Riscos de Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
- Resolução TRE/RN n.º 110/2023, de 15 de agosto de 2023, que institui a Política de Segurança da Informação (PSI), no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte.
- Portaria TRE-RN nº 163/2023-GP, de 15 de agosto de 2023, que institui o Plano de Ação para implementação dos protocolos e manuais previstos na Portaria CNJ nº 162/2021.



## Abreviaturas


TERMO	DESCRIÇÃO
CGOVTIC	Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
COGESTIC	Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação
CGPD	Comitê Gestor de Proteção de Dados
CNJ	Conselho Nacional de Justiça.
STIE	Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições
SGP	Secretaria de Gestão de Pessoas
SJ	Secretaria Judiciária
SAOF	Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças
COELE	Coordenadoria de Eleições
COINF	Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica
COSIS	Coordenadoria de Sistemas Corporativos
CPSI	Comissão Permanente de Segurança da Informação
ETIR	Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais
ENTIC – JUD	Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ nº 370/2021.
GAPSTIE	Gabinete e Apoio a Planejamento e Gestão da Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições
GOVTIC	Governança Corporativa de TIC
PDTIC	Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEJERN	Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do RN
STIE	Secretaria de Tecnologia da Informação e Eleições
TIC	Sigla que designa a área de informática. Em vez de meramente TI (Tecnologia da Informação), a sigla incorporou o ‘C’, que se refere à “Comunicação”, incluindo, sobretudo, as tecnologias ligadas à Internet.
TCU	Tribunal de Contas da União.

Quadro 1 – Abreviaturas



## Metodologia

A metodologia utilizada para a elaboração deste PDTIC seguiu, dentro do aplicável, o manual do processo de elaboração do Planejamento Diretivo de TIC, instituído pela Portaria TRE/RN n.º 178/2019 - PRES (alterada pela Portaria TRE/RN n.º 195/2020 - PRES), composta pelas seguintes fases:

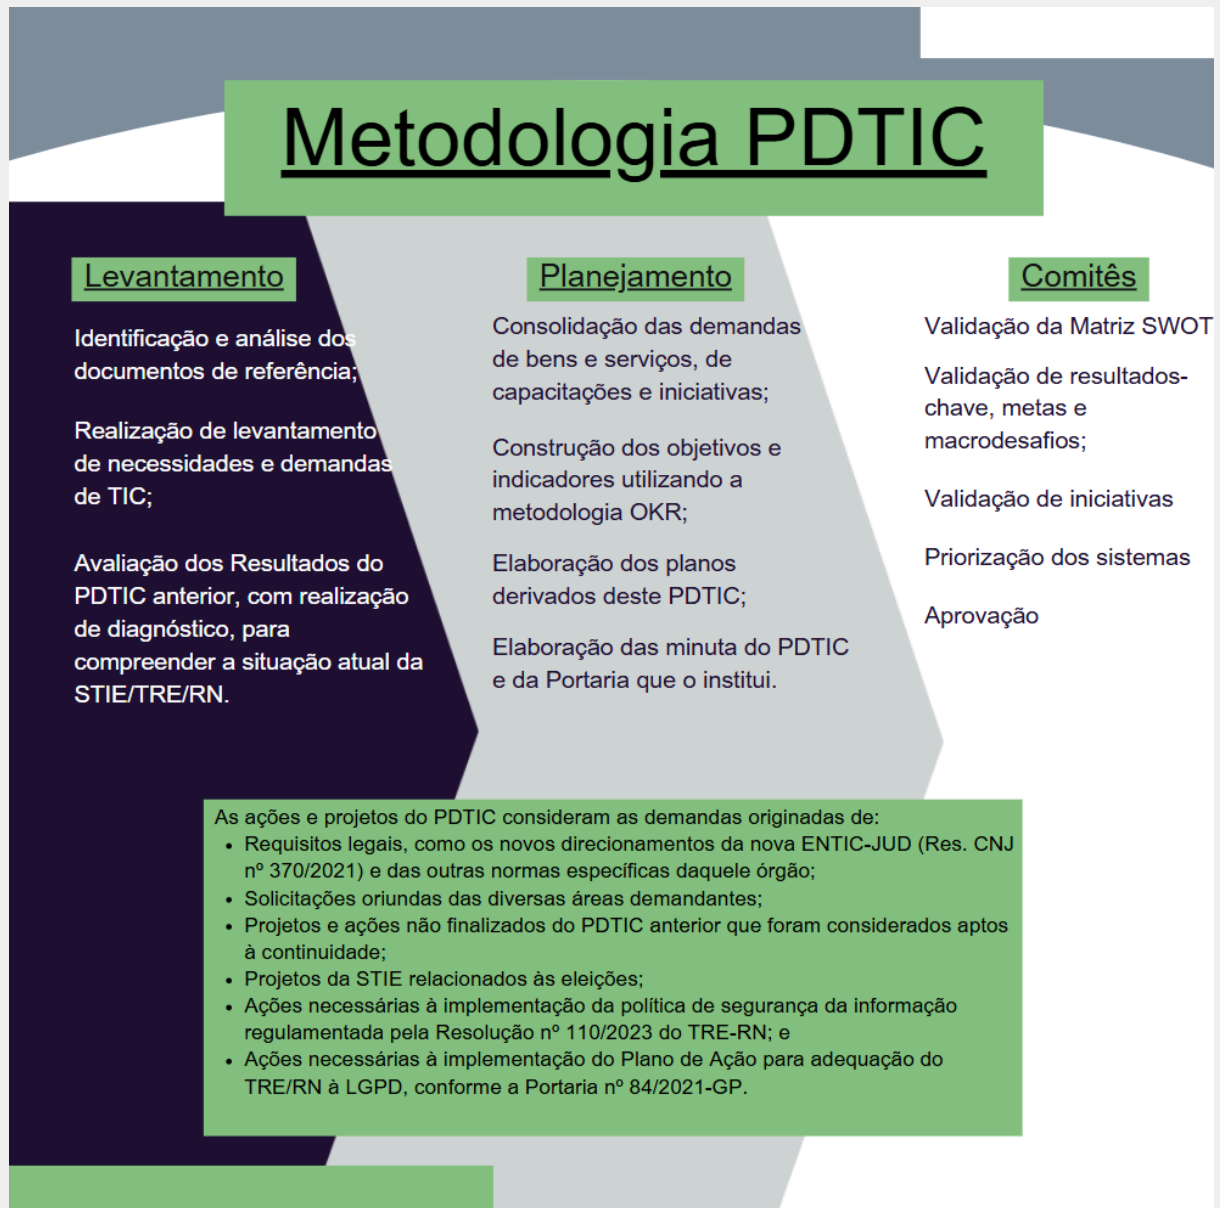



## Princípios e Diretrizes

### Princípios:

- Promoção da Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do TRE/RN;
- Alinhamento dos objetivos estratégicos às necessidades de negócio;
- Participação efetiva da Alta Administração na definição e acompanhamento das políticas de TIC;
- Aquisições e Contratações de Soluções de TIC precedidas de planejamento e alinhadas ao PDTIC;
- Promoção da transformação digital;
- Melhoria contínua da segurança em TIC, com foco na proteção de dados pessoais, conciliando com a necessidade de manter ativo o princípio público da transparência; e
- Melhoria da eficiência dos processos de TIC, acompanhada do respectivo mapeamento coerente com a metodologia de processos do TRE/RN;


### Diretrizes:

- Buscar a excelência, inovação e criatividade na gestão;
- Garantir atendimento de qualidade aos usuários;
- Garantir a disponibilidade, integridade e confidencialidade da informação;
- Estimular e promover a formação, o desenvolvimento e o treinamento dos servidores que atuam na área de TIC;
- Melhorar de forma contínua a infraestrutura de TIC e os sistemas de informação;
- Estimular a adoção de metodologia de desenvolvimento de sistemas, buscando assegurar padronização, integridade e segurança;
- Monitorar os processos e serviços críticos de TIC (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados).



## Organização da STIE

A Secretaria da Tecnologia da Informação e Eleições é estruturada de acordo com o seguinte organograma:

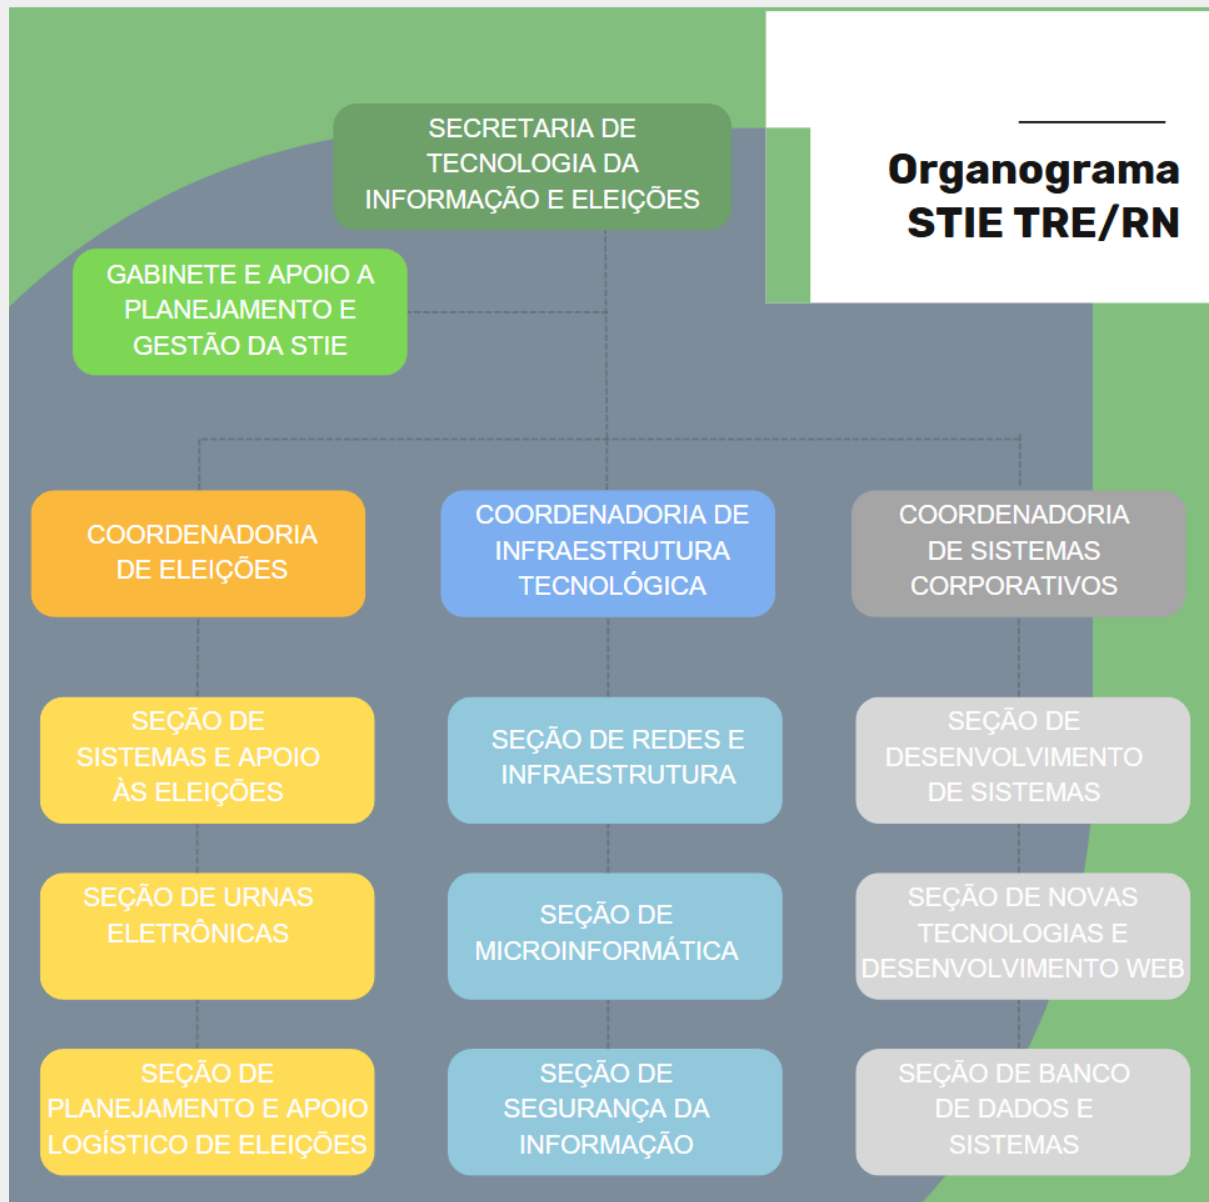






Além da organização interna da STIE, merecem destaque outras estruturas de apoio e governança de TIC:

- **Comitê de Governança de Tecnologia da Informação (CGOVTIC)** -Instituído pela Resolução TRE/RN n.º 29/2019, de 10 de dezembro de 2019;
- **Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (COGESTIC)** - Instituído pela Resolução TRE/RN n.º 29/2019, de 10 de dezembro de 2019;
- **Comissão Permanente da Segurança da Informação (CPSI)** - Instituída por meio da Resolução TRE/RN n.º 08/2009, de 26 de maio de 2009;
- **Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais – ETIR** - Instituído pela Portaria Nº 423/2017-GP;
- **Gestor de Segurança da Informação** - Designado através da Portaria DG n.º 45/2017;
- **Comitê Gestor de Eleições** - Instituído pela Resolução TRE/RN n.º 29/2019, de 10 de dezembro de 2019.

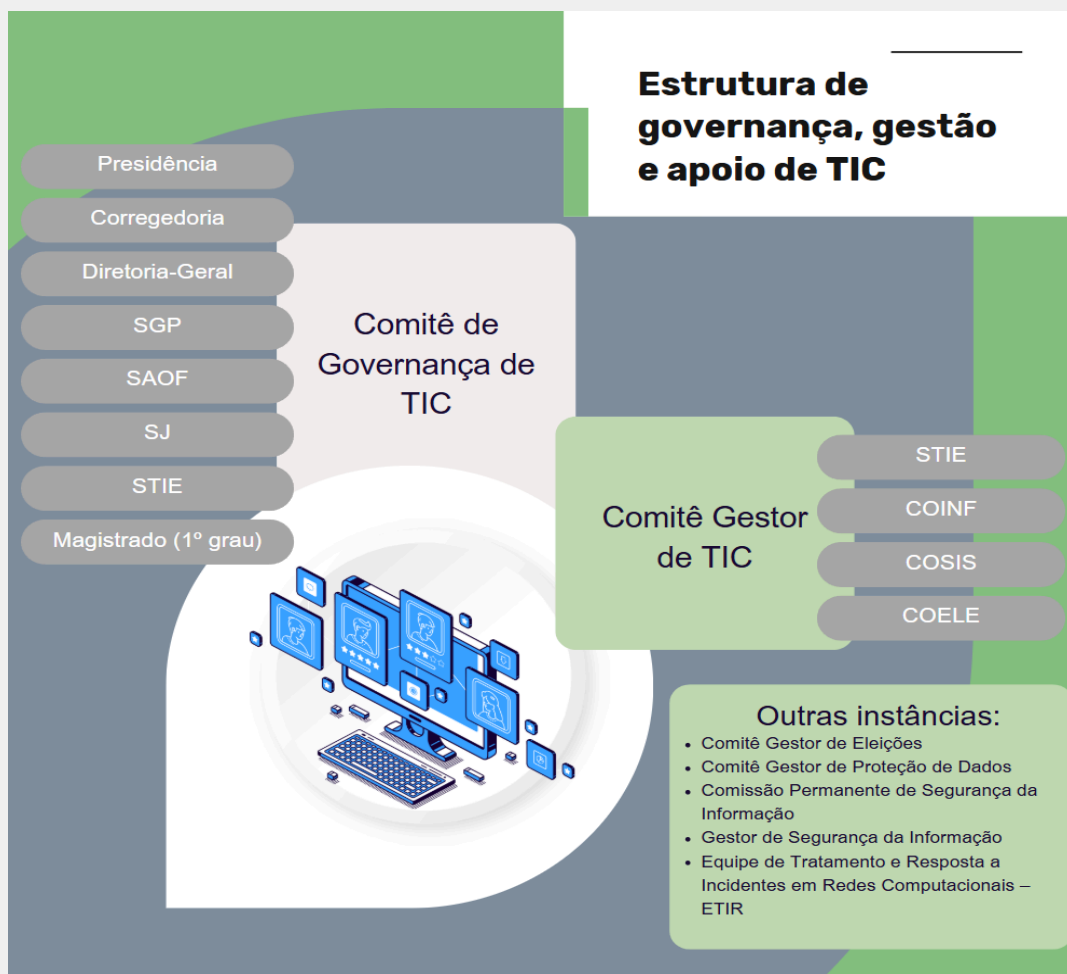




## Diagnóstico - Análise SWOT






## Análise de Governança de TIC

O iGovTIC-Jud é um levantamento anual aplicado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para avaliar e monitorar o desenvolvimento da Governança, Gestão e Infraestrutura de Tecnologia da Informação dos órgãos do Poder Judiciário. Esse levantamento classifica os órgãos em diferentes níveis de maturidade: “Baixo”, “Satisfatório”, “Aprimorado” e “Excelência”.

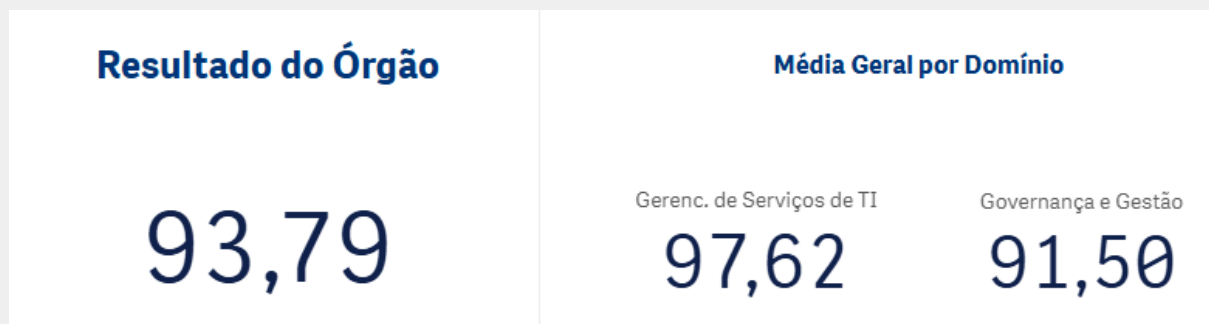

Resultado do ano de 2024

Média dos Resultados por Tema da área de TIC

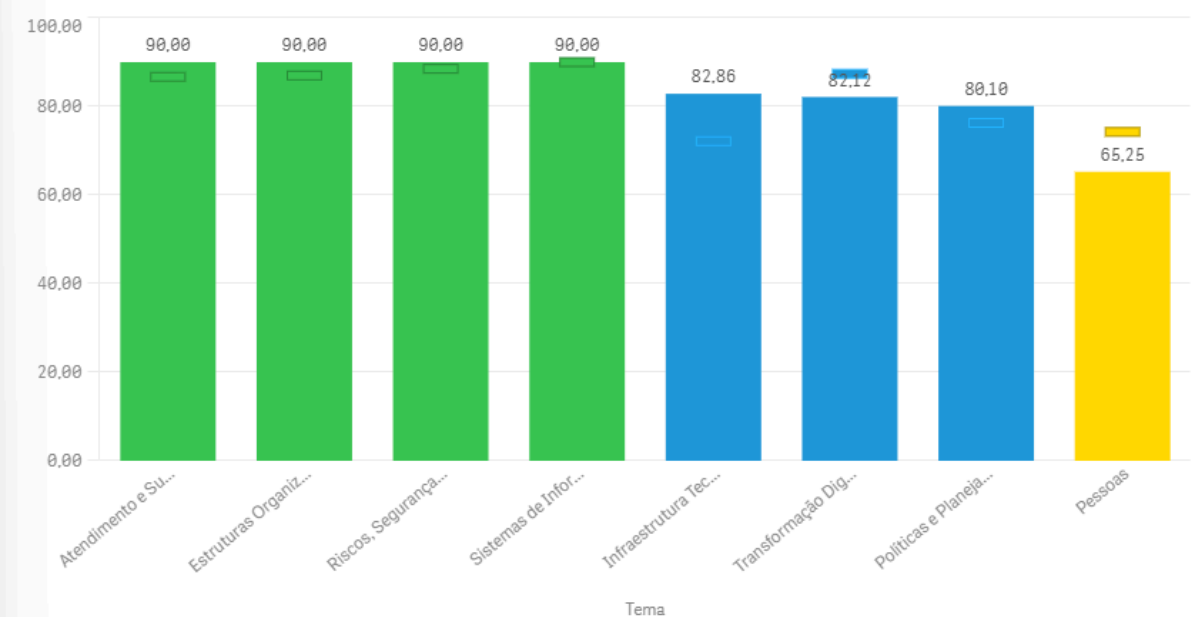

Histórico dos resultados do TRE/RN no iGovTIC - Jud

2021: 73,95 - Nível de Maturidade Aprimorado

2022: 78,56 - Nível de Maturidade Aprimorado

2023: 93,09 - Nível de Maturidade Excelência

2024: 93,79 - Nível de Maturidade Excelência

## Direcionadores Estratégicos

### Estratégias Nacionais

A Resolução CNJ nº 325/2020 dispõe sobre a Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 e possui como um dos seus objetivos estratégicos o “Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados”.

Já através da Resolução CNJ nº 370/2021, foi instituída a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio 2021-2026, em harmonia com os macrodesafios do Poder Judiciário, em especial com o que estabelece o “Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e a Proteção de Dados”. O objetivo da ENTIC-JUD é constituir o principal instrumento de promoção da governança ágil e da transformação digital do Poder Judiciário por meio de serviços e soluções digitais inovadoras que impulsionem a evolução tecnológica do Poder Judiciário.

#### MAPA ESTRATÉGICO DE TIC DO PODER JUDICIÁRIO





Perspectiva ENTIC-JUD	Objetivos Estratégicos da ENTIC-JUD	Grupos entregáveis - Plano de Trabalho da ENTIC-JUD	Prazo
Sociedade	OE1: Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	Grupo 6 - Atendimento e Satisfação do Usuário	2 anos
	OE2: Promover Transformação Digital	Grupo 8 - Iniciativas de Transformação Digital	4 anos
Aprendizado e Crescimento	OE3: Reconhecer e Desenvolver as Competências dos Colaboradores	Grupo 7 - Desenvolvimento das Competências dos Colaboradores	3 anos
	OE4: Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	Grupo 1 - Colaboração e Inovação	2 anos
Processos Internos	OE5: Aperfeiçoar a Governança e Gestão	Grupo 2 - Governança e Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	1 ano
	OE6: Aprimorar as Aquisições e Contratações	Grupo 4 - Aquisições e Contratações	2 anos
	OE7: Aprimorar a Segurança da Informação e Gestão de Dados	Grupo 3 - Segurança da Informação e Proteção de Dados	1 ano
	OE8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Grupo 5 - Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	2 anos



## Plano Estratégico JERN 2021-2026

A Resolução TRE/RN nº 49/2021 instituiu o Plano Estratégico da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte no período de 2021-2026, ao qual vincula-se este PDTIC como desdobramento da estratégia.

### *Missão*

Garantir a legitimidade e a segurança do processo eleitoral

### *Visão em 2026*

Ser reconhecida como uma justiça íntegra, inovadora, ágil e efetiva.

### *Valores Institucionais*

Acessibilidade   Ética   Inovação   Integridade  
Segurança jurídica   Sustentabilidade  
Transparência



# Mapa Estratégico 2021-2026

Garantia dos direitos de cidadania  
Qualidade do acesso e da usabilidade dos serviços  
Enfrentamento à corrupção, à improbidade e aos ilícitos eleitorais  
Fortalecimento da relação institucional com a sociedade

*Sociedade*

Fortalecimento do acesso à justiça  
Aperfeiçoamento da gestão do processo eleitoral  
Aprimoramento da governança institucional  
Promoção da integridade e da ética  
Fortalecimento de políticas e práticas de sustentabilidade

*Processos  
Internos*

Desenvolvimento das pessoas orientado às mudanças do Judiciário  
Fomento à cultura da inovação  
Incremento à transformação digital  
Fortalecimento da segurança da informação  
Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira

*Aprendizada e  
Crescimento*

Agenda 2030 da ONU - Compromisso do Poder Judiciário





## DIRECIONAMENTO DE TIC

Foram definidos os seguintes parâmetros estratégicos para a STIE do TRE/RN:

### **Missão da STIE**

Fornecer soluções tecnológicas com excelência, visando otimizar o alcance dos objetivos estratégicos institucionais.

### **Visão da STIE**

Ser reconhecida por apresentar soluções inovadoras, primando pela segurança e transparência nas demandas de TIC

### **Atributos de Valor da STIE**

Segurança da Informação

Qualidade

Celeridade

Comprometimento

Cooperação

Eficiência





## Objetivos e indicadores

A estratégia de TIC é direcionada pela ENTIC-JUD e pelo alinhamento com o PEJERN. Assim, seguindo a metodologia OKR, foram definidos objetivos, resultados esperados (KR) e iniciativas em duas camadas (Camada 1 e Camada 2).

Para a Camada 1 de objetivos e resultados-chaves, foram definidos os objetivos estratégicos da própria ENTIC-JUD, após realizado o alinhamento com o PEJERN. Os indicadores diretamente associados aos objetivos primários estão descritos na tabela Objetivos e Indicadores de Camada 1.

Os objetivos principais (Camada 1) se desdobram em objetivos de Camada 2, táticos, conforme a tabela seguinte, que possui seus resultados-chave (KRs) e complementam as informações sobre o alcance dos objetivos de maneira geral.

### 1.Perspectiva Estratégica - Objetivos e Resultados-Chave de Camada 1

ID	Tema (art. 2o da ENTIC)	OKR Camada 01	KR Tier 1
OE1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	01 KR1-1.1	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC
OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	02 KR1-4.1	Realizar publicações no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	03 KR1-6.1	Aumentar o índice de Contratações de TIC realizadas
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	04 KR1-7.1	Garantir a atualização do sistema operacional dos servidores de rede
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	05 KR1-7.2	Reduzir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.
OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	06 KR1-8.1	Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC



## 2.Perspectiva Tática - Objetivos e Resultados-Chave de Camada 2

Objetivo camada 1	ID	Tema	OKR Camada 02	KR Tier 2
OE1	OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	07 KR2- 1.1.1	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA
OE1	OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	08 KR2- 1.1.2	Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC
OE1	OT1.2	Buscar a excelência no desenvolvimento de sistemas administrativos	09 KR2- 1.2.1	Aumentar o nível de satisfação com o desenvolvimento e suporte dos sistemas
OE6	OT6.1	Aprimorar a execução orçamentária de TIC	10 KR2-6.1.1	Maximizar o percentual de orçamento de contratações de TIC liquidado no exercício
OE6	OT6.2	Aperfeiçoar a fase de planejamento das contratações e aquisições	11 KR2-6.2.1	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR)
OE8	OT8.4	Adotar componentes de software seguros para o desenvolvimento de sistemas	12 KR2-8.4.1	Maximizar a atualização de bibliotecas e dependências de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas.



## Planos de ação do PDTIC

O Plano Diretor de TIC é composto por planos derivados que contemplam iniciativas, projetos e ações coordenadas visando ao alcance das metas e dos objetivos estabelecidos, além de demandas de contratações, aquisições e capacitações na área de TIC.

As origens para a elaboração dos Planos são as bases legais, o direcionamento estratégico, a busca pela inovação e continuidade da evolução da maturidade em gestão e governança de TIC.

O PDTIC é composto pelos seguintes planos:

- Plano de Demandas Internas (PDI)
- Plano Anual de Capacitação de TIC (PAC)
- Plano de Contratações de Soluções de TIC

Cada um desses planos tem controle de versionamento próprio e independente, e sempre que aprovados serão encaminhados para publicação no repositório nacional do Connect-Jus e na área respectiva das páginas da Intranet e Internet do nosso Tribunal.


Eventuais mudanças nos planos anexos deverão ser validadas em reuniões do COGESTIC (que têm periodicidade quinzenal), desde que validadas nos encontros do CGOVTIC (que têm periodicidade trimestral). Diante da alta dependência dos recursos de TIC, e, ainda, em decorrência das constantes inovações tecnológicas e das frequentes alterações nos normativos que regem a área de TIC, poderão surgir novas demandas (internas ou externas), as quais deverão ser objeto de negociação no CGOVTIC, objetivando a redefinição de prioridades e os respectivos ajustes nos planos anexos.

A ENTIC JUD prevê ainda, em seus ditames, que a área de TIC dos órgãos do Poder Judiciário elaborem outros planos derivados da estratégia, com especificação de controles, solicitações e demandas. Em alguns casos, as ações descritas nestes planos serão executadas apenas em determinadas condições (na ocorrência de um risco ou de um desastre, por exemplo) e não de maneira necessária para tornar a estratégia eficaz. Assim, o Plano de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços e o Plano de Gestão de Riscos de TIC, respectivamente previstos nos art. 36 e 37 da Res. CNJ nº 370/2021 serão objetos a serem tratados em normas disciplinares específicas. Ambos guardam relação com o objetivo 7 de aprimorar a segurança da informação e a gestão de dados.

Do mesmo modo, o Plano de Trabalho da Entic-Jud (PTE), que trata-se de plano de ação destinado ao cumprimento das diretrizes estabelecidas na ENTIC JUD, passará a ser objeto de análise de conformidade de forma segmentada deste plano, visto que as ações foram projetadas para conclusão até o ano de 2023.

## Plano de Demandas Internas (PDI)

O PDI – Plano de Demandas Internas consolida projetos e ações destinados à manutenção da infraestrutura de TIC existente e às novas iniciativas que suportarão os processos de negócio fundamentais do Tribunal.

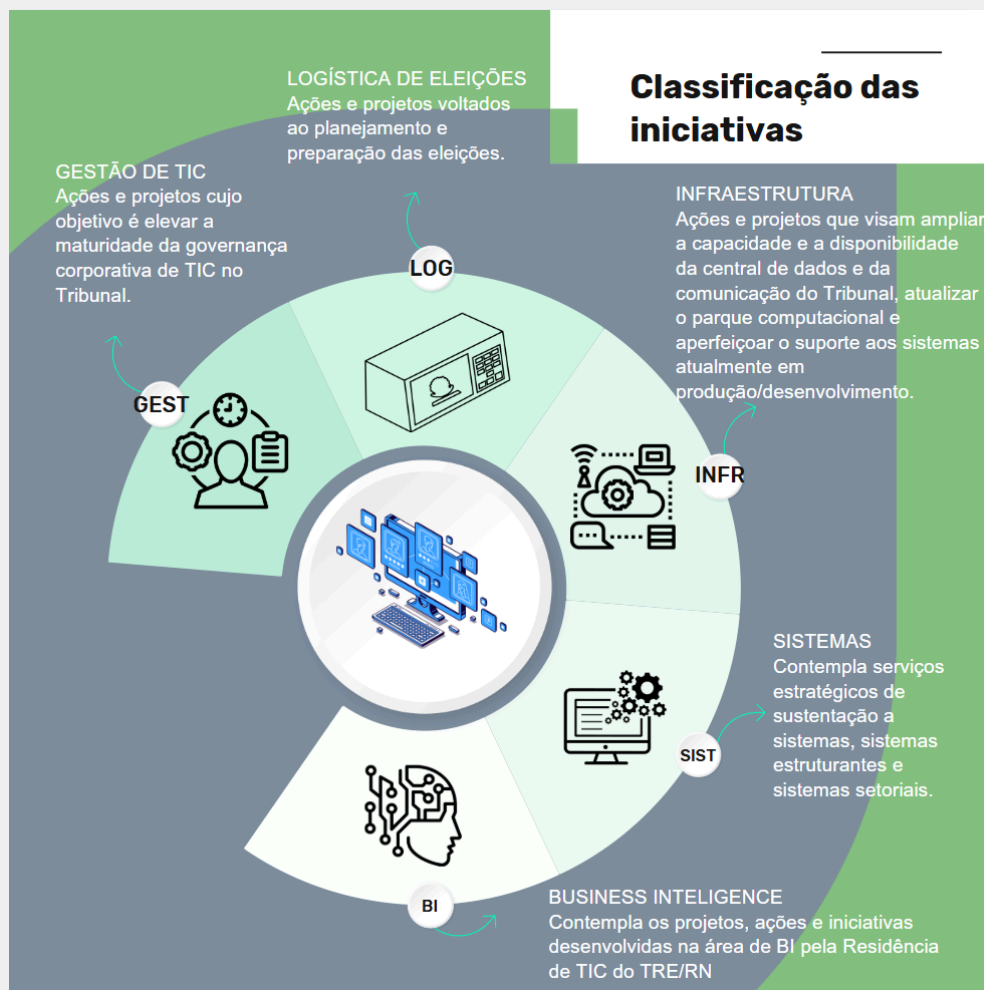

A numeração inicial dada a cada iniciativa deverá permanecer durante todo o ciclo de vida do PDTIC vigente, independentemente de inserções, alterações ou exclusões de ação ou projeto, de maneira a facilitar o controle e o monitoramento do desempenho de todo o plano. A codificação é composta pelo ano de início da ação, a numeração sequencial por unidade responsável, a unidade responsável e área de classificação (ex: 2021-001-GAPSTIE-GEST).

O PDI encontra-se no Anexo 1 deste documento.



## Plano Anual de Capacitações de TIC

A Resolução CNJ n.º 370/2021 – Entic Jud, em seu art. 27, estabelece que deverá ser elaborado, implantado e divulgado Plano Anual de Capacitações de TIC para desenvolver as competências gerenciais e técnicas necessárias à operacionalização da governança, da gestão e do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação.

Assim, de forma complementar ao Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento (PACD) institucional e para atender ao normativo legal supramencionado, anualmente é desenvolvido o Plano de Capacitação da STIE, que visa minimizar as dificuldades vivenciadas diariamente, tomando-se por base a relação demandas do Tribunal x capacidade da área de TIC, devendo complementar o PACD institucional. Segundo a própria ENTIC-JUD, a área de TIC será responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento das lacunas de competências identificadas nos servidores de TIC, alinhando com a gestão institucional por competências.

Por fim, cabe ressaltar que este documento não representa um plano estático e, portanto, outros treinamentos não previstos poderão ser contratados, atendendo a demandas internas e externas.

No Anexo 2 deste Plano, encontra-se o Plano de Capacitação de TIC 2025.

## Plano de Contratações de Soluções de TIC 2025

A Resolução CNJ Nº 468/2022, que dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ, em seu art. 4º, define que as contratações de bens e serviços de TIC serão precedidas de Plano de Contratações de TIC, alinhado com o PDTIC, com o Planejamento Estratégico Institucional e com a ENTIC-JUD.

Para o ano de 2025, o Plano de Contratações de Soluções de TIC do TRE/RN foi confeccionado tomando-se por base a extrema dependência dos recursos de TIC para que as atividades administrativas, eleitorais e judiciais sejam realizadas na forma adequada.

Faz-se necessário destacar que, embora a STIE continue a fazer a gestão do seu orçamento, o seu Plano de Contratações de Soluções de TIC é parte integrante do Plano Anual de Contratações 2025 - Demandas Administrativas e Contratações de Soluções de TIC, aprovado nas reuniões do CGOVTIC e CGOVCONT.

O Plano de Contratações de Soluções de TIC 2025, encontra-se no Anexo 3 deste PDTIC.



## Riscos relacionados ao PDTIC

Gestor de Risco Setorial: Marcos Flávio Nascimento Maia				Área Funcional: STIE		
Risco (Descrição)	Classe(s)	Causa(s)	Consequências	Resposta(s)	Nível de Riscos (IxP)	Tipos de Resposta(s)
Não atingimento de metas de execução do PDTIC	Risco Organizacional	1. Falta de empenho 2. Excesso de demandas 3. Falta de patrocínio da Administração	Resultados desalinhados do planejamento	Acompanhamento mensal nas reuniões do COGESTIC	(6x2) = 12 Médio	Mitigar o risco
Novas demandas externas ao COGESTIC não relacionadas na elaboração do PDTIC	Risco Organizacional	Membros do CGESTIC envolvidos em várias frentes de trabalho simultâneas, relacionadas à própria rotina de trabalho e a demandas institucionais.	1. Ação ou projeto não contemplado 2. Necessidade de revisão e nova priorização das demandas	1. Elaborar cronograma de reuniões do CGESTIC para verificação 2. Validação do Plano junto das demais unidades do TRE, através do CGOVTIC	(6x2) = 12 Médio	Mitigar o risco
Competição pelos recursos humanos em projetos/planos diferentes	Risco Organizacional	1. Falta de integração entre os planos 2. Falha na priorização das demandas 3. Falta de recursos humanos	1. Área de desenvolvimento da STIE não entrega produtos suficientes para os clientes internos 2. Demandas não realizadas ou entregues fora do prazo	Balancear devidamente o portfólio de projetos de acordo com a capacidade dos setores envolvidos.	(6x4) = 24 Médio	Mitigar o risco
Falta de recursos/capacidade para execução de todos os projetos selecionados	Risco Organizacional	1. Falha no dimensionamento da capacidade de atendimento da STI 2. Afastamento de servidores por motivos diversos 3. Surgimento de novas demandas urgentes	STIE incapaz de atender às demandas da organização e dos clientes internos, quebrando acordos prévios.	Revisão e monitoramento contínuo do desempenho e validação das estimativas de capacidade, propondo alterações tempestivas no planejamento acordado.	(6x4) = 24 Médio	Mitigar o risco



## Fatores críticos de sucesso

O PDTIC, por si só, não é capaz de assegurar efetividade de suas ações e projetos, sendo necessárias outras condições que garantam a sua execução, entre elas:

- Apoio e envolvimento da Alta Administração e das unidades de apoio na execução do PDTIC;
- Participação ativa dos Comitês Gestor e de Governança de TIC no acompanhamento das ações e investimentos desta área;
- Atuação efetiva dos responsáveis pelos níveis tático e operacional, controlando e monitorando o desempenho das ações e projetos de TIC;
- Disponibilidade orçamentária suficiente para a área de TIC executar suas iniciativas estratégicas;
- Disponibilidade de pessoal em quantitativo e perfil adequados para o cumprimento da missão da área de TIC;
- Revisão periódica dos anexos do PDTIC, harmonizando-os às eventuais novas demandas das diversas unidades;
- Comunicação efetiva em todos os níveis e direções, a fim de garantir publicidade da execução do PDTIC;
- Planejamentos e licitações céleres das contratações de soluções de TIC, incluindo as ações de capacitação.



## Desafios

Como desafios para 2025, tem-se:

- a busca contínua por inovação tecnológica;
- a melhoria continuada de processos e de gestão de riscos de TIC;
- a garantia de adoção de padrões de interoperabilidade com os demais poderes e esferas de governo e com a sociedade;
- a garantia do respeito a padrões de acessibilidade e inclusão digital;
- a adoção de medidas para melhoria da segurança cibernética, incluindo melhoria da infraestrutura de segurança, disseminação de boas práticas de segurança para os servidores da casa, adoção de políticas de acesso e controle de usuários, análises antecipadas de vulnerabilidades, melhoria no enfrentamento de ameaças e capacitação dos servidores de TI responsáveis pela segurança de dados;
- a garantia da proteção de dados pessoais - LGPD;
- a necessidade de conciliar as demandas de TI com o reduzido quadro de pessoal, bem como capacitar os servidores para as novas demandas e tecnologias que vem surgindo;
- a adoção de novas soluções de nuvem corporativa;
- a adoção de Inteligência Artificial e de outras tecnologias emergentes, objetivando aumentar a eficiência e entregar melhores resultados para a Instituição e para a sociedade.





## ANEXOS

Anexo 1 - Plano Demandas Internas da STIE - Ano 2025 (versão 2.0)

Anexo 2 - Plano de Capacitação da STIE – Ano 2025 (versão 1.1)

Anexo 3 - Plano de Contratações de TIC - Ano 2025 (versão 2.0)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025

VERSÃO 2.0

ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
2025	1	2025-001-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2026	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2026, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2025/08	2025/11	Não iniciada
2025	2	2024-000-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2025	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2025, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2024/08	2025/02	Concluída
2025	1	2024-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/10	2025/06	Em andamento
2025	2	2025-001-COINF-INFR	Ampliação rede WiFi ( instalação e configuração)	Instalação de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	3	2025-002-COINF-INFR	Ampliação e modernização do parque de Switches dos cartórios do interior ( instalação e configuração)	Instalação e substituição de switches PoE nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia, implementando monitoramento em tempo real do tráfego de rede	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/03	2025/06	Não iniciada
2025	4	2025-003-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE ( instalação e configuração)	Instação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	5	2025-004-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2025/06	Não iniciada
2025	6	2025-005-COINF-INFR	Ampliação da estrutura de monitoramento das soluções de Segurança Cibernética, com integração de dashboards e acompanhamento em tempo real	Integração dos alertas gerados pelas soluções implantadas de Segurança Cibernética (dashboards)	SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2025/05	Não iniciada
2025	7	2024-008-COINF-INFR	Ilhas de impressão	Implantação do projeto de ilhas de impressão, que consiste em diminuir as impressoras por unidade, concentrando-as em determinados locais de impressão, tendo em vista a diminuição da demanda, como decorrência da consolidação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2025/04	Em andamento
2025	8	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasse do Gitlab	Repasse do Gitlab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2024/05	2025/03	Em andamento
2025	9	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	AC4.1	2023/05	2025/03	Em andamento
2025	10	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2024/02	2025/03	Em andamento
2025	11	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Fale Conosco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/10	2025/02	Concluída
2025	12	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, juntados e tramitando) para o SEI, através da API WSSei.	COSIS/STIE	SDS SBDS	AC4.1	2024/08	2025/02	Em andamento
2025	13	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações containerizadas implantadas no ambiente do homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2025/03	Em andamento
2025	14	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2025/03	Em andamento
2025	15	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar prodecimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2024/05	2025/05	Não iniciada

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025

VERSÃO 2.0

ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
2025	16	2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2024/04	2025/12	Não iniciada
2025	17	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	18	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2025/09	Não iniciada
2025	19	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/10	2026/03	Não iniciada
2025	20	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	21	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03	Não iniciada
2025	22	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12	Não iniciada
2025	23	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/05	Não iniciada
2025	24	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	25	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	ASCOM	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	26	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/04	2025/09	Não iniciada
2025	27	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/04	2026/09	Não iniciada
2025	28	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03	Em andamento
2025	29	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03	Em andamento
2025	30	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03	Não iniciada
2025	31	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	Pausada
2025	32	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	CONTÍNUO
2025	33	2024-009-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Graus.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01	Em andamento
2025	34	2024-008-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01	Em andamento
2024	35	2024-007-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Dados de Pessoal para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2025/01	Em andamento
2024	36	2024-025-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COPAT/SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12	Em andamento
2024	37	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2025/01	2025/03	Não iniciada
2025	38	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03	Em andamento
2025	39	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03	Em andamento
2025	40	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho "Eleições Suplementares "	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	8/2023	03/2025	Em andamento

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE										
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025										
VERSÃO 2.0										

ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
2025	41	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPLE	PI4	01/2024	02/2025	Em andamento
2025	42	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	03/2024	02/2025	Em andamento
2025	43	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	10/2025	12/2025	Não iniciada
2025	44	2025-002-COELE-LOG	Workshop do sistema ELO	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca do aprimoramento do suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada
2025	45	2025-003-COELE-LOG	Workshop do sistema SAE	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários e no suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	09/2025	Não iniciada
2025	46	2025-004-COELE-LOG	Workshop do sistema Mesários	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SPLE	PI4	06/2025	07/2025	Não iniciada
2025	47	2025-005-COELE-LOG	workshop do sistema GEL	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	06/2025	07/2025	Não iniciada
2025	48	2025-006-COELE-LOG	Workshop dos sistemas de Candidatura	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	09/2025	10/2025	Não iniciada
2025	49	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos períodos e eventos.	COELE	COELE	PI4	01/2025	02/2025	Não iniciada
2025	50	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	03/2025	05/2025	Não iniciada
2025	51	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	06/2025	08/2025	Não iniciada
2025	52	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	09/2025	10/2025	Não iniciada
2025	53	2025-011-COELE-LOG	Treinamento do sistema GEL	Elaborar o treinamento do sistema GEL para repasse às zonas eleitorais de todo o Estado, de forma remota, objetivando a sua adequada utilização para o alcance da integralidade dos locais de votação do RN georreferenciados.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	08/2025	Não iniciada
2025	54	2025-012-COELE-LOG	PIELEI 2026	Elaboração do Planejamento das Eleições 2026, com todas as diretrizes da próxima eleição geral.	COELE	COELE	PI4	03/2025	10/2025	Não iniciada
2025	55	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretaria do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPLE	PI4	03/2025	05/2025	Não iniciada
2025	56	2025-014-COELE-LOG	Proposta Orçamentária de Pleitos	Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos para as Eleições 2026	COELE	SPLE	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025

VERSÃO 2.0

ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
2025	57	2025-015-COELE-LOG	Portal das Eleições 2026	Elaboração do Projeto de atualização do Portal das Eleições 2026 pelas unidades envolvidas, detalhando os períodos e os responsáveis pela alimentação.	COELE	SPLE	PI4	10/2025	11/2025	Não iniciada
2025	58	2025-016-COELE-LOG	Plano de Contratação de Pleitos	Elaboração do Plano de Contratações de Pleitos de 2026 e envio à SAOF.	COELE	SPLE	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada
2025	59	2025-017-COELE-LOG	Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo os participantes e os procedimentos a serem adotandos.	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir	Não iniciada
2025	60	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de ação de cada eleição suplementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos, toda a logística a ser adotada, os custos e os responsáveis por cada atividade. <a href="https://docs.google.com/presentation/d/1n7bfyZoHXY_3StDJ3trKs5hmtAwew4jvLMllqYtEQ9Q/edit#slide=id.p">https://docs.google.com/presentation/d/1n7bfyZoHXY_3StDJ3trKs5hmtAwew4jvLMllqYtEQ9Q/edit#slide=id.p</a>	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir	Não iniciada
2025	61	2025-019-COELE-LOG	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	02/2025	03/2025	Não iniciada
2025	62	2025-020-COELE-LOG	Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada
2025	63	2025-021-COELE-LOG	Suporte às Eleições Comunitárias	Modelar o processo de trabalho "Suporte às Eleições Comunitárias"	COELE	SUE	PI4	10/2025	11/2025	Não iniciada
2025	64	2025--022-COELE-LOG	Simulados	Modelar o processo de trabalho "Simulados"	COELE	SSAE	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada
2025	65	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada
2025	66	2025-024-COELE-LOG	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	2/2025	03/2025	Em andamento



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PLANO DE CAPACITAÇÃO DA STIE - ANO 2025**

**VERSÃO 1.1**

ITEM	PRIORIDADE	CURSO	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	CARGA HORÁRIA	MODALIDADE/LOCAL EAD/Presencial	MODO DE CONTRATAÇÃO Contratação PJ/Instrutoria interna	DESPESAS COM INSCRIÇÃO /INSTRUTOR (por pessoa)	DESPESAS COM DIÁRIAS (por pessoa)	DESPESAS COM PASSAGENS (por pessoa)	CUSTO TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL DA DESPESA
1	7	Extreme Fabric: Installation & Configuration (EAD 04-06/11/2024 e 28-30/01/2025)	SRI	1	24	EAD	Contratação	R\$ 12.827,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.827,62	R\$ 12.827,62
2	1	Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis	SDS/SBDS/SNT/SRI	14	40	EaD	Contratação	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.099,00	R\$ 15.386,00
3	3	Gestão de Serviços com GLPI	SMI	5	24	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 9.500,00
4	6	Gestão de Segurança da Informação	COINF/SSI	2	40h	EaD	Contratação	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00	R\$ 3.840,00
5	5	Cibersegurança	SSI	4	40h	EaD	Contratação	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 9.200,00
6	4	Red Hat Linux Automation with Ansible (RH294)	SRI	1	32h	Presencial	Contratação	R\$ 6.400,00	R\$ 4.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
7	2	Ivanti	SMI/SSI	8	20h	In Company	Contratação	R\$ 2.863,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.863,80	R\$ 22.910,38
8	10	GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS <a href="https://www.sympla.com.br/evento/govtech-summit-2025/2489268?referrer=govtechsummit.com.br">https://www.sympla.com.br/evento/govtech-summit-2025/2489268?referrer=govtechsummit.com.br</a>	STIE	2	16h	Presencial	Inscrição	R\$ 308,00	R\$ 2.964,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.272,00	R\$ 14.544,00
9	11	Semana Conip 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasília/DF <a href="https://conipdigital.com.br/">https://conipdigital.com.br/</a>	STIE	3	16h	Presencial	Inscrição - Servidor Público é gratuito	R\$ 0,00	R\$ 2.964,00	R\$ 3.500,00	R\$ 6.464,00	R\$ 19.392,00
10	8	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22	GAPSTIE/SRI/SSI/SNT	8	25h	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 19.920,00
11	9	Plataforma multicursos para servidores do GAPSTIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	GAPSTIE, SUE, SSAE, SPLE e COELE	10	20h	EaD	Contratação	R\$ 1.308,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308,00	R\$ 13.080,00
<b>Total</b>												<b>R\$ 155.000,00</b>

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																						
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025																						
VERSÃO 2.0																						
ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 2.0
					DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO															Atualizado em 12/2/2025
1A	STI.POO_25.01A (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	295.683,00	295.683,00	295.683,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	INTERJATO - Contrato nº 7/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) PAE Gestão: 1289/2023 Estimativa 2025 - contrato vigente: 01.01 a 13.08: 37.900,80 x 1,05 x 7,43 = R\$ 295.683,00
1B	STI.POO_25.01B	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN: - Interior - 67 circuitos (sendo 3 de 50, 44 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NA	NA	NA	NA	NA	R	13.08.2025	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	181.867,00	181.867,00	181.867,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: SEI Planejamento: 7638/2024 Estimativa 2025 - novo contrato: 14.08 a 31.12: 37.900,80 x 1,05 x 4,57 = R\$ 181.867,00
2A	STI.POO_25.02A (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	26.541,00	26.541,00	26.541,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SITECNET - Contrato nº 8/2023 (vigência: 13.02.2023 a 13.08.2025) PAE Gestão: 1290/2023 Estimativa 2025 - contrato vigente: 01.01 a 13.08: R\$ R\$ 3.402,00 x 1,05 x 7,43 = 26.541,00
2B	STI.POO_25.02B	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN: - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	NA	NA	NA	NA	NA	R	13.08.2025	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0013	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	16.324,00	16.324,00	16.324,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: SEI Planejamento: 7638/2024 Estimativa 2025: 14.08 a 31.12: R\$ R\$ 3.402,00 x 1,05 x 4,57 = 16.324,00
3A	STI.POO_25.03A (Despesa Continuada)	Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	8.158,00	24.476,00	24.476,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	DB3 (antiga Fortel) - Contrato nº 55/2020 (vigência: 01.10.2020 a 01.04.2023, Renovação do contrato por mais 30 meses - 01.04.2023 a 01.10.2025 (termo aditivo 01) ) PAE 6127/2020 Estimativa 2025: 01.01 a 01.10: R\$ 2.590,00 x 1,05 x 9 = R\$ 24.476,00
3B	STI.POO_25.03B	Estudo para continuidade do Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	NA	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	N	01.10.2025	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	24.476,00	8.158,00	8.158,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade: Estimativa 2025: 02.10 a 31.12: R\$ 2.590,00 x 1,05 x 3 = R\$ 8.158,00
4	STI.POO_25.04 (Despesa continuada)	Serviço de acesso à internet - Redundância (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JE/RN	COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	NA	NA	NA	NA	NA	N	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	33.90.40.13.0117	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	62.062,00	62.062,00	62.062,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Nova licitação para substituir o contrato nº 62/2019 Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Novo período da contratação: 07.12.2024 a 06.06.2027 SEI Planejamento: 810/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 7717/2024 Memória de cálculo: 01.01 a 30.09: R\$ 4.865,00 x 1,05 x 9 meses = R\$ 45.971,00 01.10 a 31.12: R\$ 5.108,25 x 1,05 x 3 meses = R\$ 16.091,00 Total: R\$ 62.062,00
5A	STI.POO_25.05A (Despesa continuada)	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública	COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC ARMDAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	336.137,00	336.137,00	336.137,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	RJR Comercio e Serviços de Informatica Ltda - Contrato n.º 47/2020 (vigência 16.09.2020 a 16.03.2023) - Renovação do contrato por mais 30 meses (PAE 2856/2020) - Termo Aditivo 3 - 16.03.2023 a 16.09.2025 01.01 a 16.09: [R\$ 41,70 x 1,05 x 900 contas x 8,53 meses] = R\$ 336.137,00
5B	STI.POO_25.05B	Estudo para contratação de ambiente de serviços em nuvem (e-mail, drive de armazenamento, editor de texto, planilhas e apresentação de slides, videoconferência e inteligência artificial)	COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros, com a expansão para uso dos serviços de inteligência artificial.	NA	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	15.07.2025	N	16.09.2025	Custeio TIC ARMDAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	136.740,00	222.034,00	222.034,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Estudo para continuidade a partir de 17.09.2025: licença GWS starter + Vault: 17.09 a 31.12: [R\$ 41,70 x 1,05 x 850 contas x 3,47 meses] = R\$ 129.144,00 licença GWS standard 17.09 a 31.12: [R\$ 71,39 x 50 contas x 3,47 meses] = R\$ 12.386,00 licença gemini para GWS: 17.09 a 31.12: [R\$ 116,00 x 200 contas x 3,47 meses] = R\$ 80.504,00 total da solução: R\$222.034,00
6A	STI.POO_25.06A	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	NA	NA	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	N	29.08.2025	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.52.52.35	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	59.090,00	538.558,05	521.205,95	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	SEI Planejamento 9401/2024 a ser detalhado oportunamente
6B	STI.POO_25.06B	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2024)	COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	30.09.2025	19.12.2025	28.02.2026	01.04.2026	31.07.2026	N	29.08.2026	Investimento INV EQUITIC	I	N	44.90.52.52.35	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	
7	STI.POO_25.07 (Despesa Continuada)	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JE/RN	SMI/COINF/STIE	Garantir a continuidade na prestação do suporte técnico para as Zonas da Capital, Zonas do Interior e Secretaria.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.11.0011	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	657.159,00	657.159,00	666.627,34	AC.3	Seção de Microinformática/COINF/STIE	GETI - Contrato nº 18/2022 - TRE/RN - (vigência: 22.08.2022 a 21.02.2025, prorrogado até 22.10.2027 - 30 meses) ) SEI Gestão: 7281/2022
8A	STI.POO_25.08A (Despesa continuada)	Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	EJE / ASCOM	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de vídeos destinados a cursos a distância e elaboração de artes para a ASCOM e NBE	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.37.01.0154	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	232.600,00	232.600,00	232.600,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	GETI - Contrato n.º 22/2023 - (16.10.2023 a 16.04.2026 - 30 meses) PAE Planejamento 11679/2022 PAE Seleção Fornecedor: 2700/2023 PAE Gestão: 9108/2023 Vigência: 16/10/2023 a 16/04/2026 (30 meses) 5 profissionais x R\$ 3.813,12 x 8 meses = R\$ 152.524,80 5 profissionais x R\$ 3.813,12 x 1,05 x 4 meses = R\$ 80.075,52 TOTAL = R\$ 232.600,00
8B	STI.POO_25.08B	Estudo para continuidade do Serviço de desenvolvimento web / design gráfico para atender demandas da ASCOM e EJE (NEAD e NBE)	EJE / ASCOM	Criar infraestrutura tecnológica mínima para edição e manutenção de vídeos destinados a cursos a distância e elaboração de artes para a ASCOM e NBE	30.06.2025	30.09.2025	31.10.2025	30.11.2025	28.02.2026	N	16.04.2026	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.37.01.0154	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Estudo para continuidade

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																						
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025																						
VERSÃO 2.0																						
ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 2.0
					DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO															Atualizado em 12/2/2025
9A	STI.POO_25.09A	Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	Agrupar todos os canais de atendimento do TRE, realizando gestão de filas de atendimento aos eleitores, podendo se utilizar de redes sociais, aplicativos de mensagens diversos e Whatsapp Business	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC ARMADAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	49.800,00	83.750,00	83.750,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Omnicentral Tecnologia Ltda (Contrato n.º 45/2024, de 05/09/2024 a 02/09/2025) ARP 37/2024 - TRE/CE - SEI 7677/2024  ARP 37/2024 - TRE/CE - SEI 7677/2024 (Contrato n.º 45/2024, de 05/09/2024 a 02/09/2025)  ITEM - DESCRIÇÃO - QTDE (ANUAL) - VALOR - TOTAL 1 - SUBSCRIÇÃO WHATSAPP API OFICIAL (BSP) MENSAL : 8 x R\$ 500,00 = 4.000,00 2 - SOLUÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANO COM MENSAGENS ILIMITADAS : 720 x R\$ 50,00 = 36.000,00 3 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO POR CHATBOT COM INTERAÇÕES ILIMITADAS : 8 x R\$ 2.200,00 = 17.600,00 4 - MENSAGEM PASSIVA DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP : 60.000 x R\$ 0,21 = 12.600,00 5 - MENSAGEM ATIVA DE NOTIFICAÇÃO VIA WHATSAPP (TEMPLATE HSM) : 60.000 x R\$ 0,10 = 6.000,00 6 - PACOTE ADICIONAL DE VIDEOCHAMADA SIMULTÂNEAS: 2 x R\$100,00 = 200,00 7 - SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO : 150 x R\$ 49,00 = 7.350,00 tota para o período: R\$ 83.750,00
9B	STI.POO_25.09B	Estudo para continuidade do Serviço Omni Channel em nuvem	COSIS/STIE	Agrupar todos os canais de atendimento do TRE, realizando gestão de filas de atendimento aos eleitores, podendo se utilizar de redes sociais, aplicativos de mensagens diversos e Whatsapp Business	NA	NA	NA	NA	NA	R	31.08.2025	Custeio TIC ARMADAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	37.750,00	37.750,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Omnicentral Tecnologia Ltda (Contrato n.º 45/2024, de 05/09/2024 a 02/09/2025) ARP 37/2024 - TRE/CE - SEI 7677/2024 (Contrato n.º 45/2024, de 05/09/2024 a 02/09/2025)  ITEM - DESCRIÇÃO - QTDE (ANUAL) - VALOR - TOTAL 1 - SUBSCRIÇÃO WHATSAPP API OFICIAL (BSP) MENSAL : 4 x R\$ 500,00 = 2.000,00 2 - SOLUÇÃO DE ATENDIMENTO HUMANO COM MENSAGENS ILIMITADAS : 360 x R\$ 50,00 = 18.000,00 3 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO POR CHATBOT COM INTERAÇÕES ILIMITADAS : 4 x R\$ 2.200,00 = 8.800,00 4 - MENSAGEM PASSIVA DE ATENDIMENTO VIA WHATSAPP : 30.000 x R\$ 0,21 = 6.300,00 6 - PACOTE ADICIONAL DE VIDEOCHAMADA SIMULTÂNEAS: 2 x R\$100,00 = 200,00 7 - SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO : 50 x R\$ 49,00 = 2.450,00 tota para o período: R\$ 37.750,00
10	STI.POO_25.10 (Despesa Continuada)	Segurança Cibernética - Antivírus para servidores de rede	COINF/STIE	Contratação de 190 (cento e noventa) unidades de subscrições de Solução de Segurança para Servidores (Linux e Windows), com XDR e Sandbox, incluindo manutenção, garantia (update e upgrade) por 60(sessenta) meses, com pagamento de subscrições a cada 12 (doze) meses, conforme item 03, da Ata de Registro de Preços ne O1/2022-TSE, decorrente do Edital de Licitação TSE nº 84/2021.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC LOCOSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	9.560,00	9.560,00	9.560,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	PAE Gestão: 4107/2022 (2022PE000448 - R\$ 5.098,33) - Contrato nº 13/2022 (19.05.2022 a 19.05.2027) 190 servidores de rede x R\$ 230,00 / 7 meses (20.05 a 31.12) = R\$ R\$ 5.098,33 2025: 12 meses (R\$ 8.740,00), 2026: 01.01 a 19.05 (R\$ 3.641,67)
11A	STI.POO_25.11A	Licenças Power BI	COSIS/STIE	Possibilitar a elaboração de painéis de business intelligence(BI) interativos, com suporte à autenticação e autorização de acesso por usuários específicos, visando ampliar as soluções de BI adotadas no âmbito do Tribunal.	NA	NA	NA	NA	NA	N	31.01.2025	Custeio TIC LOCOSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	54.000,00	54.000,00	54.821,25	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	PAE Planejamento: 11884/2023 Seleção do Fornecedor: 10786/2024 Gestão do Contrato: 00978/2025  Memória: R\$ 59.805,00/12 meses= 4.983,75 * 11 meses = R\$ 54.821,25
11B	STI.POO_25.11B	Estudo para aquisição de Licenças Power BI	COSIS/STIE	Possibilitar a elaboração de painéis de business intelligence(BI) interativos, com suporte à autenticação e autorização de acesso por usuários específicos, visando ampliar as soluções de BI adotadas no âmbito do Tribunal.	31.05.2025	30.08.2025	30.09.2025	31.10.2025	19.12.2025	N	5.2.2026	Custeio TIC LOCOSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	Estudo da solução
12	STI.POO_25.12	Aquisição de extensão de garantia de hardware e licenciamento para os nós de hiperconvergência adquiridos em 2020.	COINF/STIE	Estender a garantia de hardware, suporte e atualizações do fabricante dos nós de hiperconvergência adquiridos em 2020 cuja vigência da garantia termina em outubro de 2025.	NA	30.04.2025	31.05.2025	31.07.2025	30.09.2025	N	31.10.2025	Custeio TIC LOCOSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	1.250.000,00	689.250,00	689.250,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Renovação de garantia de 5 nós de hiperconvergência R\$ 137.850,00 x 5 = R\$ 689.250,00 (valor estimado de acordo com proposta recebida da TELEQUIP)
13	STI.POO_25.13	Contratação de uma empresa especializada para manutenção de equipamentos críticos de datacenter como nobreaks e ar-condicionado da solução Smartrow e Smartcabinet.	COINF/STIE	Garantir o pleno funcionamento dos racks autônomos adquiridos pelo Tribunal em utilização no prédio Sede e COJE	NA	31.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	30.09.2025	N	31.10.2025	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.21.0180	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	120.000,00	30.000,00	30.000,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Valor estimado com base na estudo realizado pelo TRE-PB = R\$ 10.000,00/mês x 03 meses = R\$ 30.000,00 / ano
14	STI.POO_25.14	SisDEA Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais.		A avaliação de imóveis da União ou de seu interesse, em cumprimento à Instrução Normativa SPU/ME nº 67, de 20.set.2022, é procedimento obrigatório a todos os órgãos e entidades gestoras de imóveis federais, e deve estar em conformidade com as Normas Brasileiras - NBR 14.653-ABNT, e o serviço vinha sendo terceirizado pelo TRE/RN por falta de um software adequado de inferência estatística para avaliação de imóveis. O software SisDEA é reconhecido nacionalmente e sua marca está registrada no INPI sob número 826299768.	NA	30.04.02025	31.05.2025	30.06.2025	31.08.2025	N	30.9.2025	Custeio TIC LOCOSOF	C	N	33.90.40.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	3.938,00	3.938,00	3.938,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Memória: 02 licenças anuais x R\$ 1.969,00 = R\$ 3.938,00
15	STI.POO_25.15	Estudo para contratação de serviço de desenvolvimento com business intelligence, inteligência artificial e desenvolvimento de sistemas	COSIS/STIE	Contratação de serviço terceirizado para atuar em frentes de BI e IA, para manutenção e criação de novos painéis, bem como de desenvolvimento de sistemas, para manutenção dos sistemas administrativos.	07.02.2025	14.03.2025	15.04.2025	30.04.2025	30.06.2025	N	NA	Custeio TIC APOIO	C	N	33.90.40.11.0011	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	180.000,00	180.000,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	SEI Fase Planejamento 00964/2025 3 Postos de trabalhos de BIIA x R\$10.000,00 x 6 meses = R\$180.000,00
16	STI.POO_25.16	Estudo para aquisição de solução de acessibilidade digital	COSIS/STIE	A aquisição de solução de acessibilidade digital visa promover a inclusão e a acessibilidade em nossos portais na Intranet, garantindo que todos os servidores, incluindo aqueles com deficiências visuais ou outras necessidades especiais, possam acessar as informações e recursos disponíveis de maneira acessível e eficiente.	NA	NA	30.04.2025	31.05.2025	31.08.2025	N	31.10.2025	Custeio TIC LOCOSOF	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	25.000,00	25.000,00	AC.3	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	SEI fase de planejamento - 10137/2024 1 licença por 3 anos - 25.000,00
17	STI.POO_25.17	Estudo para contratação de serviços de computação em nuvem	COSIS/STIE	Atender as demandas atuais de fornecimento de serviços em nuvem	10/02/2025	14/03/2025	15/04/2025	30/04/2025	31.05.2025	N	30.06.2025	Custeio TIC ARMADAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	207.000,00	207.000,00	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	créditos de serviços em nuvem (CSN) - contratação de 3 anos. previsão para o contrato: 300.000 créditos x R\$3,62 = R\$ 1.086.000,00 200 horas de serviço técnico x R\$520,00 = 104.000,00 1 treinamento em company x R\$35.000,00 total da solução: R\$1.225.000,00 previsão para 2025 50.000 x R\$3,62 = R\$ 181.000,00 50 horas de serviço técnico x R\$520,00 = 26.000,00 total para 2025: R\$207.000,00 Treinamento a ser inserido no PACD2025: R\$35.000,000



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																						
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025																						
VERSÃO 2.0																						
ITEM	CÓDIGO (PCA 2024)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PEJERN	UNIDADE TÉCNICA	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 2.0
					DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO															Atualizado em 12/2/2025
18	STL.POO_24.17	Coletores de dados - ASIWEB	SEPAT/COLIC/S AOF	Substituição dos coletores de dados descontinuados que utilizam windows mobile, utilizados no Sistema ASIWEB	NA	NA	NA	NA	NA	N	30.04.2025	Investimento INV EQUTIC	I	N	44.90.52.35	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	24.908,55	24.908,55	AC.3	Seção de Suporte e Segurança da Informação/COINF/STIE	PAE Planejamento: 9558/2023 SRP TSE: PE nº 90024/2024 (09.07.2024) - SEI 2022.00.000001371-0 - Natureza da despesa: material permanente - 44905200  1. Leitores de dados de radiofrequência e código de barras, compatível e homologado para uso no Sistema ASIWEB, do tipo desacoplado - cota principal 5 un. x R\$ 4.022,50 = R\$ 20.112,50  2. Smartphones baseados no Android OS - cota principal .  5 un. x R\$ 1.399,00 = R\$ 6.995,00 5 un. x R\$ 959,23 = R\$ 4.796,15  TOTAL: R\$ 24.908,65
19	STL.XOO_24.23	Aquisição de Certificados digitais emitidos por entidade governamental	COFIN/SAOF	Exigência de utilização de certificado digital emitido por entidade governamental, para fins de acesso ao SIAFI por parte de todos os usuários que não possuem perfil exclusivamente de consulta, a partir do dia 23.07.2024, em razão de determinação da Secretaria do Tesouro Nacional.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC ARMDAD	C	N	33.90.40.19.0115	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	0,00	3.389,40	3.389,40	AC.3	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	SERPRO 150 certificados x R\$ 169,47 = R\$ 25.420,50 - contrato 52 certificados x R\$ 169,47 = R\$ 8.812,44 - utilizado em 2024 20 certificados x R\$ 169,47 = R\$ 3.389,40 - previsão para 2025  SEI 56582024
																					Diferença v. 1.0 e 2.0	
																					10.289,59	(Acréscimo nas despesas do Power BI e da GETI)
																					-17.352,10	(Redução de R\$ 7.062,51 para aquisição de câmeras fotográficas - SEI 10099/2024)
																					-7.062,51	Necessidade de remanejamento de R\$ 10.289,59 de Permanente para Custeio)
																					R\$ 0,00	
																					LIMITE 2025	5.160.933,00
																					RESERVA PARA REFORMAS	250.000,00
																					RESIDÊNCIA DE TI 2025 / 2026 - Estimado do valor total R\$ 1.240.000,00 (44,35%)	550.000,00
																					TOTAL STIE	4.360.933,00
																					TIC APOIO -> 39.90.40.21.0180 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC PJ	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																					
PLANO DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES DE TIC - ANO 2025																					
VERSÃO2.0 - Segurança da Informação																					
ITEM	CÓDIGO (PCA 2025)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	BREVE JUSTIFICATIVA	PRAZO DE ENTREGA			INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Classificação Objeto	Segurança Informação	Natureza	FONTE DE RECURSO	ESTIMATIVA SIGEPRO (R\$)	ESTIMATIVA 1.0 (R\$)	ESTIMATIVA 2.0 (R\$)	VINCULO COM O OBJETIVO ESTRATEGICO DO PEJERN	UNIDADE TECNICA	OBSERVAÇÃO 1.0
					DOD	ESTUDOS PRELIMINARES	TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO														
1	ST1.POO. XX	Licenças de suporte e atualização de versão das ferramentas Oracle Advanced Security (TDE e Data Reduction) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools	COSIS/STIE	Manter atualizados e com suporte técnico especializado os mecanismos de segurança Oracle Advanced Security (TDE e Data Reduction) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools, nos servidores de banco de dados Oracle do TRE-RN. Esses mecanismos, adquiridos pelo TRE-RN no ano de 2022, com licenciamento de uso perpétuo e com contrato de suporte e atualizações vigentes até 26/12/2023, permitem o uso de recursos avançados de segurança para os dados armazenados no "Oracle Database". O Oracle Database é um sistema de gerenciamento de banco de dados ao qual parte significativa das soluções da Justiça Eleitoral, cujas seminais datam de meados da década de 1990, é estruturalmente acoplada, gerando estreita dependência tecnológica das soluções ao produto. A adoção do Oracle Database tornou-se mandatória – como um padrão "de facto" – para os Tribunais Regionais Eleitorais, vez que devem consumir soluções providas, de modo compulsório e uniformizado,	NA	NA	NA	NA	NA	N	Custeio TIC LOCSOF	C	S	33.9040.06.0006	100 - Despesa Corrente e Pessoal Ativo	173.983,00	173.983,00	173.983,00	AC.3	Seção de Banco de Dados e Sistemas/COSIS/STIE	PAE Planejamento: 9411/2023 Contrato 03/2024 - TRE/RN  Oracle Advanced Security - Processor Perpetual (26336739) - 8 unid. 27.12.2023 a 26.12.2024: R\$ 55.805,64 Oracle Database Vault - Processor Perpetual (26336739) - 8 unid. 27.12.23 a 26.12.2024: R\$ 42.784,32 Subtotal Suporte: R\$ 98.589,96  Total: 173.982,29
SEGURANÇA - CUSTEIO																173.983,00	173.983,00	173.983,00			
SEGURANÇA - INVESTIMENTO																0,00	0,00	0,00			
TOTAL - SEGURANÇA																173.983,00	173.983,00	173.983,00			

Objetivos			Resultados-chave - Camada 1/2025										Medição				Observações	
Tr	ID	Tema (art. 2º de ENTC)	OKR Camada 01	KR Tier 1	Fórmula	Meta 1º trimestre 2025	Meta 2º trimestre 2025	Meta 3º trimestre 2025	Meta 4º trimestre 2025	Responsável	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre/ 1º Semestre	3º Trimestre	4º Trimestre/ 2º Semestre	Evidências		
OE1		Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	01 KR1.1.1	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC	$\frac{[(\text{Soma Not\_Sat\_Zc} + \text{Soma Not\_Sat\_SEC} / \text{Pontifkds}) \times 100]}{\text{Notas obtidas por meio da aplicação de questionário padronizado com os usuários internos do TRE/RN}}$	n/a	88%	n/a	88%	<div><div></div><div>GAP: 12%</div></div>	Semestral	-----		-----		<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/100b4h4bz-oJu6C4JADeV5UjDaOHSjPIFqT7z8tU/edit?d=1427694372&amp;usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/100b4h4bz-oJu6C4JADeV5UjDaOHSjPIFqT7z8tU/edit?d=1427694372&amp;usp=sharing</a>		
OE4		Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	02 KR1.4.1	Realizar publicações no Conect-us divulgando iniciativas da SITE	Contagem sequencial, de forma acumulativa	2	4	6	8	<div><div></div><div>GAP: 12%</div></div>	Trimestral					<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/100b4h4bz-oJu6C4JADeV5UjDaOHSjPIFqT7z8tU/edit?d=1427694372&amp;usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/100b4h4bz-oJu6C4JADeV5UjDaOHSjPIFqT7z8tU/edit?d=1427694372&amp;usp=sharing</a>		
OE6		Aprimorar as Aquisições e Contratações	03 KR1-6.1	Aumentar o índice de Contratações de TIC realizadas	Total de Itens adquiridos com sucesso no semestre/ Total de Itens previstos no planejamento da contratações de TIC para o semestre) x 100  <b>Contratação realizada considera:</b> - Contratação direta: nota de empenho emitida e/ou contrato assinado - Contratação com SRP: assinatura das ARPs e abertura de processo específico	n/a	n/a	n/a	90%	<div><div></div><div>GAP: 10%</div></div>	Anual	-----	-----	-----	-----			
OE7		Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	04 KR1-7.1	Garantir a atualização do sistema operacional dos servidores de rede	(Número de servidores de rede atualizados) / (Número total de servidores de rede no período) x 100	n/a	95%	n/a	95%	<div><div></div><div>COINF e COSIS</div></div>	Semestral	-----		-----		Evidência COSIS: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/17u807_A5uVGI-7Jf666G7a9a9p9R2H3z544dL">https://docs.google.com/spreadsheets/d/17u807_A5uVGI-7Jf666G7a9a9p9R2H3z544dL</a>  Evidência SRI: <a href="https://drive.google.com/file/d/1o2A4lWomVjaskZLpXsIGD1Vx86U6s/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1o2A4lWomVjaskZLpXsIGD1Vx86U6s/view?usp=sharing</a>		
OE7		Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	05 KR1-7.2	Reduzir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.	(Número de vulnerabilidades de severidade crítica e alta tratadas) / (Número de vulnerabilidades identificadas) x 100  Por meio da ferramenta de monitoramento, registrar o tempo de disponibilidade dos sistemas definidos como essenciais (TDSE), dividido pelo tempo total do período (TTP), multiplicado por cem. (TDSE/TTP) x 100 Obs.: Listar os sistemas que devem ser considerados essenciais. Descontar tempos de manutenção programada.	90%	90%	90%	90%	<div><div></div><div>COINF</div></div>	Trimestral					<a href="https://drive.google.com/drive/folders/1PBKF728C3Raul3L5CmCm6p9m1837d1">https://drive.google.com/drive/folders/1PBKF728C3Raul3L5CmCm6p9m1837d1</a>		
OE8		Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	06 KR1.8.1	Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC		99%	99%	99%	99%	<div><div></div><div>COINF e COSIS</div></div>	Trimestral					COINF: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/145VngSM7h8hJwF5F5931D52o8VxHhmgHu0C6o/edit?d=1693370640&amp;usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/145VngSM7h8hJwF5F5931D52o8VxHhmgHu0C6o/edit?d=1693370640&amp;usp=sharing</a>  COSIS: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/100b4h4bz-oJu6C4JADeV5UjDaOHSjPIFqT7z8tU/edit?d=1427694372&amp;usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/100b4h4bz-oJu6C4JADeV5UjDaOHSjPIFqT7z8tU/edit?d=1427694372&amp;usp=sharing</a>		

Objetivos			Resultados-chave - Camada 2/2025										Medição				Observações	
Objetivo Camada 1	Ti	ID	Tema	OKR Camada 02	KR Tier 2	Fórmula	Meta 1ª trimestre	Meta 2ª trimestre	Meta 3ª trimestre	Meta 4ª trimestre	Responsável	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre/1º Semestre	3º Trimestre	4º Trimestre/2º Semestre	Evidências	
OE1	OT1.1		Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	07 KR2-1.1.1	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	Medição direta na central de serviços	85%	85%	85%	85%	CONF	Trimestral						
OE1	OT1.1		Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	08 KR2-1.1.2	Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC	Toda de notas ótimo por avaliação (registrar) x 100 Notas obtidas em avaliação realizada diretamente no sistema de abertura de chamados	95%	95%	95%	95%	CONF	Trimestral						
OE1	OT1.2		Buscar a excelência no desenvolvimento de sistemas administrativos	09 KR2-1.2.1	Aumentar o nível de satisfação com o desenvolvimento e suporte aos sistemas	Notas obtidas em avaliação direta no sistema por avaliadores de desempenho e a cada sistema pelos servidores demandantes/Quantitativo de sistemas entregues e avaliados no período	n/a	n/a	n/a	9,5	GSSS	Anual	----	----	----			
OE6	OT6.1		Aprimorar a execução operacional de TIC	10 KR2-6.1.1	Maximizar o percentual de pagamento de contratações de TIC liquidado no exercício	$\frac{\text{Orçamento liquidado}}{\text{Orçamento previsto no trimestre}} \times 100$	n/a	20%	n/a	90%	GAPRIE	Semestral	----		----		<a href="https://bit.ly/3u3a3b7/#">https://bit.ly/3u3a3b7/#</a>	
OE6	OT6.2		Aprofundar a fase de planejamento das contratações e aquisições	11 KR2-6.2.1	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (ODD, EIP e TN)	$\frac{\text{Quantidade de artefatos entregues}}{\text{Quantidade de artefatos previstos para o trimestre}} \times 100$	80%	80%	80%	80%	GAPRIE	Trimestral						
OE8	OT8.4		Adotar componentes de software seguros para o desenvolvimento de sistemas	12 KR2-8.4.1	Maximizar a atualização de bibliotecas e dependências de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas	$\frac{\text{Quantidade de bibliotecas atualizadas na última versão}}{\text{Quantidade de bibliotecas de bibliotecas utilizadas}} \times 100$	n/a	40%	n/a	50%	CONF	Semestral	----		----			





# 1ª REUNIÃO 2025 COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

CGOVTIC - TRE/RN

27.02.2025





## OBJETIVOS DA REUNIÃO:

01

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PDTIC 2024

02

APROVAÇÃO DO PDTIC 2025

# RESULTADOS DO PDTIC 2024



## CAPACITAÇÃO

- 05 capacitações realizadas
- 04 capacitações canceladas
- 01 capacitação adiada para 2025

## DEMANDAS

- 05 não iniciadas\*
- 20 em andamento
- 52 concluídas
- 3 pausadas
- 4 canceladas

\*adiadas para 2025/2026

## CONTRATAÇÕES

- 08 contratos contínuos
- 01 renovação concluída
- 02 renovações iniciadas
- 09 processos de planejamento iniciados
- 09 contratações finalizadas com sucesso

## INDICADORES

- 07 indicadores com atendimento integral das metas
- 08 indicadores com atendimento parcial das metas
- 02 indicadores sem atingir a meta

# PLANO DE CAPACITAÇÕES

## 2024 - Resultados

ITEM	CAPACITAÇÃO	PÚBLICO ALVO (SETOR)	PARTICIPANTES	CARGA HORÁRIA	MODALIDADE/ LOCAL	TOTAL DA DESPESA	STATUS
1	Administração de Base de Dados Oracle 19c - Online	SBDS	3	40h	Online	R\$ 13.200,00	REALIZADO
2	Orquestração de Containers com Uso de Kubernetes	SNT, SDS, SBDS	8	48h	In Company	R\$ 0,00	CANCELADO
3	CI/CD: Integração e Entrega Continua	SNT, SDS	8	48h	In Company	R\$ 0,00	CANCELADO
4	Participação no CONIP JUD 2024	STIE, COINF, COSIS	3	16	Presencial	R\$ 16.254,06	REALIZADO
5	Participação no ENASTIC 2024	STIE, GAPSTIE, EJE, LIODS	5	24	Presencial	R\$ 34.924,62	REALIZADO
6	Segurança de Redes e Sistemas	SSI	4	40h	Presencial	R\$ 0,00	CANCELADO
7	Tratamento de Incidentes de Segurança	SSI	2	40h	Presencial	R\$ 1.920,00	REALIZADO
8	Ethical Hacking	SSI	1	40h	EAD/Instrutor	R\$ 11.114,15	REALIZADO
9	Solução de Inteligência Cibernética	SSI	3	40h	EAD	R\$ 67.560,00	EM ANDAMENTO
10	Curso de contratações de TIC	STIE	4	16h	EAD/Instrutor	R\$ 0,00	CANCELADO
TOTAL:			14			144.972,83	
						153.167,93	
						8.195,10	Devolvido como sobra

\*O valor de R\$ 67.560,00 foi inscrito em RP para realização da capacitação no ano de 2025



# PLANO DE DEMANDAS INTERNAS 2024 - Resultados

Área	Área das ações	Não iniciada	Em andamento	Concluída	Pausada	Cancelada	Totais
GAPSTIE	Ações de Gestão de TIC	00	01	00	00	00	01
COINF	Ações de Infraestrutura, Segurança da Informação, Comunicação de Dados e Suporte às Eleições	00	02	08	00	00	10
COELE	Ações de Logística e Gestão das Eleições	00	03	09	00	00	12
COSIS	Desenvolvimento de Sistemas, Ações de BI e transformação digital	04	07	21	02	01	35
RESIDÊNCIA	Ações de BI	01	07	14	01	03	26
Total de ações		05	20	52	03	04	84

LINK: [Plano de Demandas Internas 2024 - v. 3.0](#)

# PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2024 - Resultados



	VERSÃO 7.0	Valores pagos	Inscrito em RPP - Liquidados a pagar	Inscrito em RPP - A liquidar
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	2.172.235,98	2.091.187,60	80.095,10	953,28
MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	5.813.783,29	5.264.804,02	311.795,73	237.183,54
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	7.986.019,27	7.355.991,62	391.890,83	238.136,82

LINK: [Plano de Contratações 2024 - v. 7.0](#)

# PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2024 - Resultados



	SIGEPRO	VERSÃO 1.0	VERSÃO 2.0	VERSÃO 3.0	VERSÃO 4.0	VERSÃO 5.0	VERSÃO 6.0	VERSÃO 7.0	Variação
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	2.123.084,00	2.140.012,00	2.140.012,00	2.261.561,44	2.520.648,94	2.462.565,32	2.181.517,80	2.172.235,98	102%
MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	3.065.759,00	3.065.759,00	3.065.759,00	3.020.921,06	3.020.921,06	4.395.308,00	5.658.676,50	5.813.783,29	189%
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	5.188.843,00	5.205.771,00	5.205.771,00	5.282.482,50	5.541.570,00	6.857.873,32	7.840.194,30	7.986.019,27	154%

LINK: [Plano de Contratações 2024 - v. 7.0](#)



# PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2024 - Resultados



## Segurança da Informação

	VERSÃO 7.0	Valores pagos	Inscrito em RPP - A liquidar
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	3.818.087,27	3.803.927,27	14.160,00
MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	3.818.087,27	3.803.927,27	14.160,00

LINK: [Plano de Contratações 2024 - v. 7.0](#)

# PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2024 - Resultados



## Segurança da Informação

	SIGEPRO	VERSÃO 1.0	VERSÃO 2.0	VERSÃO 3.0	VERSÃO 4.0	VERSÃO 5.0	VERSÃO 6.0	VERSÃO 7.0	Variação
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	3.809.494,00	3.809.494,00	3.681.700,00	3.816.537,00	3.812.997,00	3.812.997,00	3.822.437,59	3.818.087,27	100,22%
MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	400.000,00	400.000,00	400.000,00	495.399,00	495.399,00	495.399,00	0,00	0,00	0%
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	4.209.494,00	4.209.494,00	4.081.700,00	4.311.936,00	4.308.396,00	4.308.396,00	3.822.437,59	3.818.087,27	90,70%

Sobra devolvida	R\$ 14.701,41
Sobra devolvida	R\$ 474.797,00
Total	R\$ 489.498,41

LINK: [Plano de Contratações 2024 - v. 7.0](#)

# MEDIÇÃO DOS INDICADORES

## 2024 - Resultados

KR Tier 1	Meta 1º trimestre 2024	Meta 2º trimestre 2024	Meta 3º trimestre 2024	Meta 4º trimestre 2024	Frequência	1º Trimestre	2º Trimestre 1º Semestre	3º Trimestre	4º Trimestre 2º Semestre
Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC	n/a	86%	n/a	86%	Semestral	-	92.48%	-	86.34%
Realizar publicações no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE	2	4	6	8	Trimestral	2	4	7	9
Ampliar a execução do PTE	n/a	40%	n/a	60%	Semestral	-	70%	-	Não realizada
Aumentar o índice de Contratações de TIC realizadas	n/a	30%	n/a	90%	Semestral	-	40%	-	75%
Garantir a atualização do sistema operacional dos servidores de rede	95%	95%	95%	95%	Trimestral	100%	94,4%	81,5%	81,5%
Reduzir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.	90%	90%	90%	90%	Trimestral	87,5%	100%	33,3%	80%
Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	99%	99%	99%	99%	Trimestral	99.085%	99.23%	99.14%	98.52%
Ampliar o número de soluções que atendem aos requisitos de acessibilidade	n/a	1	n/a	1	Semestral	-	0	-	0

LINK: [MEDIÇÃO DOS INDICADORES - Objetivos e Resultados Chave 2024](#)

# MEDIÇÃO DOS INDICADORES

## 2024 - Resultados

KR Tier 2	Meta 1º trimestre 2024	Meta 2º trimestre 2024	Meta 3º trimestre 2024	Meta 4º trimestre 2024	1º Trimestre	2º Trimestre 1º Semestre	3º Trimestre	4º Trimestre 2º Semestre
Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA	85%	85%	85%	85%	98%	98%	97.24%	95.32%
Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC	95%	95%	95%	95%	97.60%	97.80%	98%%	100.00%
Aumentar o nível de satisfação com o desenvolvimento e suporte dos sistemas	n/a	9,5	n/a	9,5	-	10,0	-	9,48
Aumentar iniciativas de TIC relacionadas à inovação	n/a	1	n/a	1	-	2	-	4
Índice de modelagem de processos	n/a	50%	n/a	50%	-	67%	-	100%
Maximizar o percentual de orçamento de contratações de TIC liquidado no exercício	n/a	25%	n/a	90%	-	16.05%	-	92,11%
Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, EP e TR)	80%	80%	80%	80%	80%	73%	44%	62%
Aumentar o percentual anual de aquisições de bens e contratações de serviços com análise de adoção de requisitos e critérios socioambientais na etapa de planejamento.	n/a	80%	n/a	80%	-	100%	-	100%
Maximizar a atualização de bibliotecas e dependências de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas.	50%	50%	50%	50%	25,03%	31,91%	31,91%	45,92%

LINK: [MEDIÇÃO DOS INDICADORES - Objetivos e Resultados Chave 2024](#)



# PDTIC 2025 - Aprovação

## Metodologia PDTIC

### Levantamento

Identificação e análise dos documentos de referência;

Realização de levantamento de necessidades e demandas de TIC;

Avaliação dos Resultados do PDTIC anterior, com realização de diagnóstico, para compreender a situação atual da STIE/TRE/RN.

### Planejamento

Consolidação das demandas de bens e serviços, de capacitações e iniciativas;

Construção dos objetivos e indicadores utilizando a metodologia OKR;

Elaboração dos planos derivados deste PDTIC;

Elaboração das minuta do PDTIC e da Portaria que o institui.

### Comitês

Validação da Matriz SWOT

Validação de resultados-chave, metas e macrodesafios;

Validação de iniciativas

Priorização dos sistemas

Aprovação

As ações e projetos do PDTIC consideram as demandas originadas de:

- Requisitos legais, como os novos direcionamentos da nova ENTIC-JUD (Res. CNJ nº 370/2021) e das outras normas específicas daquele órgão;
- Solicitações oriundas das diversas áreas demandantes;
- Projetos e ações não finalizados do PDTIC anterior que foram considerados aptos à continuidade;
- Projetos da STIE relacionados às eleições;
- Ações necessárias à implementação da política de segurança da informação regulamentada pela Resolução nº 110/2023 do TRE-RN; e
- Ações necessárias à implementação do Plano de Ação para adequação do TRE/RN à LGPD, conforme a Portaria nº 84/2021-GP.





# PDTIC 2025 - Aprovação



# PDTIC 2025 - Aprovação

## **Missão da STIE**

Fornecer soluções tecnológicas com excelência, visando otimizar o alcance dos objetivos estratégicos institucionais.

## **Visão da STIE**

Ser reconhecida por apresentar soluções inovadoras, primando pela segurança e transparência nas demandas de TIC

## **Atributos de Valor da STIE**

Segurança da Informação

Qualidade

Celeridade

Comprometimento

Cooperação

Eficiência





# PLANO DE CAPACITAÇÃO

## 2025 V. 1.1



ITEM	CURSO	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	TOTAL DA DESPESA
1	Extreme Fabric: Installation & Configuration (EAD 04-06/11/2024 e 28-30/01/2025)	SRI	1	R\$ 12.827,62
2	Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis	SDS/SBDS/SNT/SRI	14	R\$ 15.386,00
3	Gestão de Serviços com GLPI	SMI	5	R\$ 9.500,00
4	Gestão de Segurança da Informação	COINF/SSI	2	R\$ 3.840,00
5	Cibersegurança	SSI	4	R\$ 9.200,00
6	Red Hat Linux Automation with Ansible (RH294)	SRI	1	R\$ 14.400,00
7	Ivanti	SMI/SSI	8	R\$ 22.910,38
8	GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS <a href="https://www.sympla.com.br/evento/govtech-summit-2025/2489268?referrer=govtechsummit.com.br">https://www.sympla.com.br/evento/govtech-summit-2025/2489268?referrer=govtechsummit.com.br</a>	STIE	2	R\$ 14.544,00
9	Semana Conip 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasilia/DF <a href="https://conipdigital.com.br/">https://conipdigital.com.br/</a>	STIE	3	R\$ 19.392,00
10	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22	GAPSTIE/SRI/SSI/SNT	8	R\$ 19.920,00
11	Plataforma multicursos para servidores do GAPSTIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	GAPSTIE, SUE, SSAE, SPLE e COELE	10	R\$ 13.080,00
Total				R\$ 155.000,00

LINK: [Plano de Capacitação 2025 - v. 1.1](#)

# PLANO DE DEMANDAS INTERNAS 2025 - V.2.0

## Classificação das iniciativas

### GESTÃO DE TIC

Ações e projetos cujo objetivo é elevar a maturidade da governança corporativa de TIC no Tribunal.

GEST



### LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES

Ações e projetos voltados ao planejamento e preparação das eleições.

LOG



### INFRAESTRUTURA

Ações e projetos que visam ampliar a capacidade e a disponibilidade da central de dados e da comunicação do Tribunal, atualizar o parque computacional e aperfeiçoar o suporte aos sistemas atualmente em produção/desenvolvimento.

INFR



### SISTEMAS

Contempla serviços estratégicos de sustentação a sistemas, sistemas estruturantes e sistemas setoriais.

SIST



### BUSINESS INTELLIGENCE

Contempla os projetos, ações e iniciativas desenvolvidas na área de BI pela Residência de TIC do TRE/RN

BI





# PLANO DE DEMANDAS INTERNAS 2025 - V.2.0



Área	Área das ações	Quantidade de Ações v1.0	Quantidade de Ações v2.0
GAPSTIE	Ações de Gestão de TIC	01	02
COINF	Ações de Infraestrutura, Segurança da Informação, Comunicação de Dados e Suporte às Eleições	06	07
COELE	Ações de Logística e Gestão das Eleições	25	27
COSIS	Desenvolvimento de Sistemas, Ações de BI e transformação digital	17	20
RESIDÊNCIA	Ações de BI	5	12
Total de ações	-	54	68

# PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025

	Versão SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	Observações
<b>MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO</b>	<b>3.527.860,00</b>	<b>3.386.678,40</b>	<b>3.396.967,99</b>	(Acréscimo nas despesas do Power BI e da GETI)
<b>MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO</b>	<b>59.090,00</b>	<b>563.466,60</b>	<b>546.114,50</b>	(Redução de R\$ 7.062,51 para aquisição de câmeras fotográficas - SEI 10099/2024) Necessidade de remanejamento de R\$ 10.289,59 de Permanente para Custeio)
<b>TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>3.586.950,00</b>	<b>3.950.145,00</b>	<b>3.943.082,49</b>	

LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 2.0](#)

# PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC

## 2025 - Segurança da Informação

	Versão SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0
<b>MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO</b>	<b>173.983,00</b>	<b>173.983,00</b>	<b>173.983,00</b>
<b>MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>173.983,00</b>	<b>173.983,00</b>	<b>173.983,00</b>

LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 2.0](#)

# OBJETIVOS E INDICADORES DE TIC 2025

ID	Tema (art. 2o da ENTIC)	OKR Camada 01	KR Tier 1
OE1	Aumentar a Satisfação dos Usuários do Sistema Judiciário	01 KR1-1.1	Aumentar o índice de satisfação dos usuários internos de TIC
OE4	Buscar a Inovação de Forma Colaborativa	02 KR1-4.1	Realizar publicações no Connect-Jus divulgando iniciativas da STIE
OE6	Aprimorar as Aquisições e Contratações	03 KR1-6.1	Aumentar o índice de Contratações de TIC realizadas
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	04 KR1-7.1	Garantir a atualização do sistema operacional dos servidores de rede
OE7	Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados	05 KR1-7.2	Reduzir o número de vulnerabilidades críticas e altas no ambiente tecnológico.
OE8	Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	06 KR1-8.1	Garantir o mínimo de 97% de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC



# OBJETIVOS E INDICADORES DE TIC 2025

Objetivo camada 1	ID	Tema	OKR Camada 02	KR Tier 2
OE1	OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	07 KR2- 1.1.1	Aumentar o percentual de chamados atendidos de acordo com os SLA
OE1	OT1.1	Aprimorar o serviço de suporte ao usuário	08 KR2- 1.1.2	Garantir o nível de satisfação de atendimento de chamados de TIC
OE1	OT1.2	Buscar a excelência no desenvolvimento de sistemas administrativos	09 KR2- 1.2.1	Aumentar o nível de satisfação com o desenvolvimento e suporte dos sistemas
OE6	OT6.1	Aprimorar a execução orçamentária de TIC	10 KR2-6.1.1	Maximizar o percentual de orçamento de contratações de TIC liquidado no exercício
OE6	OT6.2	Aperfeiçoar a fase de planejamento das contratações e aquisições	11 KR2-6.2.1	Garantir o cumprimento dos prazos de entrega dos artefatos (DOD, ETP e TR)
OE8	OT8.4	Adotar componentes de software seguros para o desenvolvimento de sistemas	12 KR2-8.4.1	Maximizar a atualização de bibliotecas e dependências de software utilizadas no desenvolvimento de sistemas.

Obrigado!  
Comitê de  
Governança de TIC
