



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ATA DE REUNIÃO Nº 4/2024/CGOVTIC

1. Identificação da reunião

Data	Horário	Local	Responsável
29/10/2024	13h às 14h	Sala da Presidência	Desa. Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo

2. Objetivo

Validação dos artefatos que irão compor o PDTIC 2025 e acompanhamento do Plano de Contratações de TIC 2024

3. Itens da pauta

Item	Descrição
1.	Acompanhamento do Plano de Contratações de TIC 2024
2.	Validação dos artefatos que irão compor o PDTIC 2025

4. Participantes

Nome	Setor de atuação
Desembargadora Maria de Lourdes Medeiros de Azevedo	Presidência
Juliana Capistrano de Araújo Monte Sampaio	APRES
Hercley Medeiros de Araújo Fernandes	GABPRES
Ana Esmera Pimentel da Fonseca	DG
Marcos Flávio Nascimento Maia	STIE
Cláudia Josemira Marinho de Lima	SGP
Simone Maria de Oliveira Soares Mello	SAOF
João Paulo de Araújo	SJ

5. Itens de Discussão

Item	Descrição	Responsável
1.	Plano de Contratações de TIC - 2024 Foi apresentada a atualização do Plano de Contratações de TIC, cujo acompanhamento das contratações ensejou em alguns ajustes como: - Adiamento da contratação das demandas XX e XX para 2025 - Inserção das novas demandas de 2025 cujo DOD já será protocolado em 2024 - Ajuste nos valores de execução dos contratos - Informação de sobra em custeio no valor de R\$ 32.789,58 Deste modo, foram aprovados os ajustes e validada a versão 6.0 do Plano de Contratações de TIC 2024, que segue como anexo desta ata.	Marcos Flávio Nascimento Maia
2.	Artefatos do PDTIC 2025 Foram apresentados 03 dos artefatos do PDTIC que, por força legal, precisariam estar validados até 30.10. Foram aprovados os seguintes artefatos: - Plano de Contratações de TIC 2025 - v1.0 - Plano de Capacitação de TIC 2025 - v1.0 - Plano de Demandas Internas de TIC 2025 - v1.0 Todos foram validados e constarão como anexos desta ata.	Marcos Flávio Nascimento Maia

6. Pendências

Nenhuma pendência registrada

7. Observações

Sem observações

8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
29/10/2024	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

ANEXO(S)

- Anexo 1 - Slides da apresentação 0122759
- Anexo 2 - Plano de Contratações de TIC 2024 - v.6.0 0122762
- Anexo 3 - Plano de Contratações de TIC 2025 - v.1.0 0122764
- Anexo 4 - Plano de Capacitação de TIC 2025 - v.1.0 0122770
- Anexo 5 - Plano de Demandas Internas de TIC 2025 - v.1.0 0122775



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Secretário(a) do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, em substituição**, em 02/12/2024, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Paulo de Araujo**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 04/12/2024, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Claudia Josemira Marinho de Lima**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 06/12/2024, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.




Documento assinado eletronicamente por **Marcos Flavio Nascimento Maia**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 19/12/2024, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Simone Maria de Oliveira Soares Mello**, **Membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação**, em 19/12/2024, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-mn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=0116576&crc=1CFD5FAF informando, caso não preenchido, o código verificador **0116576** e o código CRC **1CFD5FAF**.

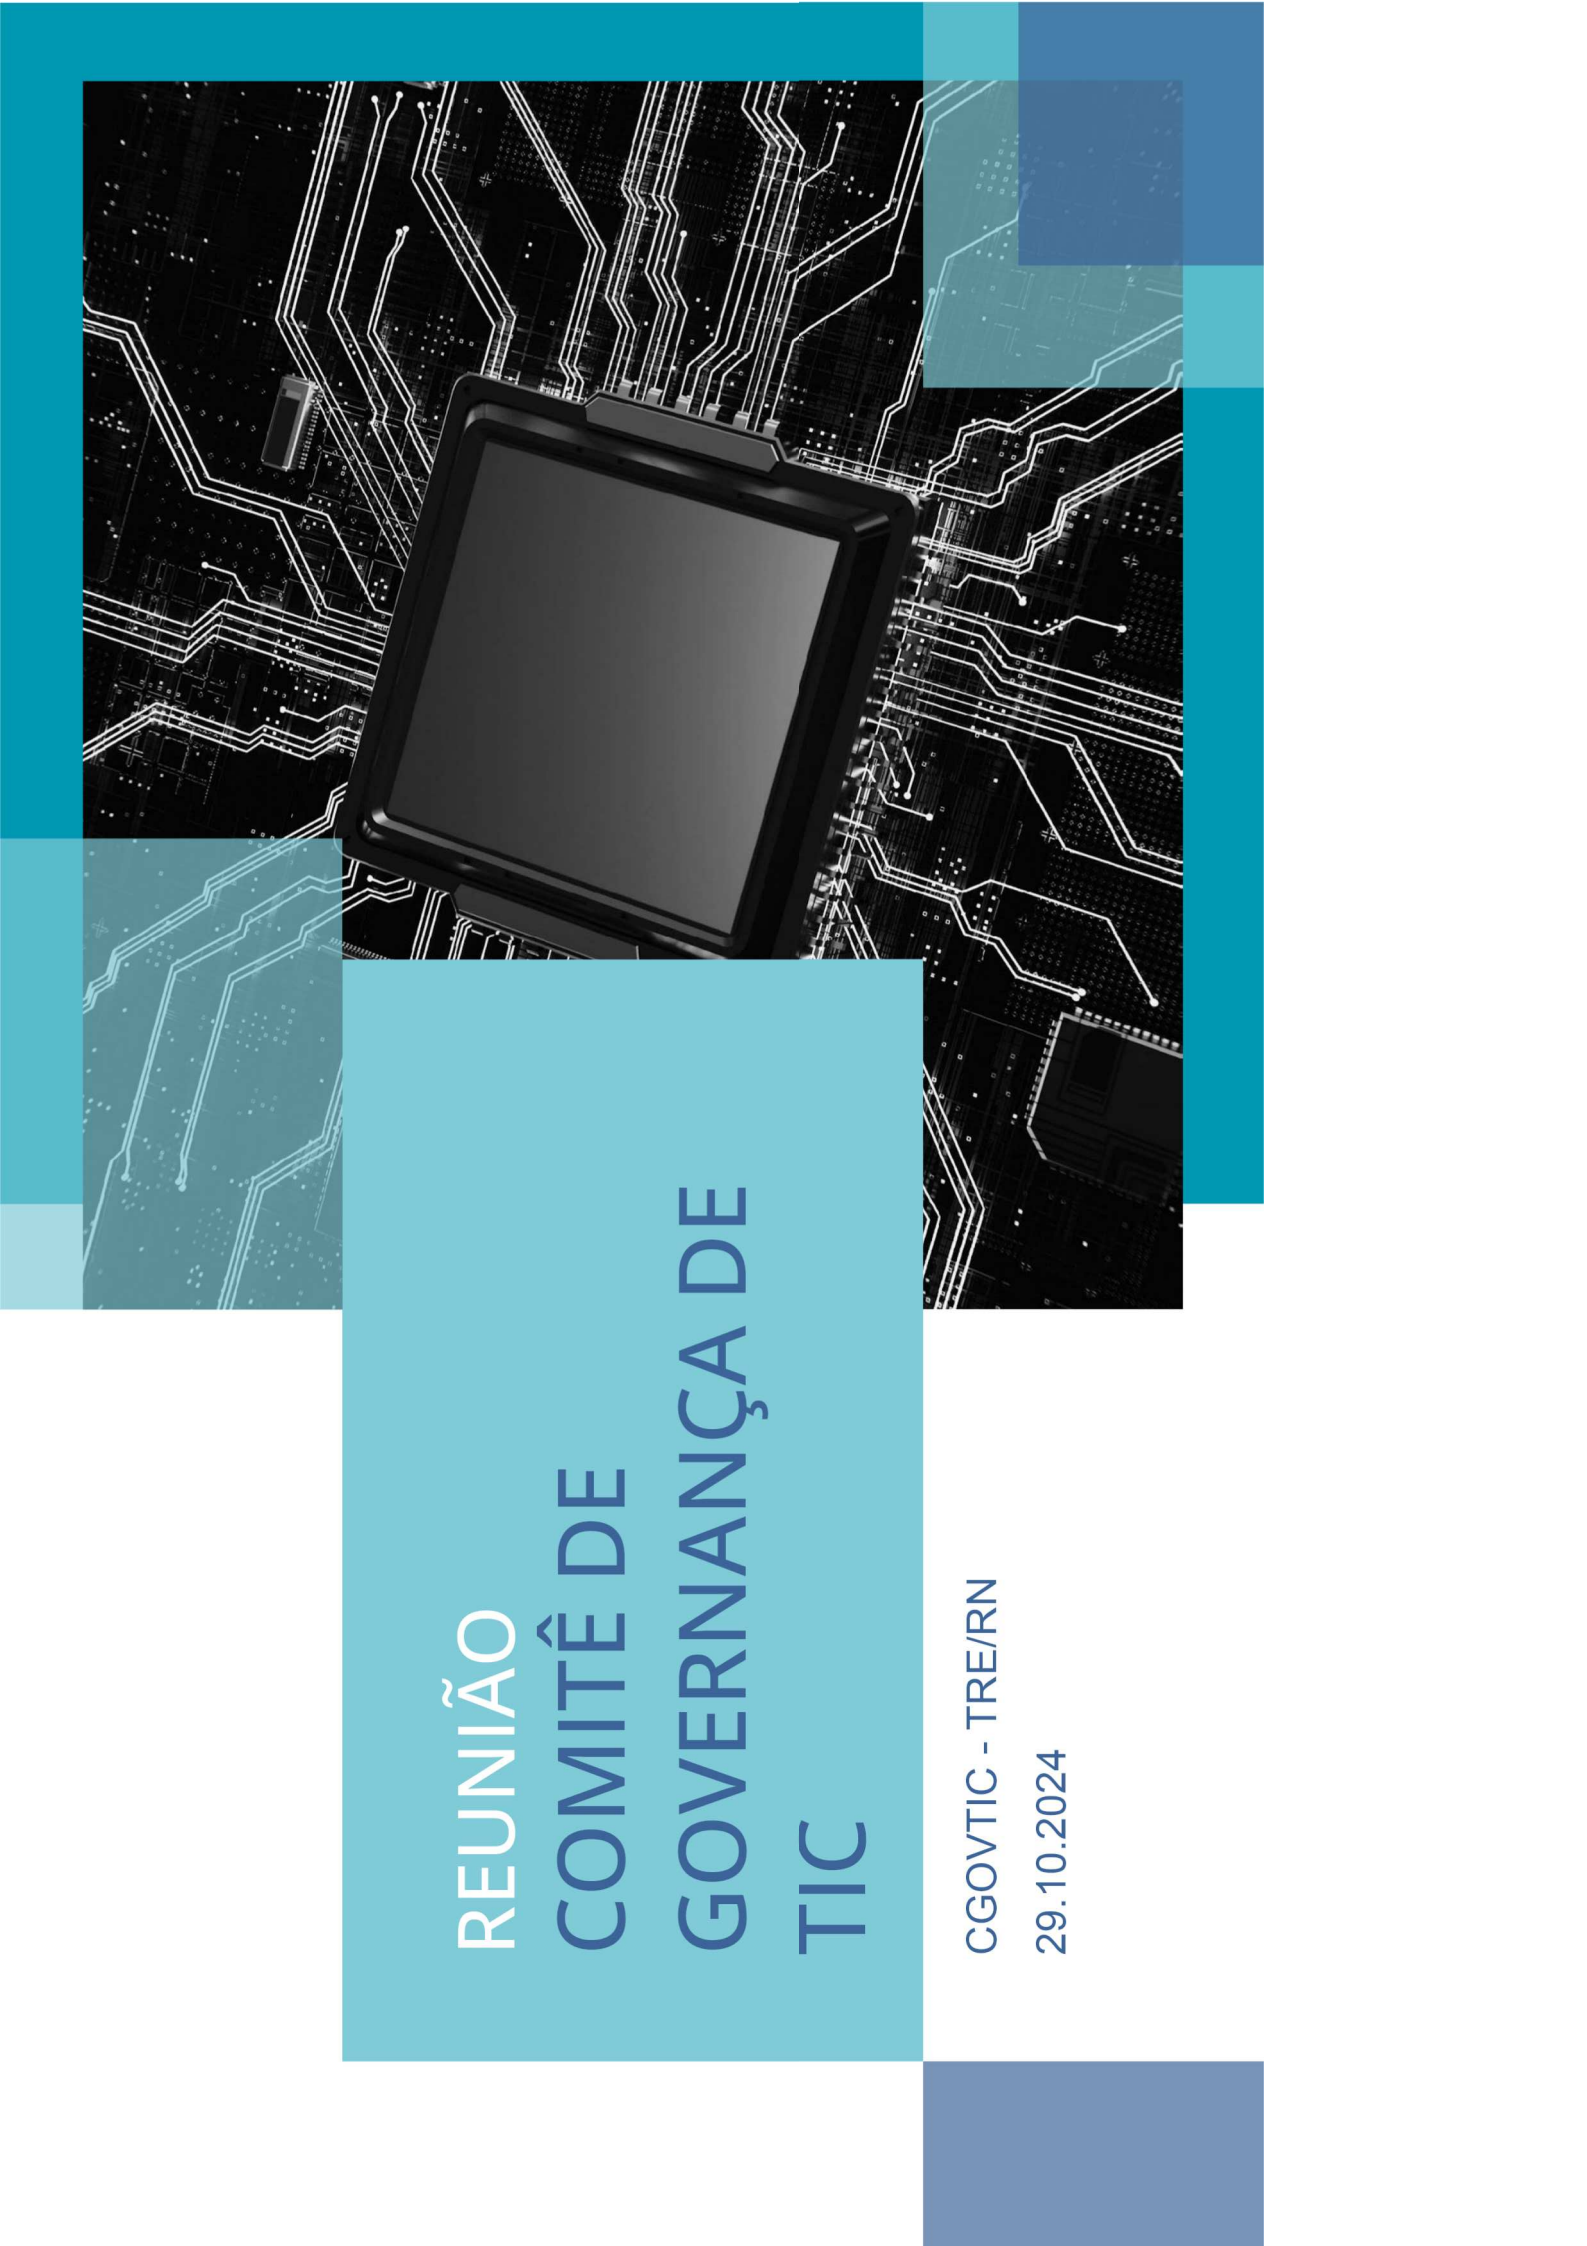

REUNIÃO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

CGOVTIC - TRE/RN

29.10.2024



OBJETIVOS DA REUNIÃO:

01

PLANO DE CONTRATAÇÕES 2024 - V. 6.0

02

PLANO DE CONTRATAÇÕES 2025 - V. 1.0

03

PLANO DE CAPACITAÇÃO DE TIC 2025 - V. 1.0

04

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DE TIC 2025 - V. 1.0

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2024



	VERSÃO 5.0	VERSÃO 6.0	
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	2.462.565,32	2.231.017,80	
MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	4.395.308,00	4.996.546,43	
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	6.857.873,32	7.227.564,23	
Valor SIAFI Cust.		2.263.807,38	32.789,58
Valor SIAFI Inv.		4.963.756,85	-32.789,58
Valor SIAFI Total		7.227.564,23	0,00

LINK: [Plano de Contratações 2024 - v. 6.0](#)

PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025

	Versão SIGEPRO	Versão 1.0
MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	3.527.860,00	3.386.678,40
MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	59.090,00	563.466,60
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	3.586.950,00	3.950.145,00

LINK: [Plano de Contratações 2025 - v. 1.0](#)

PLANO DE CAPACITAÇÃO

2025 V. 1.0




LINK: [Plano de Capacitação 2025 - v. 1.0](#)

ITEM	CURSO	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	TOTAL DA DESPESA
1	Extreme Fabric: Installation & Configuration (EAD 04-06/11/2024 e 28-30/01/2025)	SRI	1	R\$ 12.827,62
2	Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis	SDS/SBDS/SNT/SRI	14	R\$ 15.386,00
3	Gestão de Serviços com GLPI	SMI	5	R\$ 9.500,00
4	Gestão de Segurança da Informação	COINF/SSI	2	R\$ 3.840,00
5	Cibersegurança	SSI	4	R\$ 9.200,00
6	Red Hat Linux Automation with Ansible (RH294)	SRI	1	R\$ 14.400,00
7	Ivanti	SMI/SSI	8	R\$ 22.910,38
8	GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS https://www.sympla.com.br/evento/govtech-summit-2025/2489268?referer=govtechsummit.com.br	STIE	2	R\$ 14.544,00
9	Semana Conip 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasília/DF https://conipdigital.com.br/	STIE	3	R\$ 19.392,00
10	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22	GAPSTIE/SRI/SSI/ SNT	8	R\$ 19.920,00
11	Plataforma Alura para servidores do GAPSTIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	GAPSTIE, SUE, SSAE, SPLE e COELE	10	R\$ 13.080,00
Total				R\$ 155.000,00

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS 2025 - V.1.0

Área	Área das ações	Quantidade de Ações
GAPSTIE	Ações de Gestão de TIC	01
COINF	Ações de Infraestrutura, Segurança da Informação, Comunicação de Dados e Suporte às Eleições	06
COELE	Ações de Logística e Gestão das Eleições	25
COSIS	Desenvolvimento de Sistemas, Ações de BI e transformação digital	17
RESIDÊNCIA	Ações de BI	5
Total de ações	-	54

LINK: [Plano de Demandas Internas 2025 - v. 1.0](#)

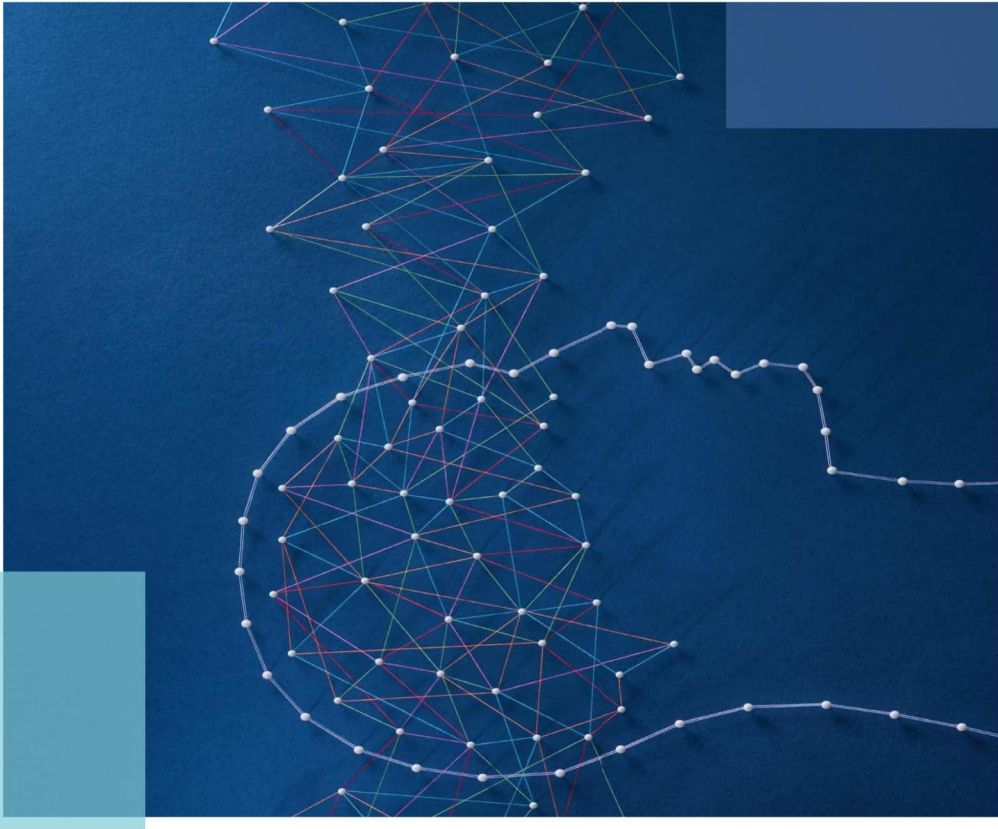

Obrigado!
Comitê de
Governança de TIC

[illegible]

MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	MANUTENÇÃO GERAL - CUSTEIO	2,181,517.80
MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	MANUTENÇÃO GERAL - INVESTIMENTO	5,558,676.50
TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	TOTAL - MANUTENÇÃO GERAL	7,740,194.30

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DO GABINETE E APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO DA STIE - ANO 2025

VERSÃO 1.0

ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TERMINO	SITUAÇÃO
2025	1	2025-001-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2026	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2026, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2025/08	2025/11	Não iniciada

ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2024/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
2025	1	2024-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/10	2025/06	Em andamento
2025	2	2025-001-COINF-INFR	Ampliação rede WiFi (instalação e configuração)	Instalação de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	3	2025-002-COINF-INFR	Ampliação e modernização do parque de Switches dos cartórios do interior (instalação e configuração)	Instalação e substituição de switches PoE nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia, implementando monitoramento em tempo real do tráfego de rede	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/03	2025/06	Não iniciada
2025	4	2025-003-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE (instalação e configuração)	Instalação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	5	2025-004-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2025/06	Não iniciada
2025	6	2025-005-COINF-INFR	Ampliação da estrutura de monitoramento das soluções de Segurança Cibernética, com integração de dashboards e acompanhamento em tempo real	Integração dos alertas gerados pelas soluções implantadas de Segurança Cibernética (dashboards)	SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2024/01	2025/05	Não iniciada

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE ELEIÇÕES/STIE - ANO 2025

VERSÃO 1.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
1	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPLE	PI4	01/2024	02/2025	Em andamento
2	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	03/2024	02/2025	Em andamento
3	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	10/2025	12/2025	Não iniciada
4	2025-002-COELE-LOG	Workshop do sistema ELO	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca do aprimoramento do suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada
5	2025-003-COELE-LOG	Workshop do sistema SAE	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários e no suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	09/2025	Não iniciada
6	2025-004-COELE-LOG	Workshop do sistema Mesários	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SPLE	PI4	06/2025	07/2025	Não iniciada
7	2025-005-COELE-LOG	workshop do sistema GEL	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	06/2025	07/2025	Não iniciada
8	2025-006-COELE-LOG	Workshop dos sistemas de Candidatura	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	09/2025	10/2025	Não iniciada
9	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos períodos e eventos.	COELE	COELE	PI4	01/2025	02/2025	Não iniciada
10	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	03/2025	05/2025	Não iniciada
11	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	06/2025	08/2025	Não iniciada
12	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	09/2025	10/2025	Não iniciada

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE ELEIÇÕES/ISTIE - ANO 2025

VERSÃO 1.0

ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
13	2025-011-COELE-LOG	Treinamento do sistema GEL	Elaborar o treinamento do sistema GEL para repasse às zonas eleitorais de todo o Estado, de forma remota, objetivando a sua adequada utilização para o alcance da integralidade dos locais de votação do RN georreferenciados.	COELE	SSAE	PI4	08/2025	08/2025	Não iniciada
14	2025-012-COELE-LOG	PIELEI 2026	Elaboração do Planejamento das Eleições 2026, com todas as diretrizes da próxima eleição geral.	COELE	COELE	PI4	03/2025	10/2025	Não iniciada
15	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretaria do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPL	PI4	03/2025	05/2025	Não iniciada
16	2025-014-COELE-LOG	Proposta Orçamentária de Pleitos	Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos para as Eleições 2026	COELE	SPL	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada
17	2025-015-COELE-LOG	Portal das Eleições 2026	Elaboração do Projeto de atualização do Portal das Eleições 2026 pelas unidades envolvidas, detalhando os períodos e os responsáveis pela alimentação.	COELE	SPL	PI4	10/2025	11/2025	Não iniciada
18	2025-016-COELE-LOG	Plano de Contratação de Pleitos	Elaboração do Plano de Contratações de Pleitos de 2026 e envio à SAOF.	COELE	SPL	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada
19	2025-017-COELE-LOG	Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo os participantes e os procedimentos a serem adotados.	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir	Não iniciada
20	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de ação de cada eleição suplementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos, toda a logística a ser adotada, os custos e os responsáveis por cada atividade.	COELE	SUE	PI4	a definir	a definir	Não iniciada
21	2025-019-COELE-LOG	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção preventiva das urnas eletrônicas"	COELE	SUE	PI4	02/2025	03/2025	Não iniciada
22	2025-020-COELE-LOG	Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção corretiva das urnas eletrônicas"	COELE	SUE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada
23	2025-021-COELE-LOG	Suporte às Eleições Comunitárias	Modelar o processo de trabalho "Suporte às Eleições Comunitárias"	COELE	SUE	PI4	10/2025	11/2025	Não iniciada
24	2025-022-COELE-LOG	Simulados	Modelar o processo de trabalho "Simulados"	COELE	SSAE	PI4	03/2025	04/2025	Não iniciada
25	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	PI4	04/2025	05/2025	Não iniciada

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA COORDENADORIA DE SISTEMAS CORPORATIVOS/STIE- ANO 2025

VERSÃO 1.0

ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
2025	1	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações contêinerizadas implantadas no ambiente da homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2025/01	Em andamento
2025	2	2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2025/03	Em andamento
2025	3	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2024/05	2025/03	Não iniciada
2025	4	2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2024/04	2025/06	Não iniciada
2025	5	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	6	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	7	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	8	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	9	2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/01	2025/06	Pausada
2025	10	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2025/01	2025/06	Pausada
2025	11	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/06	2025/12	Não iniciada
2025	12	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2025/06	2025/12	Não iniciada
2025	13	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/05	Não iniciada
2025	14	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	15	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	ASCOM	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06	Não iniciada
2025	16	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/07	2025/12	Não iniciada
2025	17	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2025/07	2025/12	Não iniciada

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE										
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS DA RESIDÊNCIA/STIE - ANO 2025										
VERSÃO 1.0										
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/ PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO	TÉRMINO	SITUAÇÃO
2025	1	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03	Em andamento
2025	2	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03	Em andamento
2025	3	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03	Não iniciada
2025	4	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	Pausada
2025	5	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontram em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06	CONTÍNUO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE PLANO DE CAPACITAÇÃO DA SITE - ANO 2025 VERSÃO 1.0														
ITEM	PRIORIDADE	CURSO	OBJETIVOS resumo	JUSTIFICATIVA resumo	PÚBLICO ALVO (SETOR)	QUANTIDADE DE SERVIDORES	CARGA HORARIA	MODALIDADE/LOCAL EAD/Presencial	MODO DE CONTRATAÇÃO Contratação P./Instituição interna	DESPESAS COM INSCRIÇÃO /INSTRUTOR (por pessoa)	DESPESAS COM DIÁRIAS (por pessoa)	DESPESAS COM PASSAGENS (por pessoa)	CUSTO TOTAL INDIVIDUAL	TOTAL DA DESPESA
1	7	Extreme Fabric: Installation & Configuration (EAD 04-06/11/2024 e 28-30/12/2025)	Capacitar servidores da SRI para implantar configuração e gerenciar de switches e aprimorar habilidades técnicas, garantir a segurança da informação e aumentar a eficiência operacional da infraestrutura de rede.	Essa capacitação permitirá uma melhor gestão e resolução de problemas, contribuindo para a modernização da infraestrutura de redes.	SRI	1	24	EAD	Contratação	R\$ 12.827,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.827,62	R\$ 12.827,62
2	1	Kubernetes Orquestração de ambientes escaláveis	Capacitar o servidores da COSIS e da CONIF para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes	Capacitar o servidores da COSIS para implantar sistemas em ambiente clusterizado e escalável gerenciado pela plataforma Kubernetes	SDS/SBDs/SMT/SRI	14	40	EaD	Contratação	R\$ 1.099,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.099,00	R\$ 15.386,00
3	3	Gestão de Serviços com GLPI	Utilizar o Sistema Atendimento STIE (GLPI) na sua plenitude, como forma de melhoria da qualidade do atendimento aos usuários da JERN	Nenhum dos servidores lotados atualmente na SMI participou de treinamento de GLPI como usuário avançado	SMI	5	24	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 1.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.900,00	R\$ 9.500,00
4	6	Gestão de Segurança da Informação	Identificar os principais pontos da ISO 27001, 27002 e 27701. Destacando o modelo PDCA para planejamento e implementação, a verificação de conformidade com legislações e normas, e questões relacionadas à auditoria. Discutir a gestão e avaliação de riscos, aceitação e tratamento desses riscos, além da infraestrutura organizacional necessária. Abordar a segurança de ativos, controles de acesso, gestão de recursos humanos.	Capacitar servidores da CONIF em gestão da segurança da informação e essencial para o TIRE RH, pois vai qualificar os servidores a identificar e mitigar riscos, garantindo a proteção de dados pessoais. A atualização em normas como ISO 27001 fortalece a conformidade legal e a confiança pública. Assim, promove um ambiente mais seguro e eficiente para as operações do Tribunal	CONIF/SSI	2	40h	EaD	Contratação	R\$ 1.920,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.920,00	R\$ 3.840,00
5	5	Cibersegurança	Configurar e implementar ferramentas que possam aumentar a segurança de um ambiente computacional, analisar e interpretar dados para identificar pontos fracos e ameaças, impedir ataques e executar recuperação de desastres	Qualificar os servidores da SSI para serem capazes de utilizar e aplicar inteligência proativa contra ameaças para apoiar a segurança organizacional e realizar atividades de gerenciamento de vulnerabilidade, aplicar soluções de segurança para gerenciamento de infraestrutura e explicar as melhores práticas de garantia de software e hardware, analisar dados como parte das atividades de monitoramento de segurança contínuas e implementar alterações de configuração nos controles existentes para melhorar a segurança, utilizar procedimento de resposta a incidentes apropriado, analisar indicadores potenciais de comprometimento e utilizar técnicas forenses digitais básicas	SSI	4	40h	EaD	Contratação	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.300,00	R\$ 9.200,00
6	4	Red Hat Linux Automation with Ansible (RH294)	Capacitar os servidores da SRI para automatizar tarefas de administração de sistemas Linux com o Ansible	Necessidade de desenvolver as habilidades necessárias para gerenciar grandes quantidades de sistemas e aplicações de forma eficiente e consistente	SRI	1	32h	Presencial	Contratação	R\$ 6.400,00	R\$ 4.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 14.400,00	R\$ 14.400,00
7	2	Ivanti	Capacitar os servidores da SMI e SSI no uso da solução de Gestão de Ativos de Tecnologia da Informação e Patches	Aprofundar os conhecimentos adquiridos através do repasse tecnológico e otimizar o uso da ferramenta	SMI/SSI	8	20h	In Company	Contratação	R\$ 2.863,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.863,80	R\$ 22.910,38
8	10	GovTech Summit - Edição 2025 - Governos Inteligentes - 29 e 30/05/2025 - RS https://www.summit.com.br/summit-2025-governos-inteligentes https://govtechsummit.com.br/	Conectar os decisores do setor público a empreendedores de startups.	Para impulsionar a transformação digital, apresentar inovação e tecnologia e propor soluções que modernizem a prestação de serviços no setor público. O evento será realizado pelo GovTech Lab que é o primeiro laboratório de inovação e transformação de setores e serviços públicos.	STIE	2	16h	Presencial	Inscrição	R\$ 308,00	R\$ 2.964,00	R\$ 4.000,00	R\$ 7.272,00	R\$ 14.544,00
9	11	Semana Comp 2025 - 27 e 28 de agosto de 2025 - Brasília/DF https://compdigital.com.br/	Proporcionar o encontro de tecnologia e a gestão pública.	Promover a transformação digital, permitindo a transformação do governo e inspirando o futuro.	STIE	3	16h	Presencial	Inscrição - Servidor Público é gratuito	R\$ 0,00	R\$ 2.964,00	R\$ 3.500,00	R\$ 6.464,00	R\$ 19.392,00
10	8	Contratação de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Melhores práticas de governança de TI e atualizações trazidas pela nova Lei nº 14.133/21 e a IN 94/2022 (SGD/ME), de 23/12/22	Instrumentalizar os participantes para execução do planejamento da contratação, seleção de fornecedores e fiscalização dos contratos de serviços e bens de tecnologia da informação para o setor público.	A Instrução Normativa nº 94/2022 (SGD/ME), de 23 de fevereiro de 2023. Esta IN dispõe sobre o processo pelos órgãos integrantes do Sistema de Administração Poder Executivo Federal.	GAP/STIE/SRI/SSI/SMT	8	25h	EaD ao vivo e Online	Contratação	R\$ 2.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.490,00	R\$ 19.920,00
11	9	Plataforma Alura para servidores do GAP/STIE e da COELE para capacitar em cursos de OKR, Governança de TIC, análise de dados, linguagem Python, Google Looker Studio, Data Visualization, Apps Scripts, entre outros	A plataforma Alura permite o direcionamento do conteúdo em diferentes trilhas de aprendizado conforme a senioridade ou o tipo de conhecimento que é necessário desenvolver, garantindo assim a aderência dos servidores nas áreas específicas de atuação de cada um.	Uma plataforma que oferecer várias opções de cursos, diversificando e atendendo a todos os tipos de necessidades com o pagamento de apenas uma assinatura por servidor(colaborador) plano CORP ou através do plano mais completo CORP PLUS.	GAP/STIE - SUE, SSAE, SRI e COELE	10	20h	EaD	Contratação	R\$ 1.308,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.308,00	R\$ 13.080,00
													Total	R\$ 155.000,00
