



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

**ATA DE REUNIÃO Nº 12/2025/COGESTIC**

**1. Identificação da reunião**

<b>Data</b>	<b>Horário</b>	<b>Local</b>	<b>Responsável</b>
25/06/2025	13h às 14h	Sala da STIE - sala 209 (4º andar)	Marcos Flávio Nascimento Maia

**2. Objetivo**

2º Reunião Ordinária do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Eleições - Junho/2025

**3. Itens da pauta**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>
1.	Apresentação da modelagem do Processo de Trabalho "Criação de Processo Eleitoral Simulado"
2.	Acompanhamento do PDTIC 2025
3.	Agendar COGESTIC Julho/2025 - datas sugeridas 14/07 e 28/07

**4. Participantes**

<b>Nome</b>	<b>Setor de atuação</b>
Carlos Magno do Rozário Câmara	Secretário da STIE, em substituição COINF/STIE
Osmar Fernandes de Oliveira Junior	COSIS/STIE
Maria Teresa Farache Porto	COELE/STIE

**5. Itens de Discussão**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Responsável</b>
-------------	------------------	--------------------

1.	<p><b>Apresentação da modelagem do Processo de Trabalho "Criação de Processo Eleitoral Simulado"</b></p> <p>A Seção de Sistemas Eleitorais e Apoio às Eleições (SSAE/COELE/STIE) apresentou novamente a modelagem do processo de "Criação de Processo Eleitoral Simulado", que ocorre eventualmente quando há a necessidade de configuração de uma eleição simulada, como, por exemplo, para testes do JE Connect. O processo havia sido apresentado no COGESTIC de , mas, com a necessidade de ajuste da ferramenta de modelagem, para adequar-se à norma da casa, o processo foi novamente apresentado, desta vez, modelado no Bizági e com os ajustes que haviam sido solicitados. Foi registrada ainda nova observação para incluir o documento final, representando a entrega da criação do processo, registrando quais informações são repassadas ao solicitante. O processo foi aprovado pelos presentes e o seu fluxo consta como anexo 1 desta ata. Como o processo é interno, não faz parte da cadeia de valor.</p>	Theresa Padilha
2.	<p><b>Acompanhamento do PDTIC 2025</b></p> <p><u>Plano de Demandas Internas 2025 - v.4.0, em elaboração</u> O Plano de Demandas Internas v.3.0 foi aprovado no CGOVTIC em 17/06/2025, encontrando-se vigente. Assim, o acompanhamento do mês de junho já será feito na versão 4.0, em elaboração. A nova versão do PDI teve o acréscimo de duas colunas (início real e encerramento final) para registro das datas efetivas de execução das demandas. As coordenadorias atualizaram os status do andamento das demandas e foram aprovados os ajustes dos prazos. O acompanhamento do PDI foi realizado pelos participantes, conforme consta no Anexo 2 desta ata.</p> <p><u>Plano de Contratações e Soluções de TIC 2025 - v.4.0, em elaboração</u> O Plano de Contratações e Soluções v.3.0 foi aprovado no CGOVTIC em 17/06/2025, encontrando-se vigente. A nova versão do Plano de Contratações teve o acréscimo de várias colunas para registro dos dados solicitados pelo iGovTIC, bem como, para lançamentos dos dados de orçamento solicitados pelo Guia de Contratações de TIC do CNJ. O acompanhamento mensal do Plano de Contratações consta como Anexo 3 desta ata.</p> <p>Ainda sobre as contratações de TIC, verificou-se que as especificidades da fase de planejamento das contratações de TIC e as alterações do Guia CNJ de contratações ensejam uma atualização mais constante dos artefatos, fazendo com que a unificação com o planejamento das contratações administrativas dificulte mais do que facilite. Assim, será proposta a criação de um Grupo de Trabalho para propor revisão da modelagem, separando as contratações de TI das administrativas. A SAOF indicou Betânia, Herman e Ernesto como componentes. Na reunião, estabeleceu-se que pela STIE serão indicados Jussara, Carlos André, Denilson e Daniel.</p>	Todos os participantes

3.	Agendamento das reuniões do COGESTIC para o mês de julho  Foram agendas as seguintes reuniões ordinárias: 1º COGESTIC julho/2025 - 14.07.2025 2º COGESTIC julho/2025 - 28.07.2025	Carlos Magno
----	---	--------------

## 6. Pendências

Não há pendências

Item	Pendência	Data limite	Responsável
------	-----------	-------------	-------------

## 7. Observações

Registre-se a participação dos servidores do GAPSTIE, Jussara Borba Diniz e Carlos André, e dos servidores da SSAE, Theresa Padilha e Sérgio, para apresentação da modelagem do processo.

## 8. Fechamento da Ata

Data	Secretário(a)
25/06/2025	Jussara de Gois Borba Melo Diniz

## ANEXO(S)

Anexo 1 - Fluxo do processo "Criação de Processo Eleitoral Simulado" 2359482

Anexo 2 - Plano de Demandas Internas 2025, acompanhamento mensal 2359485

Anexo 3 - Plano de Contratações e Soluções de TIC 2025, acompanhamento mensal 2359490



Documento assinado eletronicamente por **Jussara de Gois Borba Melo Diniz**, **Secretário(a) do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em substituição, em 26/06/2025, às 09:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Osmar Fernandes de Oliveira Júnior**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 26/06/2025, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.




Documento assinado eletronicamente por **Maria Teresa Farache Porto**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 26/06/2025, às 12:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.





Documento assinado eletronicamente por **Carlos Magno do Rozario Camara**, **Membro do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação**, em 20/08/2025, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&cv=2358712&crc=F7BA0408](https://sei.tre-rn.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2358712&crc=F7BA0408) informando, caso não preenchido, o código verificador **2358712** e o código CRC **F7BA0408**.

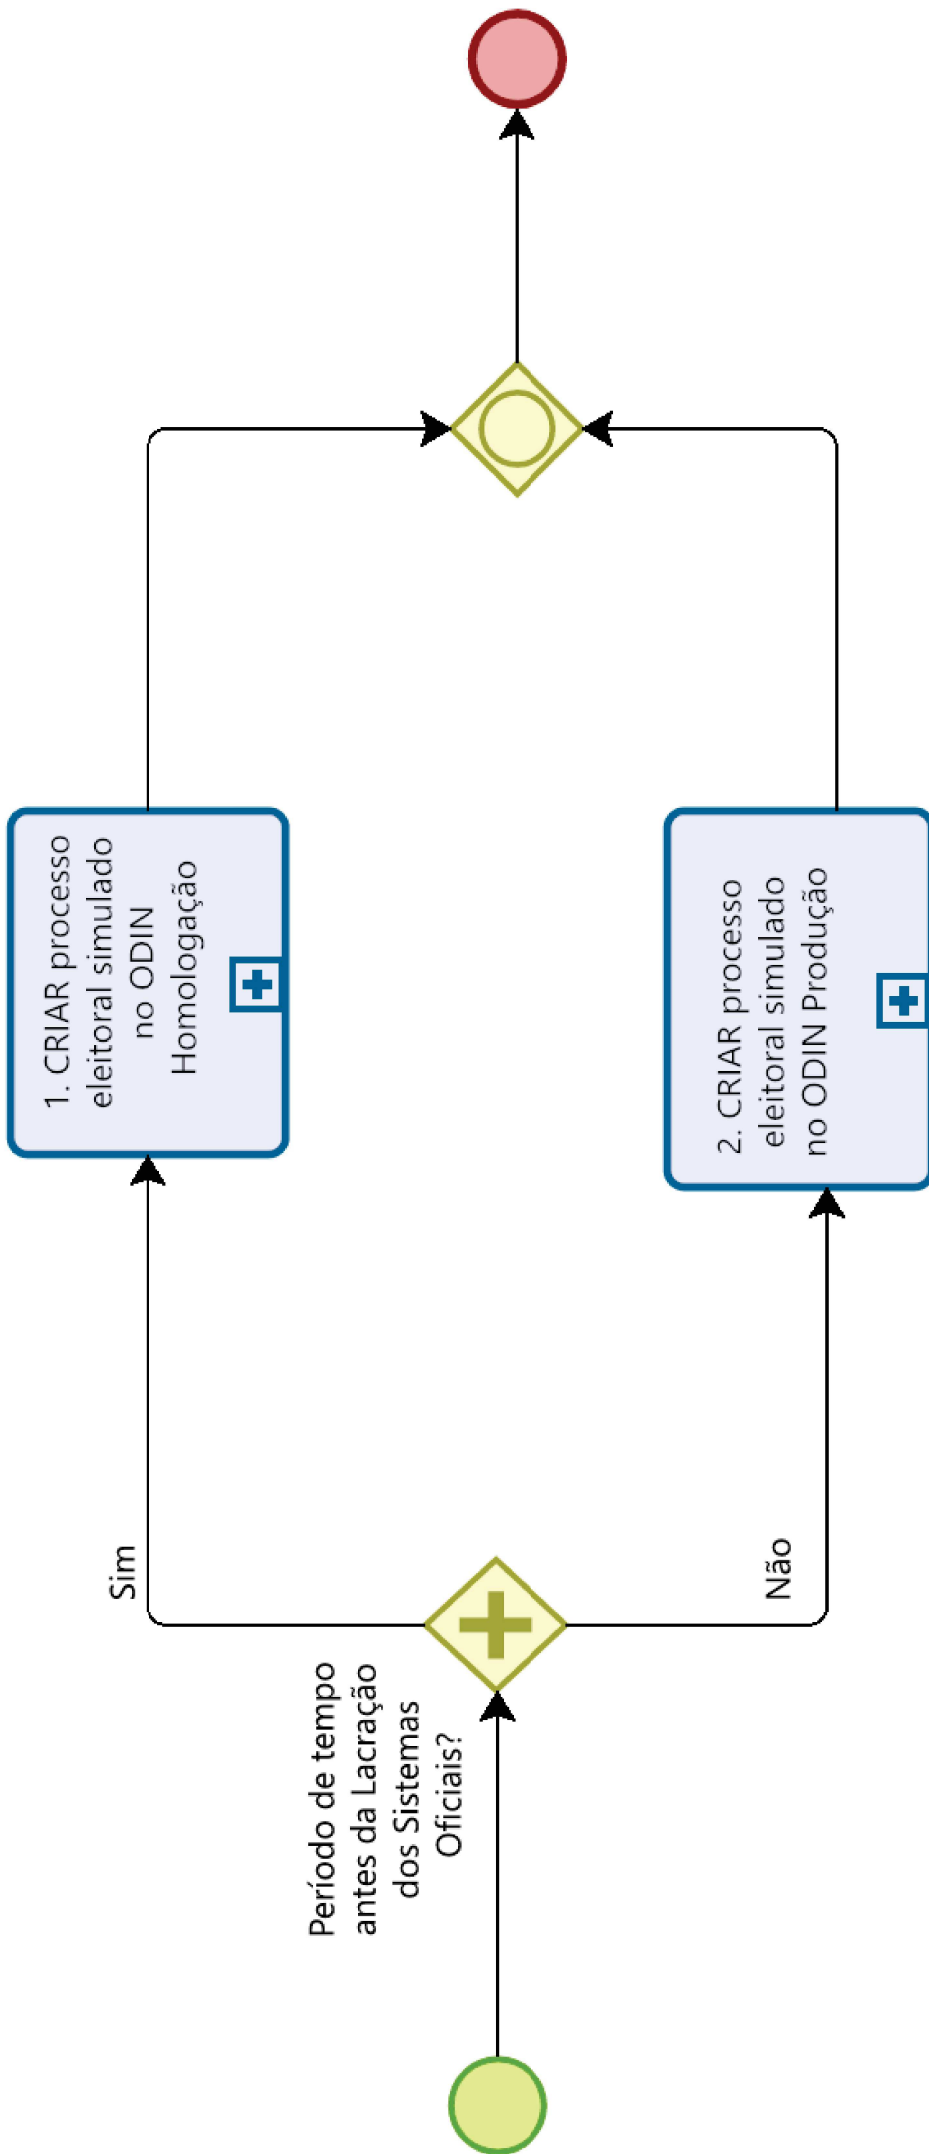

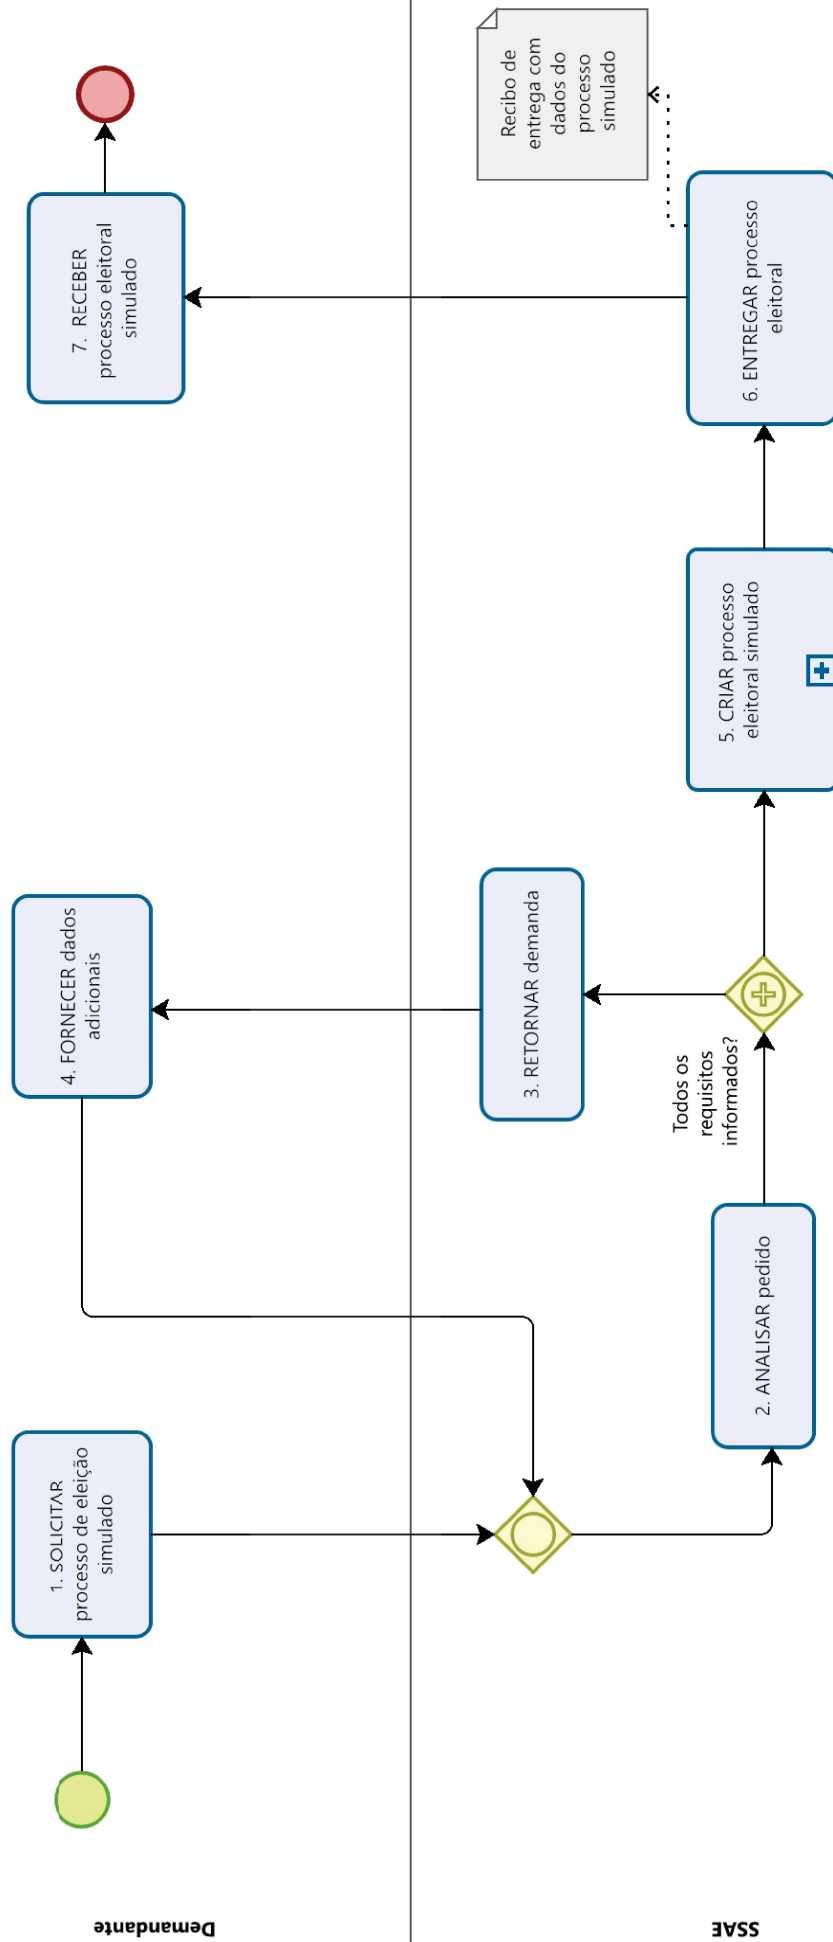

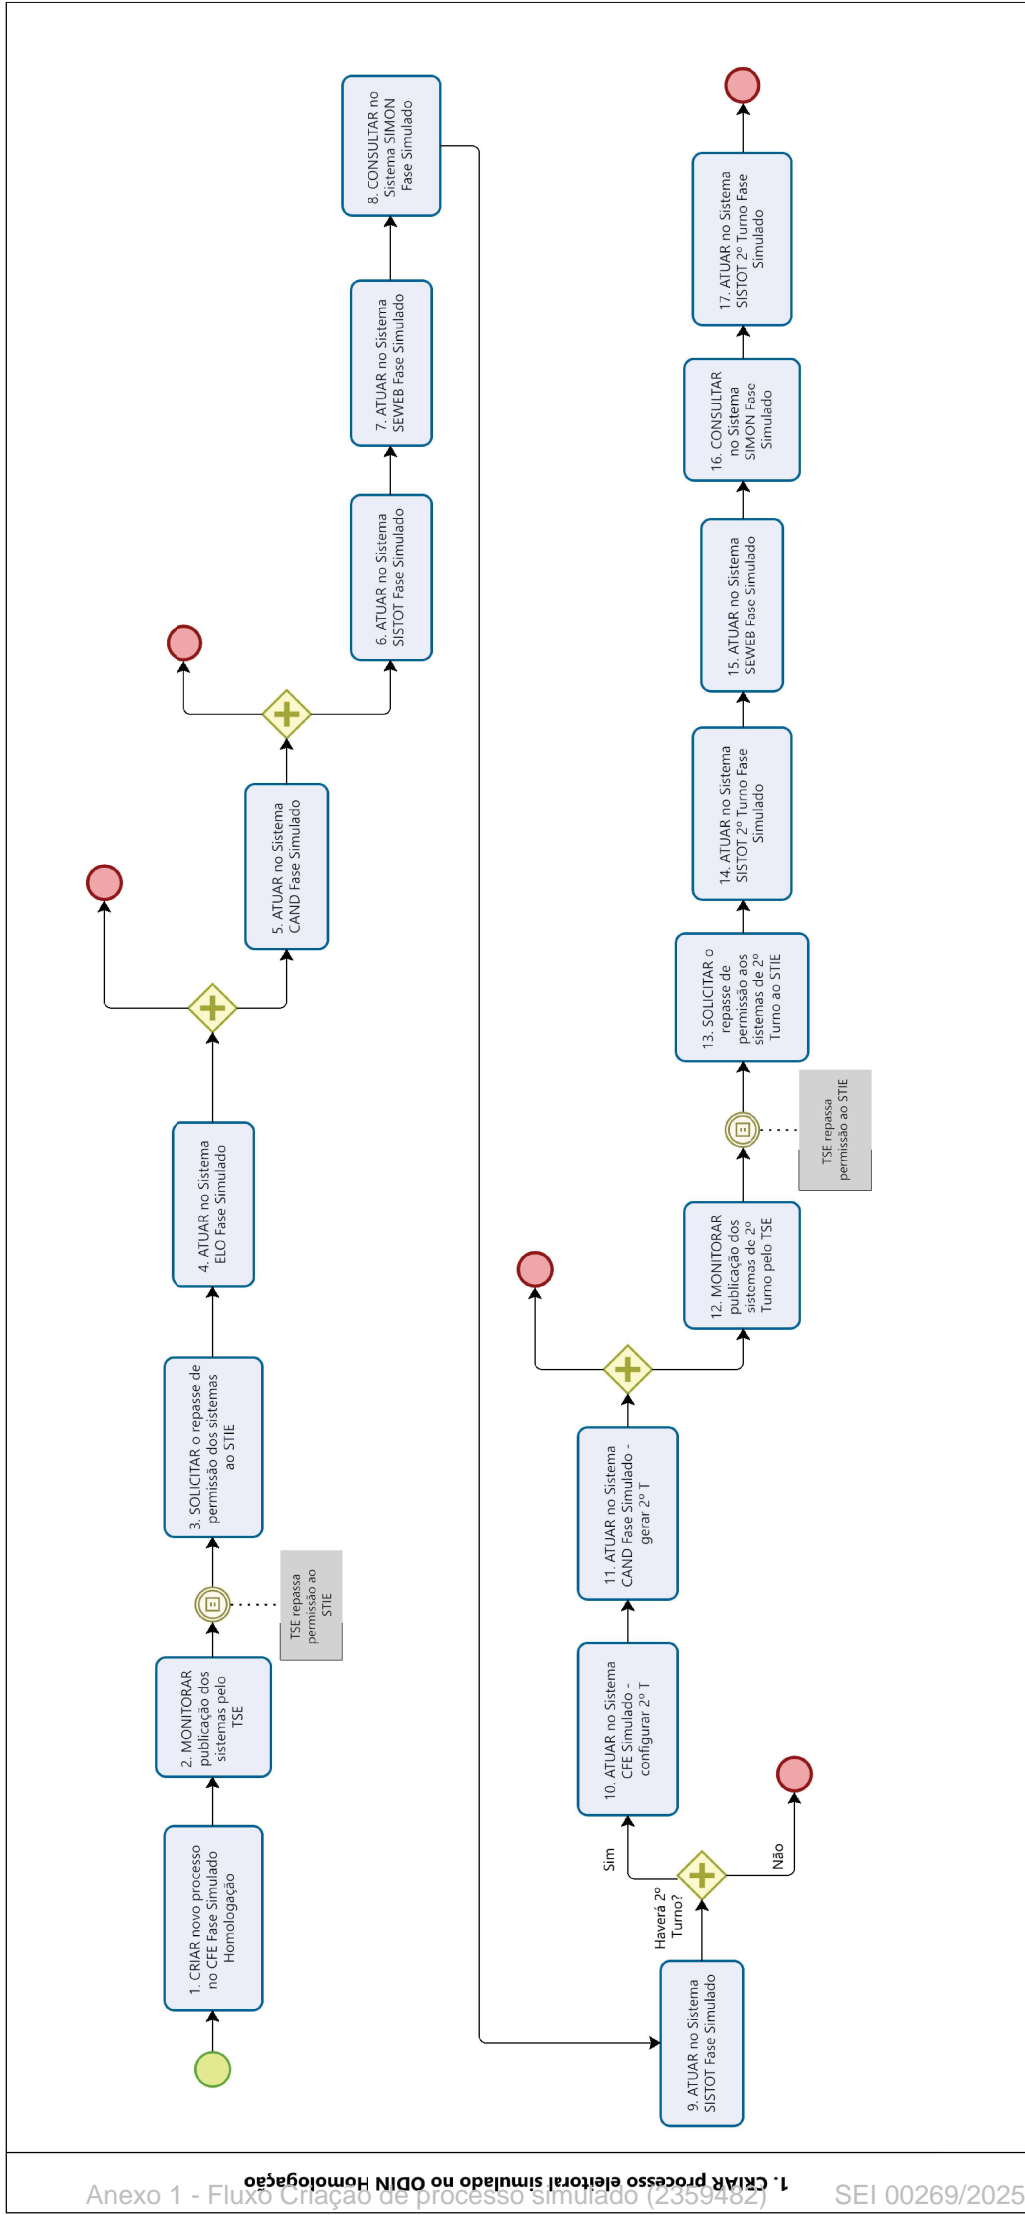





TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025 VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO - acompanhamento do mês de junho/2025													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
ANO	ITEM	CÓDIGO ID DA AÇÃO	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/PROCEDIMENTO	DEMANDANTE/ ÁREA RELACIONADA	RESPONSÁVEL	OBJETIVO PEJERN 2021/2026	INÍCIO PLANEJADO	TÉRMINO PLANEJADO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL	SITUAÇÃO	% PROJETO	OBSERVAÇÕES	RESULTADOS/EVIDÊNCIAS
2025	1	2025-001-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2026	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2026, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2025/08	2025/11			Não iniciada	0		
2025	2	2024-000-GAPSTIE-GEST	Consolidar o PDTIC 2025	Consolidar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Norte para 2025, a partir das decisões do COGESTIC, incluindo seus respectivos planos de ações de demandas internas (PDI), de capacitação, de contratações e da Entic-JUD, além de manter os objetivos táticos, indicadores e metas estabelecidos.	COGESTIC	GAPSTIE	PI3	2024/08	2025/02	2024/08	2025/02	Concluída	100%		O PDTIC foi aprovado pelo CGOVTIC em 27.02.2025 Link da <a href="#">Portaria 80/2025-GP</a> Link da publicação do <a href="#">PDTIC</a>
2025	1	2024-008-COINF-INFR	Ilhas de impressão	Implantação do projeto de ilhas de impressão, que consiste em diminuir as impressoras por unidade, concentrando-as em determinados locais de impressão, tendo em vista a diminuição da demanda, como decorrência da consolidação dos processos administrativos e judiciais eletrônicos.	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/03	2025/06 2025/08			Em andamento	90%		
2025	2	2024-010-COINF-INFR	Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AT8	2024/10	2025/06			Em andamento	80%	Fase de Planejamento: DOD e ETP elaborados - necessidade de ajustes no ETP conforme orientação da SETEC	
2025	3	2025-005-COINF-INFR	Ampliação da estrutura de monitoramento das soluções de Segurança Cibernética, com integração de dashboards e acompanhamento em tempo real	Integração dos alertas gerados pelas soluções implantadas de Segurança Cibernética (dashboards)	SSI/COINF/STIE	SSI/COINF/STIE	AC3	2025/01	2025/06 2025/08			Em andamento	80%		
2025	4	2025-004-COINF-INFR	Manutenção preventiva e acréscimo do equipamentos de TIC nas ZEs	Manutenção preventiva dos ativos de TI das Zonas Eleitorais, incluindo a adição de equipamentos de TI	SMI/COINF/STIE	SMI/COINF/STIE	AT8	2024/06 2025/07	2025/08			Não iniciada			
2025	5	2025-001-COINF-INFR	Ampliação rede WIFI ( instalação e configuração)	Instalação de equipamentos tipo access point para viabilizar a ativação de uma rede sem fios com acesso à internet nas Centrais de Atendimento com box do TRE-RN	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/04	2025/12			Em andamento	20%		
2025	6	2025-003-COINF-INFR	Ampliação e atualização da infraestrutura de servidores do site backup no COJE ( instalação e configuração)	Instalação e configuração de servidores de rede tipo Nutanix para substituição dos atualmente instalados no COJE para manter o parque atualizado e com garantia e suporte	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/04	2025/09			Em andamento	30%		
2025	7	2025-002-COINF-INFR	Ampliação e modernização do parque de Switches dos cartórios do interior ( instalação e configuração)	Instalação e substituição de switches PoE nos cartórios do interior, pois os atuais já estão em uso há mais de 10 (dez) anos e fora da garantia, implementando monitoramento em tempo real do tráfego de rede	SRI/COINF/STIE	SRI/COINF/STIE	AC3	2025/06	2025/09			Não iniciada			
2025	1	2023-004-COSIS-SIST	Migração do ambiente de homologação de sistemas para o Kubernetes	Migração de todas as aplicações containerizadas implantadas no ambiente do homologação da SBDS para a infraestrutura Kubernetes disponibilizada pela SRI	COSIS/STIE	SBDS	AC3.3	2023/04	2025/03			Em andamento	90%	<b>Março/25:</b> - Projeto continua sem avanços em virtude do foco no projeto de migração dos processos SEI (2023-018-COSIS-SIST); - Também ainda não houve uma definição sobre a continuidade de uso da Suite iPleno (SEI 07445/2024) <b>Outubro/24:</b> - Definido que o Atena não será migrado para o Kubernetes <b>Agosto/24:</b> - Migrados sistemas e-Social, JE-Reinf - Faltando apenas Moodle, Atena e Suite iPleno; obs.: Atena tende a não ser migrado devido a alta complexidade da sua arquitetura; Suite iPleno aguarda decisão de continuidade de uso (SEI 07445/2024)	
2025	2	2022-036-COSIS-SIST	Processo de Requisição de Servidores	Automação do processo de requisição de servidores.	SGAE/SGP	SDS	AC4.1	2023/05	2025/03			Concluída	100%	<b>Março/25:</b> A SGAE homologou as alterações solicitadas no relatório SIGEPRO.	
2025	3	2020-028-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Riscos e Controles Internos, para monitoramento de projetos	AGE/PRES	SDS	PI3.4	2024/02	2025/06 2025/08			Em andamento	80%	<b>Março/25:</b> A EPOR ainda não realizou a homologação da versão disponibilizada em janeiro. <b>Junho/25:</b> Encontra-se em andamento as correções solicitadas pela EPOR.	
2025	4	2023-017-COSIS-SIST	Migração/Repasso do Gitlab	Repasso do Gitlab para administração pela SRI	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2024/05	2025/04			Em andamento	90%	<b>Março/25:</b> O repasse foi feito em 10/04/2024. A SRI ainda não finalizou a migração.	
2025	5	2021-018-COSIS-SIST	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados	Automatizar procedimentos administrativos de sistemas e banco de dados de forma a permitir que a Central STIE e usuários gerenciadores de sistemas implantados pela SBDS possam realizar, através de uma interface amigável, tarefas administrativas.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2024/05 2025/08	2025/05 2025/10			Não iniciada	0%	<b>Junho/25:</b> - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	6	2023-018-COSIS-SIST	Migração de Processos e Documentos do PAE para o SEI	Migração de todos os processos (arquivados, juntados e tramitando) para o SEI, através da API WSSEi.	COSIS/STIE	SDS/SBDS	AC4.1	2024/08	2025/04			Concluída	100%	<b>Junho/25:</b> Todos os processos foram migrados para o SEI.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES															
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025															
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO - acompanhamento do mês de junho/2025															
2025	7	2024-008-COSIS-SIST	Refatoração do Sistema Fale Conosco	Remoção de vulnerabilidade do sistema e implantação na Internet	COSIS/STIE	SDS/SBDS	AC4.1	2024/10	2025/02			Concluída	100%	Dezembro/24: Já foram realizadas as adaptações no sistema, assim como realizada análise de vulnerabilidades, conforme SEI 04650/2024. Resta pendente a implantação na infraestrutura Kubernetes.  Janeiro/25: A SBDS já implantou a versão no Kubernetes.	
2025	8	2024-011-COSIS-SIST	Migração do sistema de agendamento para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/01	2025/03			Concluída	100%		
2025	9	2022-035-COSIS-SIST	Revisão do processo de desenvolvimento de sistemas (BPMN) para inclusão das fases de testes de invasão	Atualização da modelagem de desenvolvimento de sistemas visando a inclusão de testes de invasão.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06 2025/08			Em andamento	30%	Março/25: - Processo ainda não modelado.  Junho/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024.	
2025	10	2022-037-COSIS-SIST	Definição e padronização do processo de testes de invasão a ser utilizado nos sistemas desenvolvidos pela SDS	Estudo e definição de estratégias de testes sistematizados, visando melhorias de segurança no processo de desenvolvimento de sistemas.	SSI/COINF/STIE	SDS	AC3.1	2025/01	2025/06 2025/08			Em andamento	30%	Março/25: Processo ainda não modelado.  Junho/25: Aguardando informação da SSI no SEI 11522/2024.	
2025	11	2024-013-COSIS-SIST	Omnichannel institucional	Organizar a estrutura do omnichannel para uso institucional	OUVIDORIA	SNT	AC4.1	2025/01	2025/06 2025/09			Não iniciada	0%	PORTARIA Nº 159/2025/DG. Institui o Grupo Gestor do Canal de Atendimento (GGCA)	
2025	12	2020-085-COSIS-SIST	Criação de um ambiente Postgres com replicação e backup	Utilização do Postgres em ambiente de homologação e produção.	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/01	2025/09			Não iniciada	0%	Março/25: - Projeto não iniciado em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Dezembro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Outubro/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.  Abril/24: - Datas ajustadas em virtude das demandas prioritárias da unidade.	
2025	13	2024-012-COSIS-SIST	Migração do sistema de dados do servidor para o Kubernetes	Migração de sistemas para diminuir dependências da infraestrutura	SNT/COSIS/STIE	SNT	AC4.1	2025/02	2025/06 2025/08			Em andamento	40%	Migrodo o SIGA e o sistema de Agendamento para Kubernetes	
2025	14	2025-001-COSIS-SIST	Instalação do Oracle Enterprise Manager Cloud Control	Instalar o Enterprise Manager Cloud Control (plataforma de gerenciamento on-premises da Oracle) para gerenciamento e monitoramento dos ambientes de banco Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC4.1	2025/02	2025/06			Em andamento	26% 80%	Março/25: - Finalizada a instalação na RN24 - Foram iniciados os estudos na ferramenta para que sejam criados os monitoramentos	
2025	15	2024-009-COSIS-SIST	Desenvolvimento de Solução de LGPD	Desenvolvimento de Solução de LGPD em parceria com o TRT 21 Região	COSIS/STIE	SDS/SNT	AC4.1	2025/03	2025/12			Em andamento	20%	Março/25: Iniciado a implementação do backend de negócio. (SDS) Iniciada a implementação do frontend (SNT)  Junho/25: Encontra-se em processo de finalização e homologação do módulo 1 de 10 (backend e frontend).	
2025	16	2024-014-COSIS-SIST	Acompanhamento PCAS	Sistema para acompanhamento da comprovação de gastos com PCAS	SGB	SDS	AC4.1	2025/04	2025/09			Em andamento	15%	Junho/25: Realizadas 3 reuniões para levantamento de requisitos e validação de protótipos com a SGB. Iniciado o desenvolvimento do backend e dos serviços de integração com o SGRH.	
2025	17	2025-002-COSIS-SIST	Implantação do sistema MIA - Módulo de IA do SEI	Módulo de IA que faz resumo de documentos e processos no SEI	CGS	SBDS		2025/07	2025/09			Não iniciada	0%		
2025	18	2023-012-COSIS-SIST	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	Melhorias evolutivas no Sistema de Gestão de Urnas.	SUE/COELE/STIE	SDS	PI4.1	2025/10	2026/03			Não iniciada	0%	Julho/24: - Este projeto foi adiado para o ano seguinte, devido à priorização dos sistemas, conforme SEI 3615/2024.	
2025	19	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03			Não iniciada	0%		
2026	20	2022-008-COSIS-SIST	Análise de ferramentas profissionais para autenticação e autorização em sistemas web	Análise de ferramenta Keycloak, em virtude da detecção recente de vulnerabilidades no SCA.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.1	2025/10	2026/03			Não iniciada	0%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em decorrência de outras demandas de maior prioridade no setor.	
2026	21	2020-037-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 1	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	40%	Outubro/24: - O desenvolvimento será priorizado para o 1º semestre de 2025.	
2026	22	2024-010-COSIS-SIST	Projeto eMag	Projeto piloto de sistema definido na ação R10.2 com usuário com deficiência visual/auditiva	COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/01	2026/06			Não iniciada	0%	Março/25: Não temos nenhum desenvolvedor livre para iniciar este projeto no momento.	
2026	23	2024-015-COSIS-SIST	Revisão da arquitetura de desenvolvimento de sistemas	Revisão da arquitetura e aplicação de temas Premium no modelo de desenvolvimento da SDS.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/04	2026/09			Não iniciada	0%		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO - acompanhamento do mês de junho/2025															
2026	24	2020-040-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 3	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/06	2026/12			<div>Não iniciada</div>	0%		
2026	25	2023-019-COSIS-SIST	Bot para integração com SGRH	Desenvolvimento de bots para integração com sistemas legados	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12			<div>Não iniciada</div>	0%	Janeiro/24: - A demanda será conduzida pelo servidor George, com o apoio de Marcelo na infraestrutura.	
2026	26	2020-038-COSIS-SIST	Desenvolvimento do Sistema de Suprimento de Fundos - ETAPA 2	Possibilitar o gerenciamento e controle das diversas etapas dos processos relacionados a suprimento de fundos no âmbito do TRE-RN.	SAOF	SDS	AC4.1	2026/07	2026/12			<div>Não iniciada</div>	0%		
2026	27	2026-001-COSIS-SIST	Automação dos processos da SAMS	Desenvolvimento de processos automatizados via Workflow para a SAMS: - Tratamento da própria saúde - Doença em pessoa da família  Será necessário o desenvolvimento de bots para integração ao SGRH.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC4.1	2026/10	2027/3			<div>Não iniciada</div>	0%	Março/25: A demanda chegou via SEI 10837/2019.	
2025	1	2024-014-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Sustentabilidade	Manutenção dos painéis de BI ligado à área de sustentabilidade.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	PI5.5	2024/07	2025/03			<div>Em andamento</div>	90%	Outubro/24: - O escopo do projeto está sendo revisito pela equipe da Residência.  Julho/24: - Em processo de reparação, problemas com as fontes de dados são o maior empecilho. - Reorganizando fontes de dados	
2025	2	2024-012-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos de 1º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	AGE/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/11	2025/03			<div>Pausada</div>	50%	Março/25: - Residente responsável encerrou contrato - Aguardando fim de outro projeto para alocação desse  Outubro/24: - O escopo do projeto foi alterado pela área negocial, e outros indicadores serão implementados.  Julho/24: - Feita a ingestão do DL1. - Pendente contato com o cliente, a CRE mencionou que o cliente na verdade é a AGE.	
2025	3	2024-023-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Acompanhamento de Contratos	Implementação de painel de BI ligado à SAOF visando o acompanhamento dos contratos de nosso Regional.	SAOF	RESIDÊNCIA	AC5.1	2024/12	2025/03			<div>Em andamento</div>	30%	Outubro/24: - Ajuste de datas em virtude do ingresso de demandas relacionadas às Eleições	
2025	4	2024-005-RES4-BI	Ajustes Evolutivos na Infraestrutura de BI	Implementação de ajustes e melhorias na infraestrutura utilizada pelos projetos de BI da Residência.	COSIS/STIE	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06			<div>Em andamento</div>	80%	Outubro/24: - A continuidade do projeto será avaliada até o final do ano, e caso o mesmo prossiga, a sua entrega ocorrerá ao final da Residência.  Junho/24: - Implementado o CI/CD até 'validação' - Resolução de bugs - Criado ferramentas de acompanhamento dos painéis ( BIGestão, BIMonitor) - Criado API de dados, para consumo de dados do Data Lake - Ferramente Web de exploração de dados ( em desenvolvimento ) - Estudo de viabilidade de implantação do Spark no kubernetes ( finalizado )	
2025	5	2024-010-RES4-BI	Sustentação de Painéis e de Arquitetura de BI	Ajustes evolutivos e/ou corretivos em painéis de BI que se encontrem em ambiente de produção.	TRE-RN	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/02	2025/06			<div>CONTÍNUO</div>		Junho/24: - Manutenção feita nos painéis do BISAOF, projeto PDI Orquestrador	
2025	6	2024-009-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Advogados	Implementação de painéis de BI apresentando a atuação por advogado em processos do 1º e 2º Graus.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01			<div>Concluída</div>	100%	Março/25: - Entregue, aguardando homologação do cliente  Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Junho/24: - Projeto finalizado, passando por testes em validação e homologação	
2025	7	2024-008-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Indicadores Estratégicos do 2º Grau	Refatorar os indicadores estratégicos 2021-2026 implementados.	SJ	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/03	2025/01			<div>Concluída</div>	100%	Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Julho/24: - Painél pronto, aguardando ser implantado no Gateway e compartilhado com o cliente para homologação.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS			
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES														
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025														
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO - acompanhamento do mês de junho/2025														
2024	8	2024-007-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Dados de Pessoal para envio ao CNJ	Implementação de painel de BI ligado à ao Gabinete da SGP para envio mensal de informações de servidores para o CNJ	SGP	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/07	2025/01		Concluída	100%	Março/25: - Projeto entregue, em revisio por Jeferson  Outubro/24: - Projeto em fase de homologação pela área negocial  Julho/24 - Projeto realocado para Elder (em processo de apropriação da solução)  Outubro/24: - Projeto em fase final de desenvolvimento. Em breve será enviado para homologação pela área negocial.  Março/25: - Restando a reunião de entrega e implantação no ambiente de produção.	
2024	9	2024-025-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Passagens	Implementação de painel de BI ligado à área de Transportes da SAOF contendo informações sobre as PASSAGENS utilizadas pelos servidores.	SETRAN/COPAT/SAOF	RESIDÊNCIA	AC4.1	2024/08	2024/12		Concluída	100%		
2024	10	2024-026-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Comunicação	Implementação de painel de BI para acompanhamento das atividades realizadas no âmbito da ASCOM	ASCOM/PRES	RESIDÊNCIA	AC4.1	2025/04	2025/06		Não iniciada	0%		
2025	11	2025-001-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Escola Judiciária Eleitoral	Implementação de painel de BI para publicação das atividades associadas à área de cidadania da Escola Judiciária Eleitoral.	EJE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03		Concluída	100%		
2025	12	2025-002-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Plano de Contratação Anual	Atualização do painel de BI para gestão do Plano de Contratação Anual	SAOF/COLIC	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03		Concluída	100%		
2025	13	2025-003-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Gabinete da STIE	Atualização dos painéis de BI para publicação das atividades de Gestão do Gabinete da STIE	STIE/GAPSTIE	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/03		Em andamento	90%		
2025	14	2025-004-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Resultado de Eleições	Implementação de painéis de BI para publicação dos resultados de eleições sob os critérios solicitados ao TRE, em complementação aos dados disponibilizados pelo TSE.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06		Concluída	100%		
2025	15	2025-005-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Planejamento das Eleições	Implementação de painéis de BI para gestão e publicação do planejamento das eleições.	STIE/COELI	RESIDÊNCIA		2025/01	2025/06		Em andamento	80%		
2025	16	2025-006-RES4-BI	Desenvolvimento de Painéis de BI: Assessoria de Integração	Implementação de painel de BI para gestão dos colegiados	ASSINT	RESIDÊNCIA		2025/03	2025/03		Concluída	100%		
2025	1	2023-011-COELE-LOG	Revisar o processo de trabalho "Eleições Suplementares "	Revisar o atual Manual Eleição Suplementar, utilizando a ferramenta Bizagi, ajustando alterações nas atividades administrativas e nos trâmites processuais envolvidos no processo.	COELE	COELE	PI4	2023/08	2025/06 2025/07		Em andamento	40%	Conclusão das reuniões para a modelagem geral (1º desenho). Agendando reuniões com as unidades para descrição das atividades dos subprocessos.	Reuniões sobre a modelagem na STIE no SATAS 2023. Oficialização da modelagem no SEI 384/2025 Atas das reuniões SEI 1620/2024
2025	2	2024-001-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos"	COELE	SPLE	PI4	2024/01	2025/08		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN	
2025	3	2024-006-COELE-LOG	Análise de riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Identificar, analisar, avaliar, priorizar, comunicar e monitorar os riscos do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	COELE	COELE	PI4	2024/03	2025/06 2025/08		Em andamento	10%	Estudo da ferramenta de análise de riscos do TRE/RN	
2025	4	2025-007-COELE-LOG	Manual de Suporte Técnico	Elaborar o manual de suporte técnico englobando as técnicas e ferramentas de suporte a serem utilizadas por cada unidade da COELE nos mais diversos períodos e eventos.	COELE	COELE	PI4	2025/01	2025/06 2025/08		Não iniciada			
2025	5	2025-019-COELE-LOG	Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção preventiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	2025/02	2025/04 2025/05		Concluída	100%	Enviados por e-mail ao GAPSTIE os arquivos contendo as modelagens de manutenção preventiva e manutenção corretiva.	
2025	6	2025-024-COELE-LOG	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI"	Revisar a modelagem do processo de trabalho "Elaboração do Plano Integrado das Eleições - PIELEI", utilizando a metodologia ÁGIL do Escritório de Processos do TRE/RN	STIE	COELE	PI4	2025/02	2025/06 2025/10		Não iniciada		Necessidade de revisão diante da nova estratégia de planejamento das Eleições, constante da Portaria nº 41/2025 - DG	
2025	7	2025-014-COELE-LOG	Proposta Orçamentária de Pleitos	Elaboração da Proposta Orçamentária de Pleitos para as Eleições 2026	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/04		Concluída	100%	Data limite para levantamento junto às unidades pela SPLE (24/03). Falta analisar detalhadamente o preenchimento da planilha e fazer ajustes, se necessário.	
2025	8	2025-016-COELE-LOG	Plano de Contratação de Pleitos	Elaboração do Plano de Contratações de Pleitos de 2026 e envio à SAOF.	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/04 2025/06		Em andamento	90%	Fechando com algumas unidades as datas limites para entrega dos produtos ou início dos serviços, assim como dos artefatos (DOD, ETP e TR). Foi concluída a modelagem na ferramenta oficial (Bizagi). Aprovada no COGESTIC de 25.06.2025.	
2025	9	2025-022-COELE-LOG	Simulados	Modelar o processo de trabalho "Simulados"	COELE	SSAE	PI4	2025/03	2025/05		Concluída	100%		
2025	10	2025-013-COELE-LOG	Solução de apoio ao Planejamento das Eleições	Estudar e apresentar proposta de solução para apoio ao Planejamento das Eleições, de forma a ofertar às unidades da Secretaria do Tribunal e às Zonas Eleitorais de todo o Estado uma visualização sistemática de todas as atividades relativas aos processos eleitorais, sejam eles ordinários, suplementares ou comunitários, a fim de que tenha-se um registro histórico das atividades que integram uma eleição.	COELE	SPLE	PI4	2025/03	2025/06 2025/08		Em andamento	10%	Reunião de apresentação da ferramenta utilizada pelo TRE/MA (SIGGO ELEIÇÕES, alterado para PRISMA), no dia 11/04/2025, com a participação da SPLE, SUE e SSAE, com o objetivo de analisar se essa solução é viável de ser adotada no TRE/RN.	
2025	11	2025-008-COELE-LOG	Manual das Eleições Gerais	Elaborar o manual das Eleições Gerais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/03	2025/10		Não iniciada			
2025	12	2025-012-COELE-LOG	PIELEI 2026	Elaboração do Planejamento das Eleições 2026, com todas as diretrizes da próxima eleição geral.	COELE	COELE	PI4	2025/03	2025/10		Em andamento	30%	Com base na modelagem anterior, fazer as adequações para a metodologia adotada para 2026 _ port. DG 41/2025	
2025	13	2025-020-COELE-LOG	Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	Modelar o processo de trabalho "Manutenção corretiva das urnas eletrônicas	COELE	SUE	PI4	2025/04	2025/05		Concluída	100%	Enviados por e-mail ao GAPSTIE os arquivos contendo as modelagens de manutenção preventiva e manutenção corretiva.	Modelagens de manutenção preventiva e de manutenção corretiva das urnas eletrônicas enviadas por e-mail ao GAPSTIE pela SUE no dia 07/05/2025.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE											ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS					
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES																
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025																
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO - acompanhamento do mês de junho/2025																
2025	14	2025-002-COELE-LOG	Workshop do sistema ELO	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca do aprimoramento do suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	2025/04	2025/06 2025/07			Em andamento	40%	Realizada reunião - COELE, SSAE, SFAC e CRE e iniciado o desenvolvimento de formulário de c		
2025	15	2025-023-COELE-LOG	Instalações de sistemas em estações com SIS	Modelar o processo de trabalho "Instalação de sistemas em estações com SIS"	COELE	SSAE	PI4	2025/04	2025/06 2025/10			Não iniciada				
2025	16	2025-004-COELE-LOG	Workshop do sistema Mesários	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SPLE	PI4	2025/06	2025/07			Não iniciada				
2025	17	2025-005-COELE-LOG	workshop do sistema GEL	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	2025/06	2025/07 2025/08			Não iniciada				
2025	18	2025-009-COELE-LOG	Manual das Eleições Municipais	Elaborar o manual das Eleições Municipais, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/06	2025/08			Não iniciada				
2025	19	2025-011-COELE-LOG	Treinamento do sistema GEL	Elaborar o treinamento do sistema GEL para repasse às zonas eleitorais de todo o Estado, de forma remota, objetivando a sua adequada utilização para o alcance da integralidade dos locais de votação do RN georreferenciados.	COELE	SSAE	PI4	2025/08	2025/08			Não iniciada				
2025	20	2025-003-COELE-LOG	Workshop do sistema SAE	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários e no suporte técnico a ser prestado pelas unidades da COELE.	COELE	SSAE	PI4	2025/08	2025/09			Não iniciada				
2025	21	2025-006-COELE-LOG	Workshop dos sistemas de Candidatura	Estudar o sistema e seus recursos, aprimorando o conhecimento na ferramenta em busca de sugestões de melhorias na sua operacionalização/utilização pelos usuários.	COELE	SSAE	PI4	2025/09	2025/10			Não iniciada				
2025	22	2025-010-COELE-LOG	Manual das Eleições Comunitárias	Elaborar o manual das Eleições Comunitárias, englobando todas as demandas necessárias ao processo com os respectivos responsáveis.	COELE	COELE	PI4	2025/09	2025/10			Não iniciada				
2025	23	2025-015-COELE-LOG	Portal das Eleições 2026	Elaboração do Projeto de atualização do Portal das Eleições 2026 pelas unidades envolvidas, detalhando os períodos e os responsáveis pela alimentação.	COELE	SPLE	PI4	2025/10	2025/11			Não iniciada				
2025	24	2025-021-COELE-LOG	Suporte às Eleições Comunitárias	Modelar o processo de trabalho "Suporte às Eleições Comunitárias"	COELE	SUE	PI4	2025/10	2025/11			Não iniciada				
2025	25	2025-001-COELE-LOG	Aprimoramento e atualização do Curso SABER COM URNAS E SISTEMAS ELEITORAIS	Aprimorar o treinamento na plataforma EAD sobre urnas e sistemas eleitorais, mediante a atualização dos vídeos e textos produzidos sobre urnas eletrônicas e sistemas eleitorais, para treinamento dos Chefes de Cartório, Coordenadores Regionais de Suporte Técnico e Auxiliares de Eleições, com o objetivo de proporcionar maior segurança na coordenação e na execução dos procedimentos com urnas e sistemas eleitorais nas eleições oficiais.	COELE	SSAE/SUE	PI4	2025/10	2025/12			Não iniciada				
2025	26	2025-017-COELE-LOG	Simulados e Testes de Desempenho da Totalização visando o pleito de 2024	Elaborar os planos de ação de cada simulado e teste de desempenho promovido pelo TSE, definindo os participantes e os procedimentos a serem adotandos.	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir			Não iniciada				
2025	27	2025-018-COELE-LOG	Eleições suplementares	Elaborar os planos de ação de cada eleição suplementar que porventura surja ao longo do ano, detalhando os seus procedimentos, toda a logística a ser adotada, os custos e os responsáveis por cada atividade. <a href="https://docs.google.com/presentation/d/1n7btyZoHXY_3SiDJ3trKs5hmtAwew4tVLMlqYIEQ9Q/edit#slide=id.p">https://docs.google.com/presentation/d/1n7btyZoHXY_3SiDJ3trKs5hmtAwew4tVLMlqYIEQ9Q/edit#slide=id.p</a>	COELE	COELE	PI4	a definir	a definir			Não iniciada				
PAUSADAS																
2025		2020-049-COSIS-SIST	Desenvolvimento de novo portal de Intranet	Desenvolvimento de nova versão do site do TRE-RN na Intranet	COSIS/STIE	SNT	PI2.1	2020/12	2025/40 a definir			Pausada	40%	Outubro/24: - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade. Agosto/2024 - Projeto adiado Março/2024 - Projeto reaprazado em virtude da sobrecarga de demandas da unidade.		
2024		2022-031-COSIS-SIST	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools	Implantação de Ferramentas da Oracle Security Tools (TDE, Data Reduction e Database Vault) para aumentar os requisitos de segurança da informação dos bancos Oracle	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.1	2023/07	2024/44 a definir			Pausada	75%	Março/24: - Foi verificado que a implantação do Database Vault é facilitada quando se tem o Enterprise Manager Cloud Control. Dessa forma, iniciamos o projeto de instalação dessa plataforma e após a sua conclusão, retomaremos o presente projeto Junho/24: - Houve um pequeno avanço nos estudos para a implantação da ferramenta Database Vault, porém o projeto foi pausado novamente, e consequentemente reaprazado, devido as demandas relacionadas às Eleições 2024		

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE													ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS		
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E ELEIÇÕES															
PLANO DE DEMANDAS INTERNAS - ANO 2025															
VERSÃO 4.0 - EM ELABORAÇÃO - acompanhamento do mês de junho/2025															
2024		2023-007-COSIS-SIST	Atualizar mecanismos de autenticação/autorização do iPleno	Atualizar as versões dos sistemas iPleno Autenticador e do AcesSE possibilitando o login dos usuários através das credenciais de rede (LDAP)	SAP/CGPP/SJ	SBDS	AC4.1	2024/01	2024/04 a definir			Pausada	0%	Agosto/24: - Criado processo SEI (07445/2024) solicitando a descontinuidade do sistema iPleno; dessa forma, a tendência é que esse projeto perca o objeto  Junho/24: - A SAP sinalizou que após as Eleições 2024 iniciará as tratativas para utilização do PJe nas sessões plenárias; dessa forma, é interessante avaliar o cancelamento desse projeto  Abril/24: - Aguardando definição de suspensão de utilização do iPleno (passar a utilizar o PJe)  Janeiro/24: - Atividade não iniciada.	
2025		2023-005-COSIS-SIST	Alteração de infraestrutura de desenvolvimento de sistemas.	Estudo, implantação e migração da infraestrutura DevOps para utilização de cluster Kubernetes.	SDS/COSIS/STIE	SDS	AC3.3	2025/04	2025/09 a definir			Pausada	40%	Janeiro/24: - Devido à priorização dos projetos de natureza eleitoral, não será possível continuar este projeto em 2024, pois não dispomos, no momento, de nenhum desenvolvedor livre para atuação nesta demanda.	
CANCELADA															
2025		2022-030-COSIS-SIST	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle	Implantação da ferramenta DataGuard da Oracle para replicação automática dos dados para o Site Backup	SBDS/COSIS/STIE	SBDS	AC3.4	2024/04	2025/12			Cancelada	0%	Junho/25 - O Nucleus do COJE está sem garantia e portanto não tem sentido usar o DataGuard para fazer uma réplica do banco como site backup.	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																															
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025																															
VERSÃO 3.0																															
ITEM	CODIGO (PCA 2025)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	BREVE JUSTIFICATIVA	Status	PRAZO DE ENTREGA DOO	PRAZO DE ENTREGA ESTUDOS PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO	INICIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO	DATA LIMITE PARA RENOVACÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Tipos de Despesa	Segurança da Informação	SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	Versão 3.0	Diferença	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PLEJEN	SEI	Dados do Contrato	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 3.0 Atualizado em 16/06/2025	Status	Empenho a liquidar	Empenhos em liquidação	Empenhos liquidados a pagar	Empenhos pagos	Valor empenhado
1A	STI_POO_25.01A (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 07 circuitos (sendo 3 de 50, 4 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	295.683,00	295.683,00	295.683,00	264.066,89	-31.616,11	AC.3	SEI Planejamento: 803/2022 SEI Seleção de Fornecedor: 8204/2022 SEI Gestão do Contrato: 1289/2023 SEI pagamento anual: 00875/2025	Nome da empresa: INTERJATO Número do Contrato: 07/2023 Vigência do Contrato: 13.02.2023 a 13.08.2025 SEI pagamento anual: 00875/2025	Valores notas jan a abril: R\$ 123.286,36 Valores previstos de maio a agosto: R\$ 34.014,96 x 4 = R\$ 136.059,84 Previsto na vigência do contrato: R\$ 259.346,20 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - REAJUSTE CONTRATUAL - EXERCÍCIO 2024 - PROCESSO 8.E.I. Nº 1289/2023 - R\$ 2.782,39 Total: R\$ 259.346,20 + 2.782,39 = 262.128,59 [X] Controle de pagamento de contratos SRI	Contrato vigente	R\$ 297.315,46	R\$ 0,00	R\$ 6.046,92	R\$ 86.286,31	R\$ 392.431,08
1B	STI_POO_25.01B	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Interior - 07 circuitos (sendo 3 de 50, 4 de 20Mbps e 20 de 10 Mbps)	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Aguardando renovação do contrato	NA	NA	NA	NA	NA	R	13.08.2025	Custeio TIC COMRED	C	N	181.867,00	181.867,00	181.867,00	142.863,00	-39.004,00	AC.3	SEI Planejamento: 803/2022 SEI Seleção de Fornecedor: 8204/2022 SEI Gestão do Contrato: 1289/2023 SEI pagamento anual: 00875/2025	Nome da empresa: INTERJATO Número do Contrato: 07/2023 Vigência do Contrato: 13.02.2023 a 13.08.2025 SEI pagamento anual: 00875/2025	Estimativa 2025 - novo contrato: 14.08 a 31.12: 34.015,00 x 1,05 x 4 = R\$ 142.863,00	Aguardando renovação do contrato	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2A	STI_POO_25.02A (Despesa continuada)	Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	26.541,00	26.541,00	26.541,00	25.920,00	-621,00	AC.3	SEI Planejamento: 803/2022 SEI Seleção de Fornecedor: 8204/2022 SEI Gestão do Contrato: 1290/2023 SEI pagamento anual: 883/2025	Nome da empresa: SITECNET Número do Contrato: 8/2023 Vigência do Contrato: 13.02.2023 a 13.08.2025 SEI pagamento anual: 883/2025	Nome da empresa: SITECNET Nota de empenho: 2025NE000170 Estimativa 2025 - contrato vigente: 01.01 a 13.08: R\$ 3.240,00 x 8 = R\$ 25.920,00	Contrato vigente	R\$ 28.485,00	R\$ 0,00	R\$ 612,36	R\$ 12.347,64	R\$ 41.445,00
2B	STI_POO_25.02B	Estudo para continuidade do Serviço de comunicação de dados entre os prédios da Justiça Eleitoral/RN - Capital - 1 circuito de 10Gbps	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a continuidade do fornecimento da infraestrutura de comunicação de dados adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, visando adequar as necessidades cartorárias para efetivar o atendimento ao usuário com eficiência e efetividade.	Aguardando renovação do contrato	NA	NA	NA	NA	NA	R	13.08.2025	Custeio TIC COMRED	C	N	16.324,00	16.324,00	16.324,00	13.608,00	-2.716,00	AC.3	SEI Planejamento: 803/2022 SEI Seleção de Fornecedor: 8204/2022 SEI Gestão do Contrato: 1290/2023 SEI pagamento anual: 883/2025	Nome da empresa: SITECNET Número do Contrato: 8/2023 Vigência do Contrato: 13.02.2023 a 13.08.2025 SEI pagamento anual: 883/2025	Estimativa 2025: 14.08 a 31.12: R\$ 3.240,00 x 1,05 x 4 = 13.608,00	Aguardando renovação do contrato	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3A	STI_POO_25.03A (Despesa Continuada)	Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JER/N	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	8.158,00	24.476,00	24.476,00	22.199,94	-2.276,06	AC.3	SEI Planejamento: 804/2022 SEI Seleção de Fornecedor: 6127/2020 SEI Gestão do Contrato: 6127/2020 SEI pagamento anual: 923/2025	Nome da empresa: DB3 Número do Contrato: 55/2020 Vigência do Contrato: 01.10.2020 a 01.04.2023, Renovação do contrato por mais 30 meses - 01.04.2023 a 01.10.2025 (termo aditivo 01)	DB3 (antiga Fortel) Nota de empenho: 2025NE000165 Estimativa 2025: 01.01 a 01.10: R\$ 2.466,66 x 9 = R\$ 22.199,94	Contrato vigente	R\$ 9.946,21	R\$ 0,00	R\$ 2.699,76	R\$ 9.633,54	R\$ 22.279,51
3B	STI_POO_25.03B	Estudo para continuidade do Serviço de acesso à internet - Principal (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JER/N	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Fase Planejamento iniciada	NA	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	N	01.10.2025	Custeio TIC COMRED	C	N	24.476,00	8.158,00	8.158,00	8.158,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: 10448/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 7717/2024 SEI Gestão do Contrato: 1573/2025 SEI pagamento anual: 1789/2025	Nome da empresa: DB3 Número do Contrato: 55/2020 Vigência do Contrato: 01.10.2020 a 01.04.2023, Renovação do contrato por mais 30 meses - 01.04.2023 a 01.10.2025 (termo aditivo 01)	Estudo para nova contratação	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	STI_POO_25.04 (Despesa continuada)	Serviço de acesso à internet - Redundância (link dedicado de 1Gbps) - instalado na sede para atender toda a JER/N	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Viabilizar e prover a comunicação em banda larga e de alta velocidade, considerando a quantidade de usuários do TRE/RN e as crescentes demandas de serviços on-line (como VPN, webmail, processo administrativo eletrônico), bem como melhorar o desempenho de atividades já existentes (como revisão eleitoral e justiça eleitoral itinerante).	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	N	NA	Custeio TIC COMRED	C	N	62.062,00	62.062,00	62.062,00	6.000,00	-53.062,00	AC.3	SEI Planejamento: 810/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 7717/2024 SEI Gestão do Contrato: 1573/2025 SEI pagamento anual: 1789/2025	Nome da empresa: CINTE Número do Contrato: 44/2024 Vigência do Contrato: 06/12/2024 a 06/12/2029	Cinte Telecom Comercio e Servicos LTDA (CNPJ 08.378.641/0001-96) Nota de empenho: 2025NE000187 R\$ 750,00 x 12 = R\$ 9.000,00	Contrato vigente	R\$ 7.524,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 9.024,00
5A	STI_POO_25.05A (Despesa continuada)	Contratação de ambiente de e-mail em nuvem pública	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros.	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC ARMADAD	C	N	336.137,00	336.137,00	336.137,00	318.902,58	-17.234,42	AC.3	SEI Planejamento: 2663/2019 SEI Seleção de Fornecedor: 3436/2025 SEI Gestão do Contrato: 2856/2020 SEI pagamento anual: 821/2025	Nome da empresa: RJR Comercio e Servicos de Informatica Ltda Número do Contrato: 47/2020 Vigência do Contrato: 16.09.2020 a 16.03.2023 - Renovação por mais 30 meses (PAE 2856/2020) - 16.03.2023 a 16.09.2025	RJR Comercio e Servicos de Informatica Ltda Nota de empenho: 2025NE000156 Estimativa 2025: 01.01 a 16.09: R\$ 37.386,00x 8,53 = R\$ 318.902,58	Contrato vigente	R\$ 127.345,20	R\$ 0,00	R\$ 42.652,66	R\$ 149.029,34	R\$ 319.027,20
5B	STI_POO_25.05B	Estudo para contratação de ambiente de serviços em nuvem (e-mail, drive de armazenamento, editor de texto, planilhas e apresentação de slides, videoconferência e inteligência artificial)	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Permitir o acesso desburocratizado do ambiente de e-mail para os servidores do TRE-RN, sem a necessidade de utilização de serviços como VPN, ou outros, com a expansão para uso dos serviços de inteligência artificial.	Fase Planejamento iniciada	NA	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	15.07.2025	N	16.09.2025	Custeio TIC ARMADAD	C	N	136.740,00	222.034,00	222.034,00	222.034,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: 10411/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 3436/2025 SEI Gestão do Contrato: 2856/2020 SEI pagamento anual: 821/2025	Nome da empresa: RJR Comercio e Servicos de Informatica Ltda Número do Contrato: 47/2020 Vigência do Contrato: 16.09.2020 a 16.03.2023 - Renovação por mais 30 meses (PAE 2856/2020) - 16.03.2023 a 16.09.2025	Estudo para continuidade a partir de 17.09.2025: Licença GWS starter + Vault: 17.09 a 31.12: (R\$ 41,70 x 1,05 x 850 contas x 3,47 meses) = R\$ 129.144,00 Licença GWS standard: 17.09 a 31.12: (R\$ 71,39 x 50 contas x 3,47 meses) = R\$ 12.386,00 Licença gemini para GWS: 17.09 a 31.12: (R\$ 116,00 x 200 contas x 3,47 meses) = R\$ 80.504,00 Total da solução: R\$222.034,00	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6A	STI_POO_25.06	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2025)	COINF/STIE	Seção de Suporte e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional	Fase Planejamento iniciada	NA	NA	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	N	29.08.2025	Investimento INV EUTIC	I	N	59.090,00	538.558,05	521.205,95	536.239,42	15.033,47	AC.3	SEI Planejamento: 9041/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 3436/2025 SEI Gestão do Contrato: 2856/2020 SEI pagamento anual: 821/2025	Nome da empresa: GETI Número do Contrato: 12/2023 Vigência do Contrato: 16.10.2023 a 16.04.2026 - 30 meses	Renovação do Parque Computacional 2025 a ser detalhado oportunamente	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6A (demanda desmembrada)	STI_POO_25.06A	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação - Data Center	COINF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada do Data Center	Fase Planejamento iniciada	NA	NA	31.03.2025	30.04.2025	31.07.2025	N	29.08.2025	Investimento INV EUTIC	I	N	0,00	0,00	0,00	1.857.608,03		AC.3	SEI Planejamento: 9041/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 3436/2025 SEI Gestão do Contrato: 2856/2020 SEI pagamento anual: 821/2025	Nome da empresa: GETI Número do Contrato: 12/2023 Vigência do Contrato: 16.10.2023 a 16.04.2026 - 30 meses	Equipamentos do Data Center a ser detalhado oportunamente						
6B	STI_POO_25.06B	Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação para a renovação e melhoria do parque computacional do Tribunal (Novas contratações 2026)	COINF/STIE	Seção de Suporte e Infraestrutura/COINF/STIE	Garantir a infraestrutura tecnológica adequada às atividades judiciais, administrativas e eleitorais, tanto da Sede do Tribunal como das Zonas Eleitorais, renovando o parque computacional		30.09.2025	19.12.2025	28.02.2026	01.04.2026	31.07.2026	N	29.08.2026	Investimento INV EUTIC	I	N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: 9041/2024 SEI Seleção de Fornecedor: 3436/2025 SEI Gestão do Contrato: 2856/2020 SEI pagamento anual: 821/2025	Nome da empresa: GETI Número do Contrato: 12/2023 Vigência do Contrato: 16.10.2023 a 16.04.2026 - 30 meses	Renovação do Parque Computacional 2026 a ser detalhado oportunamente		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	STI_POO_25.07 (Despesa Continuada)	Contratação de serviços de suporte às equipes de gestão de infraestrutura tecnológica da JER/N	SM/COINF/STIE																												



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE																																		
PLANO DE CONTRATAÇÕES DE TIC 2025																																		
VERSÃO 3.0																																		
ITEM	CÓDIGO (PCA 2025)	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	UNIDADE DEMANDANTE	UNIDADE TÉCNICA	BREVE JUSTIFICATIVA	Status	PRAZO DE ENTREGA DOO	PRAZO DE ENTREGA ESTUDOS PRELIMINARES	PRAZO DE ENTREGA TERMO DE REFERÊNCIA OU PROJETO BÁSICO	INÍCIO FASE DE SELEÇÃO FORNECEDOR	PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO	NOVA CONTRATAÇÃO/REN OVACÃO	DATA LIMITE PARA RENOVAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO/ PLANO INTERNO	Tipos de Despesa e Segurança da Informação	SIGEPRO	Versão 1.0	Versão 2.0	Versão 3.0	Diferença	VÍNCULO COM O OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PLEJEN	SEI	Dados do Contrato	OBSERVAÇÃO - VERSÃO 3.0 Atualizado em 16/06/2025	Status	Empenho a liquidar	Empenhos em liquidação	Empenhos liquidados a pagar	Empenhos pagos	Valor empenhado				
12	STI_POO_25.12	Aquisição de extensão de garantia de hardware e licenciamento para os nós de hiperconvergência adquiridos em 2020.	CONF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	Estender a garantia de hardware, suporte e atualizações do fabricante dos nós de hiperconvergência adquiridos em 2020 cuja vigência da garantia termina em outubro de 2025.		NA	30.04.2025	31.05.2025	31.07.2025	30.09.2025	N	31.10.2025	Custeio TIC LOCSOF	C N	1.250.000,00	689.250,00	689.250,00	689.250,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato:	Renovação de garantia de 5 nós de hiperconvergência R\$ 137.850,00 x 5 = R\$ 689.250,00 (valor estimado de acordo com proposta recebida da TELEQUIP)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
13	STI_POO_25.13	Contratação de uma empresa especializada para manutenção de equipamentos críticos de datacenter como nobreaks e ar-condicionado da solução Smartrow e Smartcabinet.	CONF/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	Garantir o pleno funcionamento dos racks autônomos adquiridos pelo Tribunal em utilização no prédio Sede e COJE.		NA	31.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	30.09.2025	N	31.10.2025	Custeio TIC APOIO	C N	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato:	Valor estimado com base no estudo realizado pelo TRE-PB = R\$ 10.000,00/mês x 03 meses = R\$ 30.000,00 / ano		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
14	STI_POO_25.14	SisDEA Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais.		Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	A avaliação de imóveis da União ou de seu interesse, em cumprimento à Instrução Normativa SP/IME nº 87, de 20 set.2022, é procedimento obrigatório a todos os órgãos e entidades gestoras de imóveis federais, e deve estar em conformidade com as Normas Brasileiras - NBR 14.653-ABNT, e o serviço vinha sendo terceirizado pelo TRE/RN por falta de um software adequado de inferência estatística para avaliação de imóveis. O software SisDEA é reconhecido nacionalmente e sua marca está registrada no INPI sob número 526299788.		NA 27.06.2025	30-04-2025 30.07.2025	31-06-2025 30.08.2025	30-06-2025 30.09.2025	31-08-2025 30.11.2025	N	30.9.2025	Investimento INV SOFTWR	I N	3.938,00	3.938,00	3.938,00	2.000,00	-1.938,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato:		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00					
15	STI_POO_25.15	Estudo para contratação de serviço de desenvolvimento com business intelligence, inteligência artificial e desenvolvimento de sistemas	COSIS/STIE		Contratação de serviço terceirizado para atuar em frentes de BI e IA, para manutenção e criação de novos painéis, bem como de desenvolvimento de sistemas, para manutenção dos sistemas administrativos.		07.02.2025	14.03.2025	15.04.2025	30.04.2025	30.06.2025	N	NA	Custeio TIC APOIO	C N	0,00	180.000,00	180.000,00	54.193,47	-125.806,53		SEI Planejamento: 964/2025 SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato:	SEI Fase Planejamento 00964/2025 3 Postos de trabalhos de BIA x R\$10.000,00 x 1,8 meses = R\$ 54.193,47		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
16	STI_POO_25.16	Estudo para aquisição de solução de acessibilidade digital	COSIS/STIE	Seção de Novas Tecnologias e Desenvolvimento Web/COSIS/STIE	A aquisição de solução de acessibilidade digital visa promover a inclusão e a acessibilidade em nossos portais na Intranet, garantindo que todos os servidores, incluindo aqueles com deficiências visuais ou outras necessidades especiais, possam acessar as informações e recursos disponíveis de maneira acessível e eficiente.	Fase Planejamento iniciada	NA	NA	30.04.2025	31.05.2025	31.08.2025	N	31.10.2025	Custeio TIC LOCSOF	C N	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato:	SEI fase de planejamento - 1/10/37/2024 1 licença por 3 anos - 25.000,00	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
17	STI_POO_25.17	Estudo para contratação de serviços de computação em nuvem	COSIS/STIE	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	Atender as demandas atuais de fornecimento de serviços em nuvem	Fase Planejamento iniciada	10.02.2025	14.03.2025	15.04.2025	30.04.2025	31.05.2025	N	30.06.2025	Custeio TIC ARMDAD	C N	0,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato:	Créditos de serviços em nuvem (CSN) - contratação de 3 anos. previsto para o contrato: 300.000 créditos x R\$3,62 = R\$ 1.086.000,00 200 horas de serviço técnico x R\$520,00 = 104.000,00 1 treinamento em company x R\$35.000,00 total da solução: R\$1.225.000,00 previsto para 2025 60.000 x R\$3,62 = R\$ 181.000,00 50 horas de serviço técnico x R\$520,00 = 26.000,00 total para 2025: R\$207.000,00 Treinamento a ser inserido no PACD2025: R\$35.000,000	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
18	STI_POO_24.17	Coletores de dados - ASIWEB	SEPAT/COLOCIS AOF	Seção de Suporte e Segurança da Informação/CONF/STIE	Substituição dos coletores de dados descontinuados que utilizam windows mobile, utilizados no Sistema ASIWEB		NA	NA	NA	NA	NA	N	30.04.2025	Investimento INV EQUITIC	I N	0,00	24.908,55	24.908,55	24.908,55	0,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato:	PRM Planejamento: 9558/2023 SRP TSE: PE nº 90024/2024 (09.07.2024) - SEI 2022.00.000001371-0 Natureza da despesa: material permanente - 44905200  1. Leitores de dados de radiofrequência e código de barras, compatível e homologado para uso no Sistema ASIWEB, do tipo desacoplado - 5 un. x R\$ 4.022,50 = R\$ 20.112,50  2. Smartphones baseados no Android OS - cota principal -  5 un. x R\$ 1.399,00 = R\$ 6.995,00 5 un. x R\$ 569,23 = R\$ 4.796,15  TOTAL: R\$ 24.908,65		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
19	STI_XOO_24.23	Aquisição de Certificados digitais emitidos por entidade governamental	COFINS/AOAF	Seção de Redes e Infraestrutura/CONF/STIE	Exigência de utilização de certificado digital emitido por entidade governamental, para fins de acesso ao SIAFI por parte de todos os usuários que não possuem perfil exclusivamente de consulta, a partir do dia 23.07.2024, em razão de determinação da Secretaria do Tesouro Nacional.	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio TIC ARMDAD	C N	0,00	3.389,40	3.389,40	3.389,40	0,00	AC.3	SEI Planejamento: 5658/2024 SEI Seleção de Fornecedor: (contratação direta) SEI Gestão do Contrato: 5658/2024 SEI pagamento anual: 5658/2024	Nome da empresa: SERPRO Número do Contrato: 472024 Vigência do Contrato: 25/07/2024 a 24/07/2025	150 certificados x R\$ 169,47 = R\$ 25.420,50 - contrato 52 certificados x R\$ 169,47 = R\$ 8.812,44 - utilizado em 2024 20 certificados x R\$ 169,47 = R\$ 3.389,40 - previsto para 2025	Contrato vigente	R\$ 2.711,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 677,88	R\$ 3.389,40				
20	STI_XOO_25.18	Sistema para gerenciar atendimento de chamados	COADI/SAOF	Seção de Suporte e Segurança da Informação/CONF/STIE	Necessidade de sistema para gerenciamento de chamados dos usuários relacionados às manutenções diversas (elétrica, hidráulica, etc), conservação predial, resenha de ambientes e solicitação de veículos que atenda ao fluxo dos processos das unidades da SAOF.	Fase Planejamento iniciada	30.05.2025	30.07.2025	30.08.2025	30.09.2025	30.11.2025	N	NA	Custeio TIC LOCSOF	C N	0,00	0,00	0,00	32.580,00	32.580,00	AC.3	SEI Planejamento: 3552/2025 SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato:	Previsto R\$ 2.000,00 (vinte e um mil reais), incluindo o fornecimento, a implantação do software e o treinamento. Manutenção 3 parcelas de R\$ 3.860,00 (três mil, oitocentos e sessenta reais). Total previsto para 2025: R\$ 32.580,00	Fase Planejamento iniciada	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
21	STI_XOO_25.19	Sistema para automatizar dados de orçamentos de obras - OrçaFasio	COADI/SAOF	Seção de Suporte e Segurança da Informação/CONF/STIE	Necessidade de sistema para automatizar os dados relativos aos orçamentos de obras, que contemple elaboração de planilhas orçamentárias de forma rápida e simples, banco de dados atualizado e criação de um banco de dados próprio, importação e exportação de base própria de composições, cronograma físico e financeiro, importação de itens de outro orçamento para reaproveitamento de conteúdo, importação de orçamentos de planilhas, emissão de relatórios (Orçamento Síntetico, Orçamento Síntetico com Valor da Mão de Obra, Orçamento Síntetico com Valor da Mão de Obra e Material, Orçamento com Composições Analíticas, Composições Analíticas com Preço Unitário, Curva ABC de Insumos, Curva ABC de Serviços e Cronograma Físico / Financeiro), comparador de orçamento, compatibilização de bases e inteligência artificial.		27.06.2025	30.07.2025	30.08.2025	30.09.2025	30.11.2025	N	30.9.2025	Custeio TIC LOCSOF	C N	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	AC.3	SEI Planejamento: SEI Seleção de Fornecedor: SEI Gestão do Contrato: SEI pagamento anual:	Nome da empresa: Número do Contrato: Vigência do Contrato:											
22	STI_POO_XX	Licenças de suporte e atualização de versão das ferramentas Oracle Advanced Security (TDE e Data Reduction) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools	COSIS/STIE	Seção de Banco de Dados e Sistemas/COSIS/STIE	Manter atualizados e com suporte técnico especializado os mecanismos de segurança Oracle Advanced Security (TDE e Data Reduction) e Oracle Database Vault, integrantes da família Oracle Security Tools, nos servidores de banco de dados Oracle do TRE-RN.  Esses mecanismos, adquiridos pelo TRE-RN no ano de 2022, com licenciamento de uso perpétuo e com contrato de suporte e atualizações vigentes até 26/12/2023, permitem o uso de recursos avançados de segurança para os dados armazenados no "Oracle Database". O Oracle Database é um sistema de gerenciamento de banco de dados ao qual parte significativa das soluções da Justiça Eleitoral, cujas centrais datam de meados da década de 1990, é estruturalmente acoplada, gerando estreita dependência tecnológica das soluções ao produto. A adoção do Oracle Database tornou-se mandatória – como um padrão “de facto” – para os Tribunais Regionais Eleitorais, vez que devem consumir soluções providas, de modo compulsório e uniformizado.	Contrato vigente	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Custeio SIN LOCSOF	C S	173983,00	173.983,00	173.983,00	186.249,00	12.266,00	AC.3	SEI Planejamento: 9411/2023 SEI Seleção de Fornecedor: (contratação direta) SEI Gestão do Contrato: 9411/2023 SEI pagamento anual: 01/01/2025	Nome da empresa: ORACLE Número do Contrato: 63/2024 Vigência do Contrato: 22.03.2024 a 21.03.2025 - Prorrogado de 22.03.2025 a 21/03/2026											
															Manutenção										Diferença v.2.0 para 3.0									
						Soma	R\$ 873.919,43		R\$ 0,00	R\$ 83.173,96		R\$ 550.664,36	R\$ 1.310.440,00																					

Manutenção	Custeio	3.527.860,00	3.382.740,40	3.393.029,99	3.092.600,00	Diferença v2.0 para 3.0
Investimento		59.090,00	567.404,60	550.052,50	2.420.756,00	300.429,99
Total		3.586.950,00	3.950.145,00	3.943.082,49	5.513.356,00	-1.870.703,50
Segurança da Informação	Custeio	173.983,00	173.983,00	173.983,00	186.249,00	-1.570.273,51
Investimento		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		173.983,00	173.983,00	173.983,00	186.249,00	

Somas por PI					
Custeio TIC COMRED	R\$ 615.111,00	R\$ 615.111,00	R\$ 615.111,00	R\$ 485.815,83	
Custeio TIC ARMDAD	R\$ 522.677,00	R\$ 890.060,40	R\$ 890.060,40	R\$ 791.325,98	
Custeio TIC APOIO	R\$ 1.009.759,00	R\$ 1.099.759,00	R\$ 1.109.227,34	R\$ 997.263,19	
Custeio TIC LOCSOF	R\$ 1.313.560,00	R\$ 777.810,00	R\$ 778.631,25	R\$ 818.195,00	
Investimento INV SOFTWR	R\$ 3.938,00	R\$ 3.938,00	R\$ 3.938,00	R\$ 2.000,00	
Investimento INV EQUITIC	R\$ 59.090,00	R\$ 563.466,60	R\$ 546.114,50	R\$ 2.418.756,00	
Investimento INV PERMAN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Custeio SIN LOCSOF	R\$ 173.983,00	R\$ 173.983,00	R\$ 173.983,00	R\$ 186.249,00	
