



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA

ATA DE REUNIÃO N.º 08

1. Identificação da Reunião

Data	Horário		Local	Coordenador
	Início	Término		
17.07.2019	16h	18h15	NCEM	Ana Paula Vasconcelos do A. e S. Araújo

2. Objetivo

Discutir os pontos elencados na pauta abaixo:

- Avaliação de resultados do Projeto Expográfico nº 02/2019 - 17ª Semana Nacional de Museus (13 a 31.05.2019)

3. Participantes

Nome	Lotação	Assinatura
Ana Paula Vasconcelos do A. e S. Araújo	NCEM/EJERN	
Paulinéa Marise Lima de Araújo	NCEM/EJERN	
Bárbara Carolline Santos Cavalcante	NCEM/EJERN	
Sâmara Dávalos Guerreiro Peixoto	NCEM/EJERN	

4. Discussão da Pauta

Nº	Decisão/Diretrizes/Registros	Responsável	Deliberação
1	Identificação de dificuldades encontradas no uso dos recursos materiais e humanos, durante a execução do Projeto, a partir da comparação entre o planejado e o executado, evidenciando-se que alguns prazos não foram cumpridos em decorrência de: atraso no envio de fotos pelos servidores; demora na confirmação de interesse de participação na abertura do evento ("Roda de Conversa"); e, ainda, absorção de novas demandas de natureza administrativa, durante a execução do projeto.	Todos	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA

Nº	Decisão/Diretrizes/Registros	Responsável	Deliberação
1	<p>A seguir, detalhamento das principais não conformidades na execução do projeto expográfico:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Indisponibilidade orçamentária para confecção de <i>banner</i>, tendo sido este custeado pela titular da unidade;○ Dificuldade técnica de disponibilização de formulário eletrônico para avaliação do evento;○ Dificuldade na localização de conteúdo textual no acervo do NCEM, motivando a confecção de <i>banner</i>/painel de cédulas e urnas com o material existente no setor;○ Atividades de criação de <i>displays</i>, impressão de fotos e montagem do cenário iconográfico da exposição foram prejudicadas pela demora no envio de materiais pelos servidores;○ Atividades de revisão dos textos da cartilha e <i>folder</i> e diagramação do <i>folder</i> foram realizadas pela titular, em casa;○ Laudo técnico iniciado e não finalizado;○ Impressão de <i>folder</i> do evento na semana anterior, em razão da limitação dos cartuchos (a impressora A3 atualmente disponibilizada para o NCEM - em caráter provisório - não é adequada para os serviços por não conseguir suprir os serviços do setor por seu consumo de tinta);○ Preparação de cartões de agradecimento realizada tardiamente, em razão do surgimento de demandas externas;○ Divulgação de resultados da avaliação do evento ainda não realizada, por depender desta reunião;	Todos	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA

Nº	Decisão/Diretrizes/Registros	Responsável	Deliberação
	<ul style="list-style-type: none">Item 6 do Anexo II do Projeto: máquina de datilografia e fichário não foram incluídos na exposição, por inexistir mesa para suporte e espaço no <i>layout</i>;Item 7 do Anexo II do Projeto: <i>banners</i> sobre cédulas e urnas e <i>kit</i> de cartazes não foram produzidos para o evento, por concorrer com demandas externas. Elaborado um <i>banner</i> para a abertura da exposição;(item 8 do Anexo II do Projeto: <i>kit</i> de diplomas não foi produzido para o evento, por também concorrer com demandas externas;Não houve avaliação da roda de conversa (abertura do evento).		
2	Desmontagem da exposição ainda não realizada, por decisão interna, com previsão de ocorrer de forma concomitante à montagem do próximo evento.	Todos	Todos
3	Ratificação ou inserção de práticas que devem ser adotadas para maior rendimento na realização de projetos expográficos futuros: <ul style="list-style-type: none">Acompanhar o cronograma do projeto para evitar sobrecarga de trabalho nas últimas semanas anteriores ao evento;Solicitar suprimentos de impressão com a devida antecedência e em quantidade suficiente ao atendimento da demanda.	Ana Paula	Todos
4	Coleta de dados sobre a opinião dos visitantes acerca da exposição, com base em formulário de satisfação respondido presencialmente ao fim das visitas, obtendo-se o resultado detalhado em ANEXO (68 pessoas participaram da abertura do evento, 201 visitaram a exposição e 10 avaliaram a ação).	Todos	-



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA

5 Pendências Identificadas

DESTA REUNIÃO

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
1	Reiterar pedido de questões que deverão constar do formulário de visitação, pesquisas e demais ações de cidadania.	Ana Paula	17.07.2019
2	Confeccionar Certificado para os participantes do evento.	Ana Paula	19.07.2019
3	Solicitar ao GABEJE (Paulo Lins) preparação de urna eletrônica para avaliação mensal dos serviços prestados pelo NCEM.	Paulinéa	18.07.2019
4	Compilar dados da avaliação de satisfação do evento da 17ª Semana Nacional de Museus em planilha eletrônica.	Sâmara	18.07.2019
5	Editar minuta de notícia, para divulgação do desempenho da exposição em análise.	Paulinéa	19.07.2019
6	Elaborar minuta de Memorando propondo alteração na Resolução que trata do acesso à informação do Tribunal (Res. 15/2016).	Paulinéa	19.07.2019
7	Concluir projeto expográfico n.º 04/2019, referente aos 30 anos da Constituição Estadual do RN (solicitado pela Administração), previsto para outubro/2019.	Ana Paula	19.07.2019
8	Elaborar dossiê sobre o evento.	Ana Paula	26.07.2019
9	Criar agenda de eventos 2020, para divulgação até novembro/2019.	NCEM e GABEJE	13.09.2019

DE REUNIÕES ANTERIORES (COM EVENTUAL REDEFINIÇÃO DE DATAS LIMITES)

Reunião n.º 01 (09.01.2019)

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
3	Solicitar, via Memorando, a produção de escaninho em madeira para organização de <i>banners</i> de eventos anteriores.	Ana Paula/Paulinéa	19.07.2019

Reunião n.º 03 (02.04.2019)

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
5	Elaborar minuta de Memorando solicitando a criação de formulário eletrônico de satisfação dos eventos promovidos pelo NCEM.	Paulinéa	19.07.2019



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL
NÚCLEO DO CENTRO DE MEMÓRIA

Reunião n.º 04 (10 e 11.04.2019)

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
02	Elaborar calendário com datas comemorativas de relevância para a Justiça Eleitoral.	Bárbara	31.07.2019
04	Concluir projeto expográfico 03/2019, referente ao evento nacional do IBRAM, "Primavera dos Museus", a ser realizado em setembro, conforme tema central ainda não definido por aquele Instituto.	Ana Paula	19.07.2019
05	Divulgar agenda de eventos, visitas e pesquisas programados para 2020.	Ana Paula	29.11.2019

Reunião n.º 05 (03.06.2019)

Nº	Pendências	Responsável	Data limite
3	Inserção de conteúdos na nova página eletrônica, mantendo-se o status de privado até a completa migração dos dados.	Ana Paula e Sólton	26.07.2019


6. Fechamento da Ata

Data	Nome do relator	Assinatura
18.07.2019	Paulinéa Marise Lima de Araújo	

4. Discussão da Pauta

Nº	Decisão/Diretrizes/Registros	Responsável	Deliberação
1	Identificação de dificuldades encontradas no uso dos recursos materiais e humanos, durante a execução do Projeto, a partir da comparação entre o planejado e o executado, evidenciando-se que alguns prazos não foram cumpridos em decorrência de: atraso no envio de fotos pelos servidores; demora na confirmação de interesse de participação na abertura do evento ("Roda de Conversa"); e, ainda, absorção de novas demandas administrativas, durante a execução do projeto.	Todos	

Avaliação de Satisfação - Projeto Expográfico 002/2019 - "Tradição democrática e voto no RN: História das Eleições sob a perspectiva dos servidores"

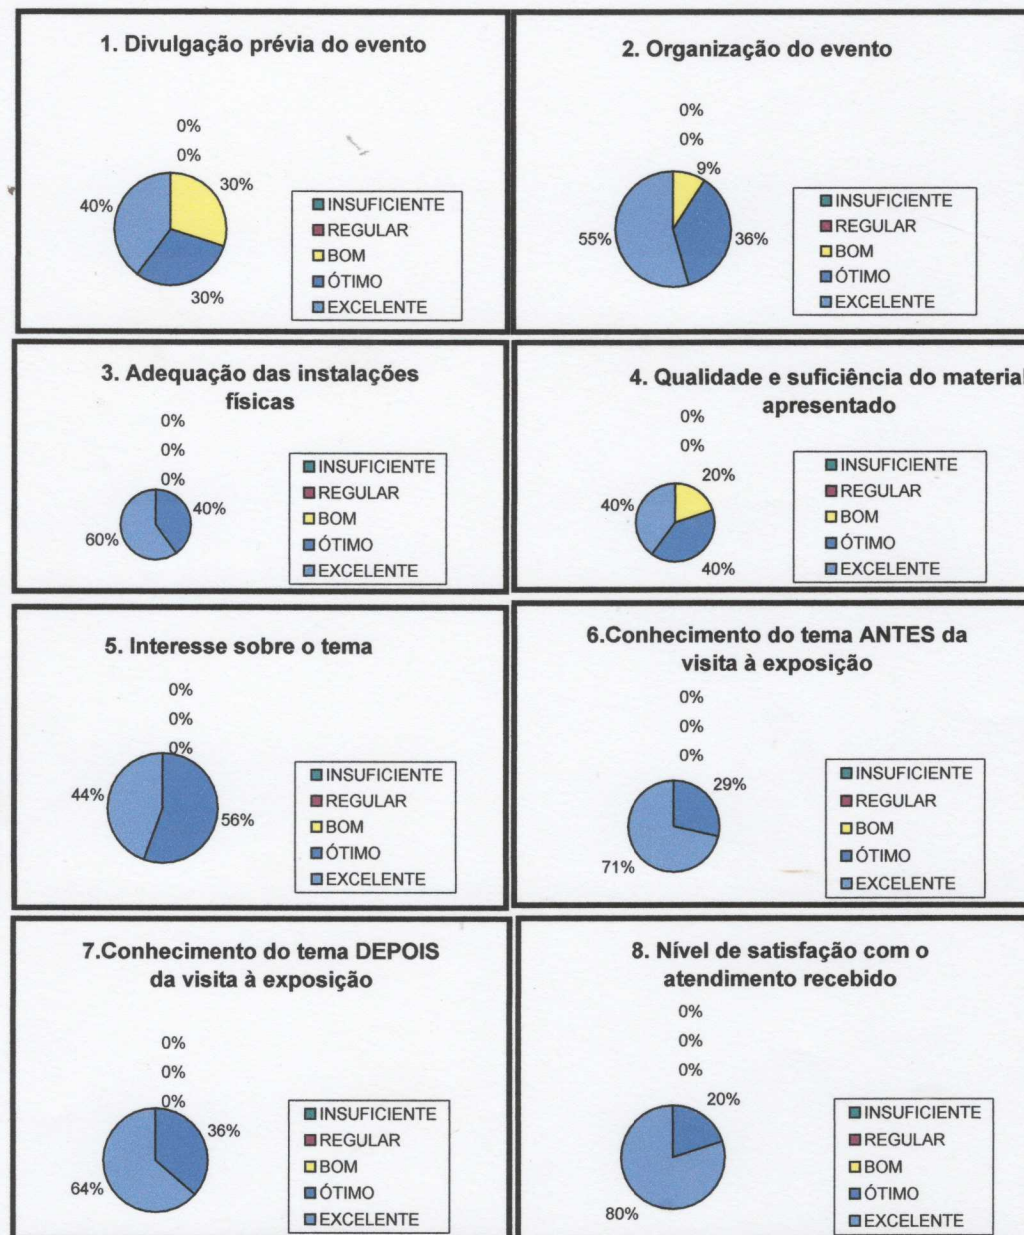

CRÍTICAS E SUGESTÕES
Foi sugerido manter a realização de exposições temáticas sobre o cotidiano do processo eleitoral no âmbito da JE.
Foi sugerido realizar exposições itinerantes do NCEM para as Zonas Eleitorais.
Elogiou-se o espaço físico do ambiente destinado ao NCEM.

VISITAÇÃO	
Total de visitantes assinantes da roda de conversa	68
Total de visitantes que assinaram o livro de visitação da exposição	201
Total de visitantes	269

[Handwritten signature]
